

Správa
o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1
v Jaslovských Bohuniciach

Uznesením vlády SR č. 70/2003 z 29. januára 2003 k Finančnému memorandu Osobitného programu 2002 na podporu vyradenia Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (JE V1) z prevádzky a následných opatrení v odvetví energetiky na Slovensku, bolo ministrom hospodárstva uložené v bode C.1. každoročne do 15. decembra predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky *Správu o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (fond BIDSF - Bohunice International Decommissioning Support Fund)*.

Uznesením vlády SR č. 1082/2001 zo dňa 15. novembra 2001 schválila vláda SR znenie Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR), týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohunic (BIDSF). Dňa 16. novembra 2001 bola uvedená rámcová dohoda podpísaná na 1. Zhromaždení prispievateľov do fondu BIDSF v sídle EBOR v Londýne. Rámcová dohoda nadobudla účinnosť dňom vydania potvrdenia o právnej záväznosti, tzv. „Legal Opinion“, dňa 15. augusta 2002.

Na základe ustanovení Nariadenia Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre programy pomoci na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 a v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, uzatvorila Európska komisia (EK) prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre Energetiku so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), za účelom implementácie Programu Bohunice prostredníctvom tzv. Národnej agentúry, ustanoveného podľa Protokolu č. 9 Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, Dohodu o delegovaní právomocí.

Predkladaný materiál podáva ucelenú informáciu o činnosti Programu Bohunice (fond BIDSF a národná cesta) v roku 2018.

1. Aktivity Ministerstva hospodárstva SR

Európska únia zo svojej strany poskytla finančnú pomoc určenú na podporu odstavenia JE V1, a to v rámci predvstupovej pomoci z fondov PHARE vo výške 90 mil. eur a na obdobie rokov 2004 - 2006 vo výške 100 mil. eur. V rámci Finančnej perspektívy 2007-2013¹ bola pôvodne prisľúbená pre SR finančná pomoc na likvidáciu JE V1 vo výške 237 mil. eur. Po zložitých rokovaniach na úrovni Európskej rady a Európskeho parlamentu (EP) bola konečná suma navýšená do výšky 423 mil. eur. Do fondu BIDSF prispeli aj iní donori (Rakúsko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia) vo výške 11,45 mil. eur. Do roku 2013 SR získala celkovo sumu na projekty Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (SEPS, a.s.), SIEA a vyradovania JE V1 celkovo sumu 624 mil. eur. Dňa 13. decembra 2013 bolo prijaté nariadenie Rady (EURATOM) č.

¹ Nariadenie Rady (EURATOM) č. 549/2007 zo 14. mája 2007 o vykonávaní protokolu č. 9 o bloku 1 a bloku 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku, ktorý je pripojený k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

1368/2013 o podpore Únie pre programy pomoci na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku (BG) a na SR a o zrušení nariadení (EURATOM) č. 549/2007 a (EURATOM) č. 647/2010² v znení korigenda z 20. decembra 2013³ (ďalej len „*nariadenie Rady č. 1368/2013*“), ktorým bola SR schválená nová suma 225 mil. eur na obdobie 2014 – 2020. Predmetnú sumu možno využiť výlučne na projekty vyradovania JE V1. V súčasnosti sa rokuje o pokračovaní finančnej podpory EÚ na roky 2021 – 2027⁴, v rámci ktorého EK navrhla pre SR sumu 55 mil. eur. V tomto smere Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) sa aktívne podieľa na lobovaní v rámci inštitúcií EÚ a negociáciách v Rade EÚ k novému návrhu nariadenia za účelom navýšenia pôvodne navrhovanej sumy tak, aby vyradovanie JE V1 mohlo plynule napredovať a bolo ukončené v plánovanom termíne do 31. decembra 2025.

MH SR v zmysle Rámcovej dohody medzi SR a EBOR a nariadenia Rady č. 1368/2013 plní úlohu generálneho dohľadu a koordinácie v rámci SR v procese riadenia vyradovania JE V1, ktorý je spolufinancovaný z európskych zdrojov cez implementačný orgán EBOR (fond BIDSF).

V sledovanom období sa aktivity MH SR zamerali najmä na nasledovné činnosti:

1.1 Implementácia Programu Bohunice národnou cestou

V nadväznosti na nariadenie Rady č. 1368/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ a doteraz získané dlhodobé skúsenosti, MH SR po spoločných konzultáciách so spoločnosťou JAVYS, a.s. a EK iniciovalo konanie na využívanie alternatívneho spôsobu administrácie Programu Bohunice popri EBOR, tzv. národnú cestu. Na implementáciu národnej cesty bola určená Slovenská inovačná a energetická agentúra.

V januári 2015 začal audit EK, ktorého cieľom bolo preveriť vhodnosť a pripravenosť riadiaceho a kontrolného systému na strane SIEA pre účely implementácie Programu Bohunice. Predmetný audit bol ukončený dorúčením záverečnej správy v mesiaci september 2015, ktorá konštatovala adekvátnu pripravenosť SIEA a zároveň stanovila, okrem iného, odporúčania, ktorých splnenie sa očakávalo pred uzatvorením tzv. delegačnej dohody medzi EK a SIEA, ktorou EK poverila SIEA k vykonávaniu administrácie Programu Bohunice. Počas mesiaca september 2015 sa uskutočnilo rokovanie s EK o návrhu textu delegačnej dohody. Delegačná dohoda bola podpísaná 10. augusta 2016. V roku 2018, po prvom úplnom roku implementácie zverených úloh SIEA, bol vykonaný ex-post audit EK. Audit bude ukončený zaslaním záverečnej správy z auditu, predpokladaný termín predloženia správy je prvý kvartál roka 2019.

Spustením národnej cesty sa tak vytvorila alternatíva k fondu BIDSF spravovaným EBOR, avšak pod správou národného subjektu - SIEA. Prvým projektom v rámci Programu Bohunice administrovaným prostredníctvom SIEA je podprojekt D4.4C.01 „Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť“ v hodnote 26,296 mil. eur a v roku 2018 bol zahájený proces obstarávania dodávateľa. V októbri 2018 sa zahájila prípravná fáza pre ďalší projekt v správe SIEA, a to projekt D4.7 „Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu“.

² Úradný vestník EÚ L346/1, 20. decembra 2014.

³ Úradný vestník EÚ L8/31, 11. januára 2014.

⁴ Návrh nariadenia Rady č. COM/2018/467 final - 2018/0252 (NLE) - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0467%3AFIN>

1.2 Program pomoci pri vyrad'ovaní jadrových zariadení - Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP)

V zmysle nariadenia Rady č. 1368/2013 sa pravidelne na úrovni EK uskutočňujú stretnutia NDAP, na ktorých sa prerokúva aktuálny stav vyrad'ovania JE V1, schvaľuje sa ročný pracovný program vyrad'ovania (AWP), čím sa aj zároveň rozhoduje o alokácii finančných prostriedkov na daný rozpočtový rok.

Na rokovaní NDAP, ktoré sa konalo dňa 4. júla 2018 v Luxemburgu bol programovým koordinátorom (MH SR) predložený aktualizovaný ročný pracovný program na rok 2018 pre Program Bohunice (AWP 2018), ktorý bol spracovaný v spolupráci s JAVYS, a.s., Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (SEPS, a.s.), EBOR a SIEA. EK okrem iného prezentovala závery Strednodobá hodnotiaca správa programov vyrad'ovania, ktorá konštatovala progres vo vyrad'ovaní, avšak aj informovala o ďalších výzvach, ktoré sú ešte pre nami. EK informovala aj o novom návrhu nariadení o pokračovaní pomoci pre programy vyrad'ovania na roky 2021-2027. AWP 2018 bol schválený v omeškaní spôsobenom na strane EK dňa 8. októbra 2018.

Na ďalšom zasadnutí Výboru NDAP, ktoré sa konalo dňa 8. novembra 2018 v Luxemburgu, bol predložený návrh ročného pracovného plánu vyrad'ovania na rok 2019 (AWP 2019), ako i progres vyrad'ovania JE V1, ktorý bol zástupcami EK vysoko ocenený. Schválenie AWP 2019 sa očakáva v marci 2019.

Podrobnejšia charakteristika všetkých projektov vyrad'ovania, ako aj ostatných projektov priamo súvisiacich s vyrad'ovaním, ktoré boli doteraz schválené, je uvedená v *Prílohe 1*. Projekty nepriamo súvisiace s vyrad'ovaním JE V1 sú uvedené v *Prílohe 2*.

1.2 Zasadnutie Spoločného výboru dňa 18. júna 2018

Dňa 18. júna 2018 sa konalo v Bratislave zasadnutie Spoločného výboru SR a EBOR pre účely fondu BIDSF. MH SR informovalo o stave a vývoji aktivít súvisiacich s fondom BIDSF. Výsledkom zasadnutia Spoločného výboru bolo odsúhlasenie 1 projektu, ktorý bol prezentovaný zástupcom spoločnosti JAVYS, a.s.:

- A1.9 „Konzultant PMU“, ktorého cieľom je poskytovanie podpory spoločnosti JAVYS, a.s. pri zmluvnom manažmente projektov týkajúcich sa vyrad'ovania JE V1 na roky 2019-2020 v celkovej hodnote vo výške 1,6 mil. eur za 2 roky (zníženie oproti rokom 2017-2018 o 0,4 mil. eur).

1.3 Zhromaždenie prispievateľov do fondu BIDSF

Prvé Zhromaždenie prispievateľov v roku 2018 sa konalo dňa 10. júla 2018 v sídle EBOR v Londýne, kde boli podané informácie o činnostiach fondu BIDSF a čerpaní finančných prostriedkov za obdobie predchádzajúcich 6 mesiacov. EBOR taktiež prezentovala svoj nový 34. pracovný program. Na zasadnutí bol podporený projekt A1.9 „Konzultant PMU“, ktorého cieľom je poskytovanie podpory spoločnosti JAVYS, a.s. pri zmluvnom manažmente projektov týkajúcich sa vyrad'ovania JE V1 na roky 2019-2020.

V poradí druhé Zhromaždenie prispievateľov sa uskutočnilo dňa 30. novembra 2018 v Londýne.

1.4 Zasadnutie Monitorovacieho výboru

Monitorovací výbor bol zriadený v nadväznosti na nariadenie Rady č. 1368/2013 a Vykonávacie rozhodnutie EK č. „C(2014)5449 final“ zo 7. augusta 2014 („*Vykonávacie rozhodnutie*“) ako nová platforma monitorovania progresu vyradovania JE V1. Medzi hlavné úlohy patrí schválenie monitorovacej správy, ktorú predkladá implementačný orgán (EBOR, resp. SIEA, podľa toho ktorý subjekt bude implementovať daný projekt). V roku 2018 sa uskutočnili dve zasadnutia Monitorovacieho výboru.

Predmetom rokovania Monitorovacieho výboru, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 19. apríla 2018 za účasti zástupcov EK, MH SR, EBOR, SIEA, SEPS, a.s., Národný jadrový fond, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) a JAVYS, a.s.

Prerokované boli nasledovné témy:

- Predstavenie návrhu Monitorovacej správy za posudzované obdobie júl – december 2017 a jej schválenie;
- Projekt D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ – podpísanie zmluvy s dodávateľom;
- Projekt D2-A „Dekontaminácia primárneho okruhu JE V1 – 2. fáza“ – ukončenie projektu;
- Projekt D3.1B „Demontáž a demolácia chladiacich veží na JE V1“ – projekt, ktorý je viditeľný aj zo širokého okolia verejnosťou, prvá veža bola úplne zdemolovaná a demolácia druhej sa začala;
- Spolufinancovanie projektov;
- Prezentácia progresu vyradovania JE V1 a prijaté nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť ukončenie vyradovania JE V1 včas do konca roku 2025;

V rámci posudzovaného obdobia boli predstavené a schválené nasledovné dokumenty:

- Strednodobá hodnotiaca správa programov vyradovania;
- Revízia Detailného plánu vyradovania JE V1, ktorá bola zaslaná EK;
- Revízia Vykonávajúceho rozhodnutia;

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru sa konalo dňa 11. októbra 2018 v Luxemburgu za účasti zástupcov EK, MH SR, EBOR, SIEA a JAVYS, a.s.

Prerokovali sa nasledovné témy:

- Monitorovacia správa za obdobie január – jún 2018 a jej schválenie;
- Hlavné míľniky vyradovania JE V1 v roku 2018;
- Prezentácia MH SR ohľadne zdrojov financovania vyradovania JE V1;
- Informácie o stave negociácií k nariadeniu o ďalšej finančnej podpore na roky 2021-2027;
- Medziprogramová výmena skúseností a poznatkov;
- zameranie sa na podprojekty SEPS, a.s., ktoré sú v omeškaní.

1.5 Monitorovacia misia EK

V zmysle nariadenia Rady č. 1368/2013 a Vykonávacieho rozhodnutia sa v priebehu roka 2018 uskutočnili dve monitorovacie návštevy zástupcov EK, cieľom ktorých bolo monitorovanie progresu vyradovania JE V1.

Prvá monitorovacia návšteva sa konala v apríli 2018 a týkala sa najmä progresu vyrad'ovania a návštevy národného úložiska v Mochovciach za účasti zástupcov EK, MH SR, EBOR, SIEA a JAVYS, a.s. Počas druhej monitorovacej misie sa EK zamerala najmä na vyrad'ovania primárneho okruhu JE V1 spoločnosti JAVYS, a.s. a na projekty SEPS, a.s., kde sa navštívili lokality rozvodných staníc spoločnosti SEPS, a.s. (Horná Ždaňa, Bystričany a Križovany).

2. Aktivity Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a.s.

Činnosť Programu Bohunice spoločnosti JAVYS, a.s. v roku 2018 bola uskutočňovaná v zmysle harmonogramu činností vyrad'ovania JE V1.

Medzi najdôležitejšie aktivity Programu Bohunice v spoločnosti JAVYS, a.s. v roku 2018 patrili:

- Realizácia 2. etapy vyrad'ovania JE V1 na základe Rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR č. 900/2014 zo dňa 23. decembra 2014, ktorým spoločnosti JAVYS, a.s. udelil povolenie na 2. etapu vyrad'ovania JE V1 z prevádzky, a zároveň povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a na nakladanie s jadrovými materiálmi počas 2. etapy vyrad'ovania JE V1.
- Plnenie podmienok nariadenia Rady č. 1368/2013 a Vykonávacieho rozhodnutia.
- Vypracovanie podkladov v zmysle požiadaviek nariadenia Rady č. 1368/2013 a Vykonávacieho rozhodnutia - AWP 2019 a Monitorovacia správa za obdobie júl – december 2017 a január – jún 2018.
- Vykonávanie aktivít na získanie (čiastkových) povolení zo strany príslušných správnych orgánov (ÚJD SR a Úrad verejného zdravotníctva SR), najmä povolenia podľa:
 - o zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – povolenia prevažne v oblasti radiačnej ochrany, nakladanie s azbestom a pod.,
 - o zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov – najmä stavebné povolenia, povolenie na odstránenie stavby, územné rozhodnutia a pod.,
 - o zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – najmä povolenia na zmeny na jadrovom zariadení.
- ***Príprava, vypracovanie, resp. schválenie technickej špecifikácie, resp. zadania a súťažných podkladov pre projekty:***
 - A5-A2a Korekcia systému elektrického napájania JAVYS, a.s.
 - D19.1 Obnova HW vybavenia PMU
 - D4.4C.01 Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01 (národná cesta)
 - D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu (národná cesta)
- ***Otvorená súťaž na výber zhotoviteľa podľa pravidiel EBOR pre projekty BIDSF:***
 - A5-A2a Korekcia systému elektrického napájania JAVYS, a.s.
 - D4.4B Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 1. časť
 - D4.4C.01 Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01 (národná cesta)
 - D19.1 Obnova HW vybavenia PMU

- ***Uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi:***
 - A1.9 8. Fáza Konzultanta PMU
 - D4.4A1 Modifikácia zariadení v systéme AKOBOJE
 - D19.1 Obnova HW vybavenia PMU

- ***Dohľad, kontrola a podpora implementácie projektov v etape realizácie:***
 - A1.8 8. Fáza Konzultanta PMU
 - A5-A3 Optimalizácia elektrickej schémy
 - B6.6A Podporné prieskumy vyrad'ovania
 - C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO
 - C9.4 Návrh a vybudovanie nových úložných priestorov pre LLW a VLLW z vyrad'ovania JE V1 v RÚ RAO Mochovce
 - C15-A Jednotný počítačový systém pre logistiku vyrad'ovania
 - D0 Implementácia programu vyrad'ovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v Jadrovej elektrárni Bohunice V1: Projekt 11 (obdobie 1.1.2018 – 31.12.2019)
 - D2.1 Dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1 - 1.časť
 - D3.1B Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1
 - D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení
 - D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu
 - D4.4A Demontáž systémov budovy pomocných prevádzok - 1. etapa
 - D4.4A1 Modifikácia zariadení v systéme AKOBOJE
 - D4.4B Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1– 1. časť
 - D19.1 Obnova HW vybavenia PMU

- ***Ukončenie realizácie projektov:***
 - A5-A3 Optimalizácia elektrickej schémy
 - C15-A Jednotný počítačový systém pre logistiku vyrad'ovania
 - D2.1 Dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1 - 1.časť
 - D3.1B Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1
 - D4.4A Demontáž systémov budovy pomocných prevádzok - 1. etapa
 - D19.1 Obnova HW vybavenia PMU

- ***Vypracovanie projektových dokumentov pre definovanie nových projektov spolufinancovaných zo zdrojov EU (národná cesta):***
 - D4.4C.01 Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01 (národná cesta)
 - D4.7 Dekontaminácia a demolácia objektov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu (národná cesta)

3. Aktivity spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Na základe Grantovej dohody GA 020A sú financované / spolufinancované nasledovné projekty v rámci 5 súborov stavieb “Transformácia 400/110 kV Bystričany“:

1. Rozvodňa 400 kV Bystričany
2. Vedenie 2 x 400 kV H. Ždaňa – lokalita Oslany
3. Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie

4. Vedenie 2 x 400 kV Križovany – Bystričany
5. Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie

Dňa 19.05.2016 bola otvorená verejná súťaž na obstaranie zhotoviteľa troch stavieb „Rozvodňa 400 kV Bystričany“, „Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie“ a „Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie“ s termínom podania ponúk dňa 27.septembra 2016. V uvedenom termíne bolo predložených 5 ponúk, nasledovalo ich hodnotenie. Po ukončení hodnotenia ponúk bola dňa 06. februára 2017 podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie predmetných stavieb so združením SPIE Elektrovod, a.s. a Alter Energo, a.s.. Práce boli začaté v marci 2017 a v súčasnosti pokračujú. Ukončenie prác sa predpokladá v novembri 2019.

Dňa 28. júla 2016 bola otvorená verejná súťaž na obstaranie zhotoviteľa stavby „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“. Termín podania ponúk bol dňa 22. novembra 2016. Hodnotenie ponúk prebiehalo v termíne od decembra 2016 do júla 2017. Keďže sa počas tohto obdobia nepodarilo hodnotiacej komisii zostaviť správu o hodnotení, s ktorou by sa EBOR stotožnila, verejná súťaž bola dňa 19. júla 2017 zrušená. V období od júla 2017 do mája 2018 SEPS, a.s. boli pripravené aktualizované súťažné podklady pre opakovanú verejnú súťaž. Nová verejná súťaž sa začala dňa 24. mája 2018 a termín podania ponúk bol dňa 6. augusta 2018. Od októbra 2018 prebieha hodnotenie ponúk, pričom jeho ukončenie a uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom sa predpokladá v decembri 2018.

V rámci stavby „Vedenie 2x400 kV H. Ždaňa - lokalita Oslany“ bolo v priebehu rokov 2012 a 2013 bolo vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie a počas rokov 2014 až 2016 územné konanie. V súčasnosti prebieha stavebné konanie diela priebeh ktorého je značne predĺžený v dôsledku ťažkostí s námietkami niektorých vlastníkov pozemkov pod budúcim vedením a to z dôvodu ich nesúhlasu s umiestnením stožiarov a trasovaním budúceho vedenia. Súťažné podklady pre výber zhotoviteľa stavby boli pripravené a po ich schválení EBOR bude zahájená verejná súťaž v prvom štvrtroku 2019.

4. Aktivity Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

EBOR, MH SR a SIEA podpísali 20. marca 2008 grantovú dohodu GA 015 týkajúcu sa pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Pre tento pilotný projekt bolo z fondu BIDSF vyčlenených 10 mil. eur.

Pilotný projekt bol realizovaný v 7 súboroch a posledný bol ukončený vo februári 2014. SIEA v rámci implementácie pilotného projektu zabezpečila rekonštrukciu 57 verejných budov v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Aktuálne v súvislosti s realizáciou súboru č. 2 SIEA eviduje 5 súdnych sporov so zhotoviteľom (spoločnosť EURO BUILDING, a.s.).

5. Záver

Doposiaľ bolo uzavretých celkom 24 grantových dohôd na projekty vyradovania a projekty súvisiace s vyradovaním a na ich financovanie bolo z fondu BIDSF alokovaných 646,72⁵ mil. eur a 26,296 mil. eur zo SIEA. Čerpanie finančných prostriedkov z týchto zdrojov k 31. októbru 2018 bolo vo výške 384,94 mil. eur.


⁵ Táto suma pokrýva všetkých prijímateľov, tzn. JAVYS, a.s., SEPS, a s., SIEA a projekty SLOVSEFF (stav k 30. júnu 2018).

V období rokov 2002 – 2018 na aktivity vyrad'ovania bolo medzi EBOR a JAVYS, a.s. podpísaných 18 grantových dohôd v celkovej sume 472 mil. eur. K 31. októbru 2018 bolo z ukončených 8 grantových dohôd vrátené do fondu BIDSF zostatky v celkovej výške 8,8 mil. eur.

V období rokov 2016 – 2018 bola podpísaná medzi SIEA a JAVYS, a.s. na aktivity vyrad'ovania 1 grantová dohoda v celkovej sume 26,296 mil. eur.

Aktuálne spoločnosť JAVYS, a.s. má na projekty vyrad'ovania pridelenú alokáciu v celkovej hodnote 467 mil. eur z BIDSF a alokáciu zo SIEA v celkovej hodnote 26,296 mil. eur. Z týchto prostriedkov bolo na projekty vyrad'ovania JE V1 k 31. októbru 2018 vyčerpaných 273,96 mil. eur z fondu BIDSF a 0 eur zo SIEA.

Celkové finančné zdroje pre účely vyrad'ovania JE V1 k 31. októbru 2018 sú uvedené v grafe:

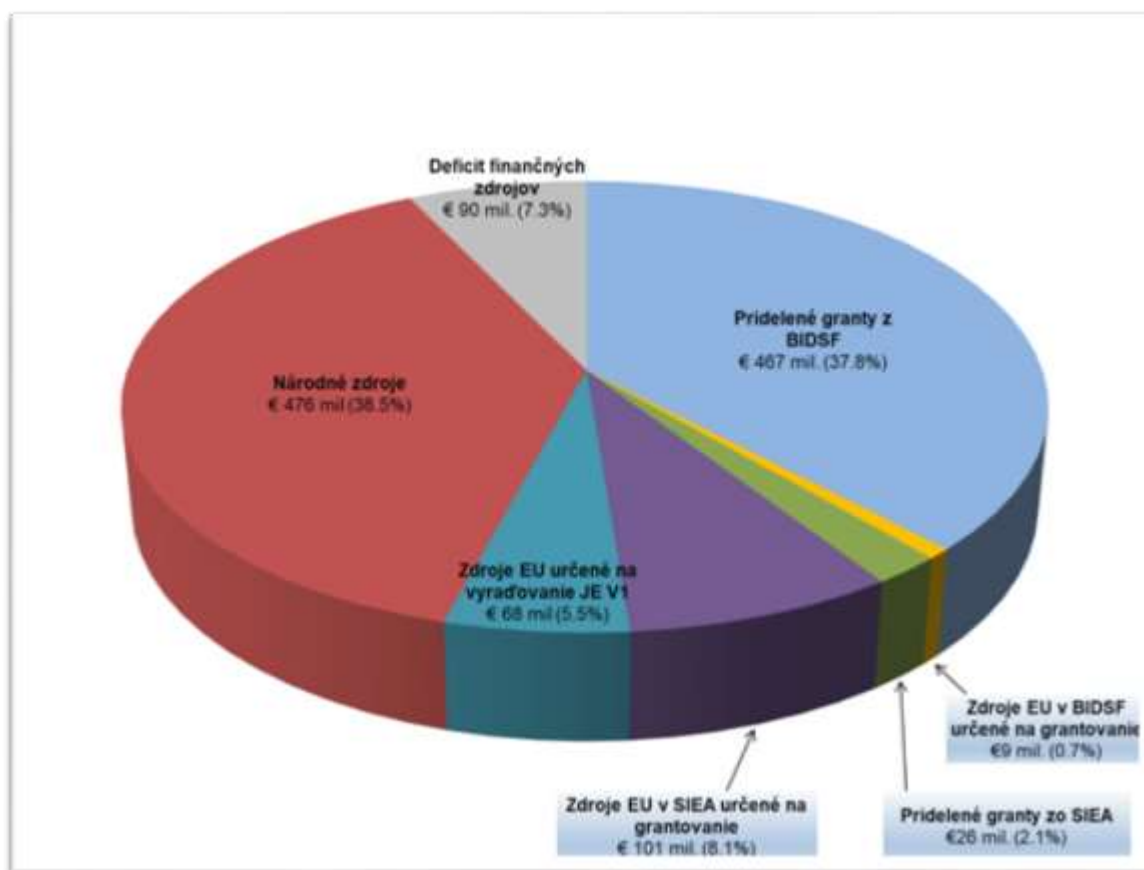

Celkový odhad nákladov vyrad'ovania: 1 237 mil. eur.

V *Prílohe 3* materiálu je uvedené zhrnutie čerpania prostriedkov z fondu BIDSF a prehľad realizácie projektov BIDSF podľa podpísaných grantových dohôd je uvedený v *Prílohe 4*.
