

**INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE IMPLEMENTÁCIE
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
A OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE
V GESCII MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR**

Stav k 31. 10. 2021

Obsah

1	Úvod.....	3
2	Aktuálny stav implementácie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021	3
2.1	Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania	3
2.2	Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR.....	4
3	Pokrok v implementácii PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie	5
3.1	Vyhlásené výzvy/vyzvania	5
3.2	Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá.....	5
3.3	Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 9 a PO 10 OP II za sledované obdobie	5
3.4	Veľký projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and) – stav implementácie	6
4	Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia	10
5	Kritické problémy OPII v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie	12
6	Aktuálny stav implementácie OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021	13
6.1	Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania	13
6.2	Stav kontrahovania a čerpania PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR.....	14
7	Pokrok v implementácii PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie.....	15
7.1	Vyhlásené výzvy/vyzvania.....	15
7.2	Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá	15
7.3	Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 a PO 8 OPLZ za sledované obdobie.....	15
8	Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia	17
9	Kritické problémy OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie	18

1 Úvod

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) vypracovalo v zmysle úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 218/2021 informatívny materiál o aktuálnom stave implementácie operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) a operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj „PO 1 OPLZ“ a „PO 8 OPLZ“) v gescii MŠVVaŠ SR s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu „Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. 03. 2021“.

Cieľom tohto materiálu je najmä:

- informovať o aktuálnom stave implementácie OPII a OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR (prehľad alokovaných finančných prostriedkov vo vyhlásených výzvach, prehľad žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci jednotlivých prioritných osí (ďalej aj „PO“), stav kontrahovania a čerpania);
- informovať o pokroku v implementácii (vyhlásené/ukončené výzvy/vyzvania, pokrok v kontrahovaní v sledovanom období;
- vyhodnotiť plnenie úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia;
- informovať o kritických problémoch a návrhoch na ich riešenie.

Údaje boli spracované k 31. 10. 2021 a popisujú pokrok za obdobie september, október 2021, t. j. od predloženia ostatného materiálu na rokovanie vlády SR v septembri 2021 s údajmi k 31. októbru 2021.

2 Aktuálny stav implementácie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021

2.1 Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania

Prehľad výšky alokácie a sumy a počtu vyhlásených výziev a vyzvaní v rámci prioritných osí 9, 10 operačného programu Integrovaná infraštruktúra k **31. 10. 2021** obsahuje tabuľka č. 1, a to v členení podľa prioritných osí a typu výziev/vyzvaní (resp. počet výziev na dopytovo orientované projekty, vyzvaní na národné projekty).

Tabuľka č.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR


Prehľad výziev/vyzvaní k 31.10.2021				Počet výziev/vyzvaní*					
Prioritná os	Alokácia	Vyhlásené výzvy/vyzvania		Spolu	DOP	NP	FN	TP	VP
	EUR (EÚ Zdroj)	EUR (EÚ Zdroj)	% z alokácie						
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	494 820 162,31	105,92%	20	15	5	0	0	0
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	87 434 847	98 050 000,00	112,14%	5	4	0	0	0	1
SPOLU	554 604 051	592 870 162,31	106,90%	25	19	5	0	0	1

* - výzvy/vyzvania pre viaceré PO sú započítané 2 krát (zvlášť pre každú os)

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Počet výziev a suma vyhlásených výziev v PO 9 MŠVVaŠ a VA bola znížená o výzvu s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC). Prerušená bola implementácia zakontrahovaných projektov v rámci predmetnej výzvy a došlo k zaevidovaniu systémovej nezrovnalosti na programovej úrovni do ITMS2014+, ktorá nedovoľuje zrealizovať čerpanie prostriedkov z výzvy. Keďže na EK nebudú deklarované výdavky z tejto výzvy, boli údaje vo vykazovaní formálne upravené.

Graf č. 1 Prehľad voľných a alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021

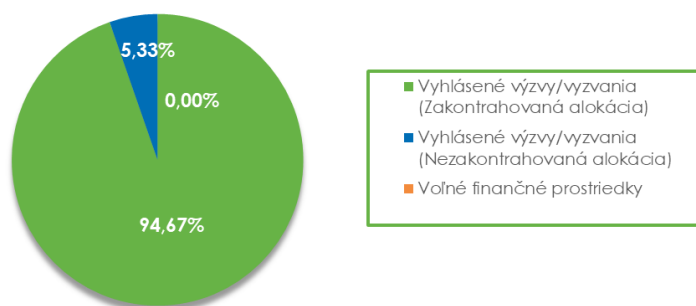

Podiel celkových voľných a alokovaných finančných prostriedkov v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR k **31. 10. 2021** znázorňuje graf č. 1, ktorý zohľadňuje, či sú alokované finančné prostriedky zakontrahované alebo zatiaľ nezakontrahované a premietnuté len do vyhlásených výziev/vyzvaní, t. j. v rámci ktorých aktuálne stále prebieha proces konania o ŽoNFP.

2.2 Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR

Tabuľka č. 2 Kontrahovanie a čerpanie PO 9, 10 OPII k 31. 10. 2021 (EÚ zdroj)

Prioritná os	Alokácia	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)		Čerpanie na úrovni CO	
	EUR	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	442 184 786	94,65%	132 000 348	28,26%
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	87 434 847	81 706 367	93,45%	11 655 038	13,33%
SPOLU	554 604 051	523 891 152	94, 46%	143 655 386	25,90%

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII k **31. 10. 2021** obsahuje tabuľka č. 2 (len projekty v stave riadne ukončené a zmluva uzatvorená), ktorá poskytuje podrobný prehľad výšky a podielu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PO 9, 10 OPII v členení podľa prioritných osí. Číselné údaje v tabuľke sú za EÚ zdroj.

Suma kontrahovania v PO 9 (MŠVVaŠ a VA) bola znížená o sumu projektov zakontrahovaných v rámci výzvy s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).

Tabuľka č. 3 Kontrahovanie PO 9, 10 OPII v roku 2021 (EÚ zdroj)

OPII/ Prioritná os	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	443 008 035	94, 65%	97 375 019	77 938 696	80,04%	19 436 323
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	87 434 847	81 706 367	93,45%	1 567 584	983 807	62,76%	583 777

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Tabuľka č. 4 Čerpanie PO 9, 10 OPII v roku 2021 (EÚ zdroj)

OPII/ Prioritná os	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.20 21	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.202 1 v EUR	% plnenia odporúčané ho ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	132 000 348	28,26%	103 867 534	32 644 111	31,43%	71 223 423
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	87 434 847	11 655 038	13,33%	27 690 625	4 951 108	17,88%	22 739 517

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

3 Pokrok v implementácii PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

3.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania

V mesiaci september, október 2021 nebola vyhlásená žiadna výzva.


3.2 Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá

V mesiaci september, október 2021 neboli ukončené hodnotiace kolá.

3.3 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 9 a PO 10 OP II za sledované obdobie

Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) znázorňuje graf č. 2 spolu s príslušajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Prírastok kontrahovania za príslušné mesiace je v tabuľke údajov vyjadrený v EUR a v percentách v pomere k alokácii jednotlivých prioritných osí OPII v gescii MŠVVaŠ SR.

Graf č. 2 Pokrok v kontrahovaní PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie ¹




	PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	Spolu
Kontrahovanie k 31.08.2021 (EUR)	443 008 035	81 706 367	524 714 402
Prírastok kontrahovania za mesiace september a október 2021 (EUR)	-823 250	0	-823 250
Prírastok kontrahovania za mesiace september a október 2021 (% z alokácie)	-0,18%	0,00%	-0,04%

¹ Poznámka : pokles v kontrahovaní nastal v dôsledku uzatvárania dodatkov k projektom v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít, resp. nevyčerpaním celkovej pôvodne zazmluvnenej alokácie riadne ukončených projektov.

Pokrok v čerpaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) na úrovni certifikačného orgánu znázorňuje graf č. 3 spolu s príslušajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Prírastok čerpania za príslušné mesiace je v tabuľke údajov vyjadrený v EUR a v percentách v pomere k alokácii jednotlivých prioritných osí OPIL v gescii MŠVVaŠ SR.

Graf č. 3 Pokrok v čerpaní PO 9, 10 OPIL v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

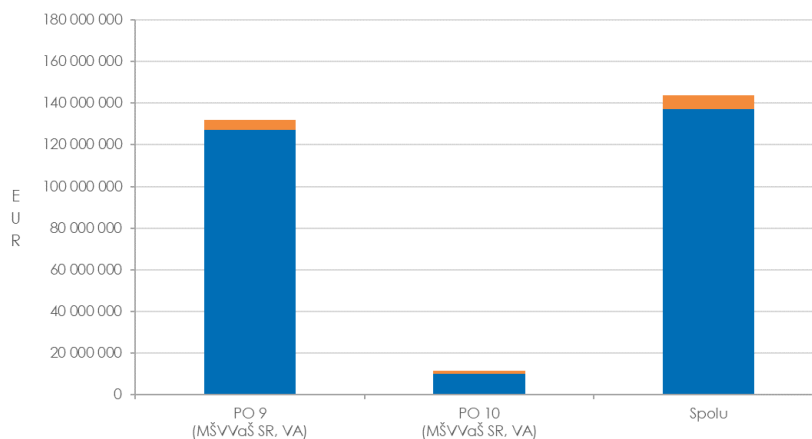

	PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	Spolu
Čerpanie k 31.08.2021 (EUR)	127 095 988	10 045 012	137 141 001
Prírastok čerpania za mesiace september a október 2021 (EUR)	4 904 360	1 610 025	6 514 385
Prírastok čerpania za mesiace september a október 2021 (% z alokácie)	1,05%	0,29%	0,33%

3.4 Veľký projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and) – stav implementácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v programovom období 2014 – 2020 implementuje jeden veľký projekt, ktorého prijímateľom je Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a partnerom Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Vo vzťahu k zostávajúcemu času implementácie t. z. do konca roka 2023, MŠVVaŠ SR sa rozhodlo vykonať nezávislé externé hodnotenie veľkého projektu prostredníctvom spoločností Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o. Cieľom externého hodnotenia bolo vykonať analýzu realizovateľnosti do konca roku 2023, možné riziká implementácie a prínos pre SR, vedeckú obec a študentov.

Stav implementácie

Slovenská technická univerzita v Bratislave: V treťom štvrťroku roku 2021 bolo ukončené verejné obstarávanie „Výskumná infraštruktúra – dodávka prístrojov a zariadení určených pre biotechnológie, boli dodané prístroje za 1 144 000 EUR. Zazmluvnilo sa dodanie prístrojov pre Hi-tech centrum EMC v celkovej hodnote viac ako 400 000 EUR. Postupne sa ukončuje verejné obstarávanie a dodávatelia zároveň dodávajú prístroje v rámci veľkého balíka prístrojov „Výskumná infraštruktúra – dodávka prístrojov a zariadení v rámci IKT technológií“, v rámci tohto balíka boli dodané prístroje Robot co-worker a Server spolu v hodnote približne 70 000 EUR.

Zároveň prebiehajú stavebné činnosti v súvislosti s obnovou a modernizáciou obalového plášťa bloku B SvF STU – rekuperácia, rekonštrukcia a modernizácia starej budovy FCHPT STU a revitalizácia interiérových častí FEI STU.

Univerzita Komenského v Bratislave: V treťom štvrťroku roku 2021 bolo celkovo bolo odovzdaných do užívania 20 výťahov; ukončená bola rekonštrukcia plynovej prípojky a rozvodov na PRIF UK; začali sa

práce na projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu posluchárni FMFI UK a PRIF UK; pokračovala súťaž na rekonštrukciu zateplenia – fasády a zateplenia – strechy; dokončovali sa projektové dokumentácie na rekonštrukcie vnútorných a vonkajších rozvodov. Začalo sa preberanie laboratórnych a meracích prístrojov, ktoré boli obstarané v dvoch nadlimitných zákazkách. Konkrétne boli kompletne prebraté prístroje pre:

- Rádioizotopové laboratórium – výskumná oblasť Biotechnológií a biomedicína,
- Laboratórium s úrovňou bezpečnosti BSL-3 – výskumná oblasť Biotechnológií a biomedicína.

Finančná implementácia

Tabuľka č. 5: Stav čerpania na úrovni prijímateľa/partnera k 31.10.2021 od začiatku implementácie

		Počet ŽoP	Celkové oprávnené výdavky	EÚ zdroj
Čerpanie žiadosti o platbu („ŽoP“)		55	12 290 243,82	6 145 121,99
(priebežná platba a zúčtovanie predfinancovania) schválené/uhradené na úrovni CO	Celkovo	55	12 290 243,82	6 145 121,99
	STU	48	11 405 607,65	5 702 803,90
	UK	7	884 636,17	442 318,09
Ešte nečerpané žiadosti o platbu (priebežná platba a zúčtovanie predfinancovania)	predložené na sprostredkov ateľský orgán („SO“)	Celkovo	26	2 481 791,11
		STU	23	2 148 790,89
		UK	3	333 000,22
	z toho schválené na úrovni SO	Celkovo	0	0,00
		STU	0	0,00
		UK	0	0,00
žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)	predložené na SO	Celkovo	70	17 793 308,85
		STU	57	11 064 094,77
		UK	13	6 729 214,08
	z toho uhradená na úrovni SO	Celkovo	56	11 278 685,63
		STU	50	10 590 252,30
		UK	6	688 433,33

Harmonogram realizácie VO

Prehľad predstavuje prijímateľmi zaevidované údaje o VO v ITMS 2014+:

Tabuľka č. 6: Prehľad prebiehajúcich a plánovaných VO prijímateľa Slovenská technická univerzita

Názov VO	2021												2022												2023											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - rekuperácia																																				
Obnova a modernizácia - Stará budova FCHPT																																				
Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - Dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov																																				
Revitalizácia interiérových častí budov FEI STU II																																				
FEI IKT Prístroje - HI-TECH centrum EMC																																				
Počítačové siete a konektivita – Výskumná infraštruktúra – Dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov																																				
Výmena fasádnych parapetov Sjf																																				
FEI – Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov (2. časť)																																				
FCHPT Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov (4. časť)																																				
Sjf Výskumná infraštruktúra - Dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov (4. časť)																																				
Technický dozor investora STU - FCHPT																																				
Technický dozor investora STU - Sjf																																				

4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.
T: v závislosti od termínu MF SR
Plní sa.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov.
T: do 31.05.2021
Splnené. Údaje v aktuálnom zozname strategických projektov za MŠVVaŠ SR sú aktualizované.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.
T: štvrtročne
Plní sa. 2-krát mesačne sa realizujú bilaterálne stretnutia s RO, CKO a CO, kde sa diskutuje o aktuálnom stave implementácie OP. SO pravidelne informuje RO, CKO a CO o napredovaní a rizikách v implementácii veľkého projektu ACCORD a projektoch v dopytovo-orientovaných výzvach.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.
T: 30.09.2021
V procese. MŠVVaŠ SR analyzuje možné riziká implementácie a potenciálny vnútorný presun.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.
T: 30.09.2021
Plní sa. Revíziou OP II, verzia 13 budú ukazovatele upravené tak, aby reflektovali na aktuálny stav implementácie OP v gescii MŠVVaŠ SR.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.
T: 30.09.2021
V procese. MŠVVaŠ SR plánuje vyhlásenie zásobníkovej výzvy zameranej výhradne na personálne výdavky výskumných aktivít, ktorej projekty by sa po neplánovanom uvoľnení alokácie dostali do implementácie s vysokým potenciálom riadneho ukončenia do konca programového obdobia.
SO analyzuje možnosti fázovania projektov, kde je potenciálne riziko neukončenia implementácie projektu do konca 2023, v spolupráci s RO a CKO.
10. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR.
T: priebežne
Plní sa. MŠVVaŠ SR umožnilo vo výzve využívanie predfinancovania resp. zálohových platieb pre všetky subjekty za účelom urýchlenia dostupnosti finančných prostriedkov na samotnú realizáciu výskumných aktivít. Zároveň intenzívne komunikuje s prijímateľmi s cieľom zrýchlenia a zefektívnenia implementácie projektov.
11. Zabezpečiť čerpanie veľkého projektu ACCORD na úrovni 22,9 mil. EUR, v zmysle plánu čerpania SO.
T: 30.11.2021
Plní sa. MŠVVaŠ SR poskytuje maximálnu možnú podporu v oblasti verejného obstarávania, ktoré má najväčší vplyv na dosiahnutie stanovenej úrovne čerpania v roku 2021. SO realizuje viaceré opatrenia na zefektívnenie čerpania veľkého projektu ACCORD.

5 Kritické problémy OPIL v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie

Kritickým problémom OPIL v gescii MŠVVaŠ SR sú verejné obstarávania. Takmer každý projekt má minimálne dve verejné obstarávania v nadlimitnej zákazke, čo spôsobuje, že objem čerpaných prostriedkov nastupuje neskôr.

Ďalším problémom je zdražovanie stavebných materiálov a prác z dôvodu prerušenia výroby počas pandémie koronavírusu celosvetovo na niekoľko mesiacov a po opätovnom spustení je na trhu nedostatok materiálov. To má za následok predražovanie zákazok, zvýšenie nákladov pre verejných obstarávateľov, keďže súčasné financovanie je drahšie v porovnaní s priebežným čerpaním financií.

Prijaté opatrenia:

Zjednodušenie procesov administrácie počas implementácie projektov - SO neustále analyzuje možnosti a spôsoby vedúce k urýchleniu čerpania finančných prostriedkov. V súčasnosti prebieha komunikácia s CKO a CO ohľadom hľadania možnosti uplatnenia zmien v postupoch administratívnej finančnej kontroly, kde SO čerpá aj zo skúseností z Českej republiky, kde sú postupy AFK jednoduchšie a menej byrokratické. S účinnosťou od 01. 10. 2021 bola vydaná verzia 5.0 PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU pre národné projekty a veľký projekt v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci ktorej došlo k zavedeniu zjednodušeného pracovného výkazu a možnosti predkladania osobných výdavkov prostredníctvom sumarizačných hárkov. Zároveň dňa 10. 09. 2021 bola SO poskytnutá výnimka zo Vzoru CKO č. 13 vo vzťahu k vyplňaniu podrobného popisu overenia každej otázky v časti „Poznámka“ formulárov kontrolných zoznamov.

MŠVVaŠ SR ako SO OPIL pristúpilo k zintenzívneniu komunikácie s prijímateľmi. V prípade národných projektov a veľkého projektu sa realizujú bilaterálne pracovné stretnutia na pravidelnej báze, kde sa prioritne rieši zefektívnenie čerpania a riešenie rôznych situácií so zámerom predchádzania, resp. eliminácii rizík pri implementácii a naplňaní cieľov a merateľných ukazovateľov, ako aj možnosti zníženia administratívnej záťaže.

Posilnenie administratívnych kapacít implementačnej zložky sekcie štrukturálnych fondov EU MŠVVaŠ SR - v aktuálnom období dochádza k zvýšeniu počtu projektových manažérov vykonávajúcich kontrolu žiadostí o platbu a kontrolu VO, a to prostredníctvom obsadzovania voľných pracovných miest, vnútornou reorganizáciou sekcie a zamestnávaním externých pracovníkov. Uvedené opatrenie má pozitívny efekt na dĺžku spracovania predkladaných žiadostí o platbu.

6 Aktuálny stav implementácie OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021

6.1 Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania

Prehľad výšky alokácie a sumy a počtu vyhlásených výziev a vyzvaní v rámci PO 1 a PO 8 operačného programu Ľudské zdroje v gescii MŠVVaŠ SR k **31. 10. 2021** obsahuje tabuľka č. 5, a to v členení podľa typu výziev/vyzvaní.


Tabuľka č. 8 Vyhlásené výzvy/vyzvania PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR

Prehľad výziev/vyzvaní k 31. 10. 2021				Počet výziev/vyzvaní		
Prioritná os	Alokácia	Vyhlásené výzvy/vyzvania		Spolu	DOP	NP
	EUR (EÚ Zdroj)	EUR (EÚ Zdroj)	% z alokácie			
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	418 181 410,54	119,91 %	21	9	12
PO 8 (MŠVVaŠ SR, SO)	20 770 000	26 269 196,89	126,47 %	2	0	2
SPOLU	369 511 004	444 450 607,43	120,28 %	23	9	14

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Výzvy a vyzvania boli vyhlásené vo vyššej alokácii ako je alokácia PO 1 a PO 8 OPLZ, pričom z PO 8 boli vyhlásené obe plánované vyzvania. Bližšie informácie ku kontrahovaniu finančných prostriedkov z vyhlásených výziev a vyzvaní sú uvedené v ďalších častiach materiálu.


Graf č. 4a Prehľad voľných a kontrahovaných finančných prostriedkov PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021



Graf č. 4a znázorňuje podiel celkových voľných a alokovaných finančných prostriedkov v rámci PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021, t. j. zakontrahované prostriedky v objeme **333 192 066 EUR**, čo tvorí **95,54 %** z objemu alokácie PO 1 OPLZ. Výška kontrahovania predstavuje kontrahovanie očistené o nevyčerpané prostriedky z riadne ukončených projektov. 4,46 % alokácie PO 1 OPLZ, t. j. 15 548 938 EUR, predstavujú viazané prostriedky z už vyhlásených výziev a vyzvaní, ktoré však ešte nie sú kontrahované ako aj predpokladané nedočerpanie projektov v realizácii.

MŠVVaŠ SR na základe priebežnej analýzy odhaduje pri jednotlivých výzvach a národných projektoch nedočerpanie zohľadňujúc skúsenosti z implementácie, charakter projektov či ich dĺžku realizácie. Zohľadňujúc priebežnú analýzu, ako aj aktuálny a plánovaný stav kontrahovania a čerpania predpokladáme k 31. 10. 2021 úspory v objeme **13,1 mil. EUR** (EÚ zdroje).

Graf č. 4b Prehľad voľných a kontrahovaných finančných prostriedkov PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021



Graf č. 4b znázorňuje podiel celkových finančných prostriedkov v rámci PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 10. 2021, t. j. zakontrahované prostriedky v objeme **6 266 590 EUR**, čo tvorí **30,17 %** z objemu alokácie PO 8 OPLZ. 69,83 % alokácie PO 8 OPLZ, t. j. 14 503 410 EUR, predstavujú viazané prostriedky, z už vyhláseného vyzvania.

6.2 Stav kontrahovania a čerpania PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR

Tabuľka č. 9 Kontrahovanie a čerpanie PO 1 a PO 8 OPLZ k 31. 10. 2021 (EÚ zdroj)

Prioritná os	Alokácia	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)		Čerpanie na úrovni CO	
	EUR	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	333 192 066	95,54 %	147 950 318	42,42 %
PO 8 (MŠVVaŠ SR, SO)	20 770 000	6 266 590	30,17 %	0,00	0 %
SPOLU	369 511 004	339 458 656	91,87 %	147 950 318	42,42 %

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Stav kontrahovania a čerpania PO 1 a PO 8 OPLZ k **31. 10. 2021** obsahuje tabuľka č. 9, ktorá zahŕňa projekty v stavoch riadne ukončené, zmluva uzavretá, zmluva uzavretá – pozastavenie realizácie projektu a poskytuje podrobný prehľad výšky a podielu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PO 1 a PO 8 OPLZ.

Tabuľka č. 10 Kontrahovanie PO 1 a PO 8 OPLZ k 31. 10. 2021 (EÚ zdroj)

OPLZ/PO 1 a 8/ SO MŠVVaŠ SR	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčania ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	333 192 066	95,54 %	20 693 045	7 356 167	35,55 %	13 336 878
PO 8 (MŠVVaŠ SR, SO)	20 770 000	6 266 590	30,17 %	20 770 000	6 266 590	30,17 %	14 503 410
SPOLU	369 511 004	339 458 656	91,87 %	41 463 045	13 622 757	32,86 %	20 840 288

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Tabuľka č. 11 Čerpanie PO 1 OPLZ k 31. 10. 2021 (EÚ zdroj)

OPLZ/PO 1/ SO MŠVVaŠ SR	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	147 950 318	42,42 %	105 017 832	52 851 682	50,33 %	52 166 150
PO 8 (MŠVVaŠ SR, SO)	20 770 000	0,00	0,00 %	10 500 000	0,00	0 %	10 500 000
SPOLU	369 511 004	147 950 318	42,42 %	115 517 832	52 851 682	50,33 %	62 666 150

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

7 Pokrok v implementácii PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

7.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania

V sledovanom období v mesiacoch september a október 2021 nebola vyhlásená žiadna výzva/vyzvanie.


7.2 Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá

V sledovanom období prebiehalo prijímanie ŽoNFP z 3. a 4. hodnotiaceho kola výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“ vyhlásenej dňa 31. 05. 2021 v alokácii 7 mil. EUR. Uzávierka 3. hodnotiaceho kola bola 30. 09. 2021, uzávierka 4. hodnotiaceho kola bola 29. 10. 2021 a v súčasnosti prebieha proces konania o žiadosti 13 ŽoNFP predložených v týchto kolách v žiadanej výške 1 620 134 EUR (zdroje EÚ).

7.3 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 a PO 8 OPLZ za sledované obdobie

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) na úrovni certifikačného orgánu znázorňuje graf č. 5 spolu s prislúchajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Údaje sú uvedené v pomere k alokácii PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR.

Graf č. 5 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 OP ĽZ v gescii MŠVVaŠ SR obdobie september - október 2021

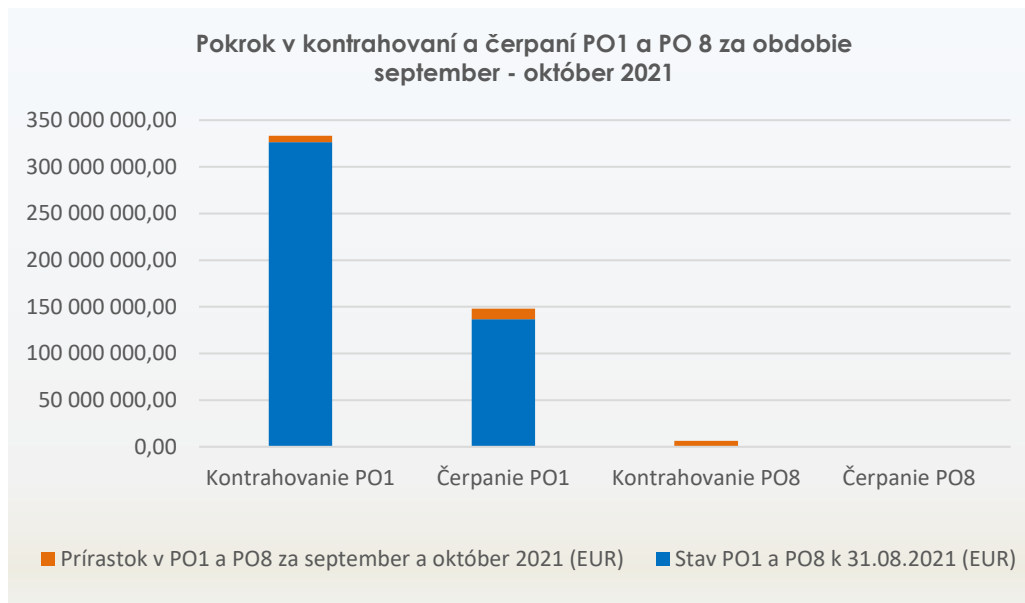

	Kontrahovanie PO1	Čerpanie PO1	Kontrahovanie PO8	Čerpanie PO8
Stav k 31. 08. 2021 (EUR)	326 506 182	136 674 530	0,00	0,00
Prírastok/pokles za september až október 2021 (EUR)	6 685 884	11 275 788	6 266 590	0,00
Prírastok za september až október 2021 (% z alokácie)	1,9 %	3,2 %	N/A	0 %

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Výška kontrahovania za PO 1 OP ĽZ k 31.10.2021 je **333 192 066 EUR (t. j. 95,54 % z alokácie PO 1)**. K nárastu objemu kontrahovaných prostriedkov za ostatné obdobie prispeli zvýšenie kontrahovania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ ako aj kontrahovanie projektov v rámci 1. kola výzvy „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“. Nárast kontrahovania do konca roku 2021 sa predpokladá z ďalších projektov tejto výzvy. Ďalšie kontrahovanie sa predpokladá v 1. kvartáli 2022 v rámci národného projektu „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v alokácii 16,1 mil. EUR, v dôsledku čoho sa očakáva nárast kontrahovania PO 1 v 1. kvartáli 2022 na 349 mil. EUR.

V rámci PO 8 OP ĽZ v gescii MŠVVaŠ SR došlo v sledovanom období ku kontrahovaniu prostriedkov v rámci národného projektu vo výške 6 266 590 EUR, čo tvorí 30,17 % z alokácie PO 8 OP ĽZ v gescii MŠVVaŠ SR. Ďalšie kontrahovanie predpokladá MŠVVaŠ SR v rámci národného projektu „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v 1. kvartáli 2022.

Čerpanie

V sledovanom období v mesiacoch september a október 2021 sa zvýšilo čerpanie v rámci PO 1 OP IŽ o 11 275 788 EUR. Celkovo je k 31. 10. 2021 čerpanie PO 1 vo výške 147 950 318 EUR, t. j. 42,42 % z alokácie PO OP IŽ.

V rámci PO 8 OP IŽ v gescii MŠVVaŠ SR v sledovanom období ešte nedošlo k čerpaniu prostriedkov. Avšak v rámci národného projektu „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ bola poskytnutá prijímateľovi záloha vo výške 1 000 000 EUR.

8 Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia

ÚLOHY / ODPOČTY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 1 OPLZ) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme minimálne 105 mil. EUR.
T: 30. 11. 2021
Plní sa. Čerpanie od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 je v objeme 52 851 682 EUR (zdroje EÚ), čo predstavuje 50,33 %. Dňa 16.09.2021 zaslalo MŠVVaŠ SR na MIRRI SR v zmysle ich požiadavky upravený plán čerpania. MŠVVaŠ SR uviedlo v tomto pláne čerpanie na rok 2021 vo výške 83 560 737 EUR. Plnenie tohto plánu k 31.10.2021 je na úrovni 52 851 682 EUR, čo predstavuje 63,25 % plánovanej sumy.
2. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.
T: 31. 12. 2021.
Plní sa. MŠVVaŠ v rámci PO 1 OP IŽ vyhlásilo dňa 31. 05. 2021 výzvu OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“ v alokácii 7 mil. EUR (zdroje EÚ). Dňa 16. 07. 2021 bolo vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v alokácii 16 159 023,912 EUR. V rámci PO 8 bolo 02. 07. 2021 vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ v alokácii 6 269 196,89 EUR a 16. 07. 2021 bolo vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v alokácii 20 mil. EUR.
Zároveň MŠVVaŠ SR pristúpi k predĺženiu projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov o jeden školský rok.
3. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.
T: v závislosti od termínu MF SR.
Plní sa.
4. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov.
T: do 31. 05. 2021
Spĺnené. Plán čerpania strategických projektov (NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II) bol zaslaný emailom na CKO dňa 7. mája 2021.
5. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.
T: štvrtročne.
Plní sa. Čerpanie strategického projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ je k 31. 10. 2021 v objeme **13 070 423 EUR**, z toho čerpanie za január až október 2021 dosahuje výšku 8 201 964 EUR, čo predstavuje 91,79 % z plánovanej sumy čerpania k 31. 10. 2021 (8 935 745 EUR, EÚ zdroje). Čerpanie strategického projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ je k 31. 10. 2021 v objeme **14 529 183 EUR**, čo zároveň predstavuje čerpanie za obdobie január až október 2021, t. j. 77,15 % z plánovanej sumy čerpania k 31. 10. 2021 (18 832 820 EUR, EÚ zdroje).

Nedočerpanie finančných prostriedkov z dôvodu neobsadenia pracovných pozícií asistentov učiteľa, pedagogických asistentov a členov inkluzívneho tímu v zapojených školách bude riešené predĺžením národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov o jeden školský rok.

6. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.
T: 30. 09. 2021.
Splnené. Riziká/problémy sú bližšie opísané nižšie v kapitole 9 tohto materiálu. Nové aktivity nie je potrebné do operačného programu dopĺňať.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.
T: 30. 09. 2021
Splnené. K 30. 09. 2021 všetkých 7 fyzických ukazovateľov výkonnostného rámca PO 1 OP ĽZ dosahuje nadpriemerné plnenie hodnôt voči Zámeru pre rok 2023. Plnenie finančných ukazovateľov výkonnostného rámca PO 1 OP ĽZ je voči Zámeru pre rok 2023 na úrovni 36,94 % za MRR a 24,94 % za VRR. Opatrenia na zlepšenie čerpania sú popísané v časti 9.
8. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.
T: 30. 09. 2021
Splnené
9. Zabezpečiť zrýchlenie implementácie COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR.
T: priebežne
Plní sa. Projekty sa realizujú v súlade s harmonogramom realizácie aktivít.

9 Kritické problémy OPĽZ v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie

1. Kritickým problémom OPĽZ v gescii MŠVVaŠ SR je výška čerpania. Hlavnou príčinou nízkeho čerpania je predovšetkým vysoký počet dopytovo – orientovaných projektov a s tým spojené veľké množstvo predkladaných ŽoP v nízkom, opakujúcom sa objeme. Ide predovšetkým o ŽoP z DOP, v ktorých ide vo veľkej miere predovšetkým o preplácanie mzdových výdavkov, ktoré sú viazané na mesačné mzdy a nedostatočný počet administratívnych kapacít na spracovanie ŽoP a tým spôsobená nízka miera čerpania.

Prijaté opatrenia:

Zjednodušenie procesov administrácie počas implementácie projektov - SO neustále analyzuje možnosti a spôsoby vedúce k urýchleniu čerpania PO 1. S účinnosťou od 04. 10. 2021 bola vydaná verzia 7.2 Príručky pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie a prioritnú os 8 REACT-EU OP ĽZ, v rámci ktorej došlo k zavedeniu zjednodušeného pracovného výkazu a možnosti predkladania osobných výdavkov prostredníctvom sumarizačných hárkov.

Výzva pre prijímateľov národných projektov s požiadavkou na akceleráciu čerpania finančných prostriedkov - Mailom GR ŠŠF EU MŠVVaŠ SR zo dňa 25. 02. 2021 boli všetci prijímatelia národných projektov informovaní o potrebe maximalizácie úsilia v predkladaní finančných prostriedkov prostredníctvom žiadostí o platbu a urýchlení všetkých procesov súvisiacich s obstarávaním tovarov a služieb. V tejto súvislosti sú prijímatelia povinní zasielať každomesačné odhady očakávaných výdavkov, ktoré sú predmetom posúdenia SO. Zároveň MŠVVaŠ SR ako SO OPĽZ pristúpilo k zintenzívneniu komunikácie s prijímateľmi. V prípade národných projektov sa realizujú bilaterálne pracovné stretnutia na pravidelnej báze, kde sa prioritne rieši zefektívnenie čerpania a riešenie rôznych situácií so zámerom predchádzania, resp. eliminácii rizík pri implementácii a naplňovaní cieľov a merateľných ukazovateľov, ako aj možnosti zníženia administratívnej záťaže.

Posilnenie administratívnych kapacít implementačnej zložky sekcie štrukturálnych fondov EU MŠVVaŠ SR - V aktuálnom období dochádza k zvýšeniu počtu projektových manažérov vykonávajúcich kontrolu žiadostí o platbu a kontrolu VO, a to prostredníctvom obsadzovania voľných pracovných miest, vnútornou reorganizáciou sekcie a zamestnávaním externých pracovníkov. Uvedené opatrenie má pozitívny efekt na dĺžku spracovania predkladaných žiadostí o platbu.

Využívanie foriem zjednodušeného vykazovania výdavkov v rámci implementácie projektov z výziev/vyzvaní roka 2019 a 2020 (vstupujúce do financovania v rokoch 2020 – 2023) - Implementácia projektov, v rámci ktorých dochádza k uplatňovaniu výdavkov prostredníctvom zjednodušeného vykazovania výdavkov, čo výrazným spôsobom zjednodušuje a zrýchľuje proces spracovávania žiadostí o platbu.

Uplatňovanie udelenej výnimky CKO zo SR EŠIF na po 2014 – 2020, verzia 9 v znení: „SO OP LZ je oprávnený počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nevykonávať finančnú kontrolu na mieste počas realizácie aktivít projektov OPLZ. Zároveň je SO OPLZ povinný vykonať všetky dotknuté finančné kontroly na mieste projektov OPLZ po odvolaní mimoriadnej situácie.“ - SO v súčasnosti nevykonáva finančnú kontrolu na mieste, ktorá by vzhľadom na vysoký počet implementovaných projektov výrazným spôsobom zasiahla do činností administratívnych kapacít SO. Do budúca je snahou SO vykonávať finančnú kontrolu na mieste iba na vzorke projektov, čím by sa výrazným spôsobom znížila administratívna záťaž implementačnej zložky SO. Predmetné SO komunikuje a diskutuje CKO a CO.

2. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nákazy vírusu COVID-19 dochádza k pozastaveniu realizácie aktivít projektov a predlžovaniu harmonogramu ich realizácie. Uvedené môže mať negatívny dopad na výšku čerpania finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie.

Prijaté opatrenia: Predlžovanie realizácie projektov nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z výzvy na predkladanie ŽoNFP.

3. V rámci zákaziek s nízkou hodnotou SO eviduje veľké množstvo nespracovaných VO, ktoré boli na SO predložené osobitne alebo v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu.

Prijaté opatrenia: Navyšovanie administratívnych kapacít prostredníctvom interných aj externých pracovníkov.
