

Informácia o stave implementácie
európskych štrukturálnych a investičných fondov
k 31.08.2023

Obsah

1.	Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 31.08.2023	3
1.1	Stav implementácie podľa operačných programov	5
1.2	Porovnanie stavu a zostatkov čerpania k 31.08.2023 podľa jednotlivých OP	7
1.3	Stav implementácie podľa jednotlivých rezortov bez prioritných osí technickej pomoci	8
2.	Stav implementácie FAST-CARE a SAFE a pokrok od 15.05.2023	10
2.1	Implementácia FAST-CARE	10
2.2	Implementácia SAFE	12
3.	Fázované a nefunkčné projekty	15
3.1	Fázované projekty	15
3.2	Nefunkčné projekty	16
4.	Správa k zvýšeniu kvality a návratnosti projektov v PO 7 - Informačná spoločnosť v rámci OP II	18
Príloha č. 1:	Zoznam fázovaných projektov z PO 14-20 do PO 21-27 (stav k 28.08.2023)	19
Príloha č. 2:	Zoznam tzv. nefunkčných projektov z PO 14-20 (stav k 28.08.2023)	20
Príloha č. 3:	Zoznam 27 projektov, hodnotených v období 18.07.2023 – 31.08.2023 (informácie zodpovedajú stavu k 31.08.2023)	22
Príloha č. 4:	Odporúčania pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe	23

1. Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 31.08.2023

V programovom období 2014 – 2020 sa implementujú fondy EÚ prostredníctvom 11 operačných programov, pričom za implementáciu každého operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán.

Informácia je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31.12.2025.

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR na realizáciu operačného programu. RO je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 plne zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.

Rok 2023 je pre RO kľúčový na zabezpečenie riadneho ukončovania programov. RO v tejto fáze implementácie finalizujú prípravy posledných žiadostí o zmenu programu, zabezpečujú zvýšený počet administratívnych kontrol žiadostí o platbu, ukončovanie projektov, prípravu fázovania niektorých projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí a zabezpečujú všetky potrebné postupy pre úspešné ukončovanie programov.

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie EŠIF, ktorý je na úrovni 104,86 %, je zároveň kľúčové, aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023. Efektívne čerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich rézii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli. Všetky úhrady výdavkov v rámci projektov v súlade s európskou legislatívou sú prijímatelia povinní vykonať do 31. decembra 2023.

Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na certifikačný orgán MF SR.

Z celkovej alokácie 14,50 mld. EUR je k 31.08.2023 vyčerpaných 11,18 mld. EUR a zostáva vyčerpať ešte 3,32 mld. EUR (EÚ zdroj), z čoho:

- 1,07 mld. EUR pôjde na riešenie energokrízy;
- 95 mil. EUR na podporu UA utečencov (220 mil. EUR už bolo vyplatených);
- 2,16 mld. EUR na realizáciu zazmluvnených projektov.

POKROK V IMPLEMENTÁCII OD 15.05.2023 DO 31.08.2023:

- ✓ v roku 2023 bolo k 31.08.2023 vyčerpaných spolu 1,57 mld. EUR, z toho 65 % t. j. 1,02 mld. EUR od 15.05. do 31.08.2023;
- ✓ nárast čerpania o 1,02 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 7,05 p.b.; zo 70,02 % na 77,07 %;
- ✓ nárast kontrahovania o 334,83 mil. EUR;
- ✓ prebieha príprava národných projektov v rámci SAFE (energokríza) tak, aby prvá platba prebehla v 4.Q 2023 – k 31.08.2023 už bola predložená ŽoNFP v rámci OP II;
- ✓ nárast kontrahovania o 292,94 mil. EUR na podporu UA utečencov prostredníctvom iniciatívy FAST CARE v rámci OP IŽ, OP II a IROP;
- ✓ nárast čerpania o 220,30 mil. EUR na podporu UA utečencov prostredníctvom iniciatívy FAST CARE v rámci OP IŽ, OP II a IROP.

Kľúčové opatrenia na vyčerpanie 3,32 mld. EUR sú:

1. ukončovanie implementácie projektov zo strany prijímateľov do 31.12.2023 a dočerpanie zostávajúcich alokácií jednotlivých programov;
2. **SAFE** (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) **v súčasnosti RO avizujú vyčleniť 1,07 mld. EUR**, s možnosťou navýšenia až do výšky 1,45 mld. EUR, a to na pomoc zraniteľným domácnostiam prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP;

3. **FAST CARE** (pomoc UA utečencom) – **315,26 mil. EUR** je presmerovaných na výdavky súvisiace s prvotným prijatím **UA utečencov** a ich integráciou do spoločnosti prostredníctvom 3 OP, a to: IROP, OP ĽZ a OP II. **K 31.08.2023 bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 330,79 mil. EUR (104,93 %), zazmluvnených 307,11 mil. EUR (97,42 %) a vyplatených 220,30 EUR (69,88 %).**
4. **využívanie 15 % flexibility** čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci operačného programu/fondu bez potreby realokácie;
5. **analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní** vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK;
6. **využívanie fázovania – možné** rozdelenie projektov na 2 fázy, z ktorých druhá bude ukončená v programovom období 2021 – 2027. Jednotlivé RO a SO predložili do 31.08.2023 aktualizáciu menného zoznamu projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia alokácií na 1. a 2. fázu (príloha č. 1);
7. **sfunkčnenie projektov najneskôr do 15. februára 2027, ktoré nebudú do 31. decembra 2023 finančne ukončené** (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa). Jednotlivé RO a SO predložili do 31.08.2023 indikatívny zoznam tzv. nefunkčných projektov (príloha č. 2);
8. **využívanie dodatočného príspevku, teda využitie prostriedkov získaných uplatnením 100 % financovania** výdavkov zo strany EK za 7. a 8 účtovný rok na dofinancovania zvýšených výdavkov projektov;
9. **využitie dočasného nadkontrahovania a nadčerpania** v sume 496 mil. EUR s cieľom vyčerpať 100 % alokácie záväzkov EK.

Tabuľka č. 1: Prehľad opatrení na vyčerpanie 3,32 mld. EUR

Operačný program	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (alokácia - čerpanie)	Plánovaná realokácia na energokrízu	Realokácia na migračnú krízu (zostatok)	Zostáva vyčerpať po realokácii na energo a migračnú krízu
OP Integrovaná infraštruktúra	1 511 995 161	574 818 551	10 472 222	926 704 388
OP Kvalita životného prostredia	880 692 871	422 385 361		458 307 510
Integrovaný regionálny OP	430 138 689	76 366 735	48 507 456	305 264 498
OP Ľudské zdroje	403 684 808	-	35 980 213	367 704 594
OP Efektívna verejná správa	53 496 168			53 496 168
PS Interreg V-A SK-AT	18 898 115			18 898 115
PS Interreg V-A SK-CZ	16 440 350			16 440 350
OP Technická pomoc	4 073 331			4 073 331
OP Rybné hospodárstvo	5 212 647			5 212 647
Program spolupráce INTERACT III	277 213			277 213
EŠIF bez PRV:	3 324 909 352	1 073 570 647	94 959 891	2 156 378 814

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO

Z objemu 3,32 mld. EUR je plánovaných na:

- ✓ **SAFE**, t. j. riešenie energokrízy: 1,07 mld. EUR
- ✓ **FAST CARE**, podpora UA utečencov: 95 mil. EUR (220 mil. EUR už bolo vyčerpaných)
- ✓ **realizácia zazmluvnených projektov EŠIF: 2,16 mld. EUR (t.j. 15 % z alokácie)**

K 31.08.2023 je v realizácii ešte 6 533 projektov (**okrem projektov FAST CARE**) so zazmluvnenou sumou 9,49 mld. EUR, z ktorých je **ešte nevyčerpaných 4,55 mld. EUR** (EÚ zdroj).

1.1 Stav implementácie podľa operačných programov

Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 14,50 mld. EUR (oproti pôvodnej alokácii vo výške 13,78 mld. EUR došlo v rokoch 2021 – 2022 k navýšeniu o zdroje REACT-EU vo výške 722,25 mil. EUR).

➤ Výzvy/vyzvania

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 sprístupnili riadiace orgány v **844 výzvach a vyzvaniach** pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 31.08.2023 finančné prostriedky vo výške **22,52 mld. EUR**, čo predstavuje **155,69 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

➤ Kontrahovanie

Úroveň **kontrahovania** všetkých fondov alokovaných pre SR (okrem EPFRV) v rámci programového obdobia 2014 – 2020 dosiahla k 31.08.2023 hodnotu **15,21 mld. EUR**, čo predstavuje **104,86 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

➤ Čerpanie

K 31.08.2023 dosiahla SR za všetky fondy (okrem EPFRV) alokované pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni **11,18 mld. EUR**, čo predstavuje **77,07 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Do konca programového obdobia je ešte potrebné vyčerpať 3,32 mld. EUR. Čerpanie je možné až do marca 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na MF SR.

Pokrok od 15.05.2023 do 31.08.2023: nárast kontrahovania o 334,83 mil. EUR a čerpania o 1,02 mld. EUR (zo 70,41 % na 77,07 %).

Tabuľka č. 2: Stav implementácie jednotlivých OP k 31.08.2023

Operačný program	Zodpovedný rezort/orgán	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (EÚ zdroj)	% kontrahovania	% čerpania	Ostáva vyčerpať do 3/2024 (rozdiel alokácie a aktuálneho čerpania)	Ostáva vyčerpať do 3/2024 (rozdiel alokácie a aktuálneho čerpania) bez SAFE
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	2 996 457 169	3 082 260 649	2 592 772 361	102,86%	86,53%	403 684 808	403 684 808
OP Integrovaná infraštruktúra	MD SR	6 009 937 611	6 433 861 030	4 497 942 450	107,05%	74,84%	1 511 995 161	937 176 610
OP Kvalita životného prostredia	MŽP SR	2 832 531 290	2 636 555 788	1 951 838 419	93,08%	68,91%	880 692 871	458 307 510
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	1 935 724 762	2 324 028 166	1 505 586 073	120,06%	77,78%	430 138 689	353 771 954
OP Efektívna verejná správa	MV SR	354 655 437	364 332 907	301 159 269	102,73%	84,92%	53 496 168	53 496 168
OP Technická pomoc	MIRRI SR	159 071 912	156 528 893	154 998 581	98,40%	97,44%	4 073 331	4 073 331
OP Rybné hospodárstvo	MPRV SR	7 736 596	3 132 138	2 523 949	40,48%	32,62%	5 212 647	5 212 647
PS Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	90 747 227	73 699 113	100,67%	81,76%	16 440 350	16 440 350
PS Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	75 798 423	56 994 566	99,88%	75,10%	18 898 115	18 898 115
Program spolupráce INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	39 115 381	100,00%	99,30%	277 213	277 213
EŠIF bez PRV		14 501 539 515	15 206 637 816	11 176 630 163	104,86%	77,07%	3 324 909 352	2 251 338 705

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)


Tabuľka č. 3: Pokrok v implementácii od 15.05.2023 po jednotlivých OP

Program	Kontrahovanie zmena od 15.05.2023		Čerpanie EŠIF zmena od 15.05.2023	
	EÚ zdroj	p.b.	EÚ zdroj /za 7. a 8. ÚR za všetky zdroje bez pro-rata pre niektoré OP	p.b.
OP Ľudské zdroje	-43 104 543	-1,44%	104 236 623	3,48%
OP Integrovaná infraštruktúra	52 085 681	0,87%	418 885 453	6,97%
OP Kvalita životného prostredia	78 411 763	2,77%	97 199 160	3,43%
Integrovaný regionálny OP	228 261 358	11,79%	377 353 948	19,49%
OP Efektívna verejná správa	19 584 538	5,52%	9 221 527	2,60%
OP Technická pomoc	1 583 871	1,00%	4 251 972	2,67%
OP Rybné hospodárstvo	33 470	7,47%	40 624	6,17%
Interreg V-A SK-CZ	-1 846 945	-2,05%	4 281 635	4,75%
Interreg V-A SK-AT	-529 816	-0,70%	5 120 555	6,75%
PS INTERACT III	0	0,00%	0	0,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	334 479 379	2,32%	1 020 591 498	7,05%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Pozn. mínusové položky v tabuľke - naďalej pokračovalo „upratovanie“ v rámci zazmluvnených projektov (mimoriadne ukončenie projektov, zohľadnenie nevyčerpania celej zazmluvnenej sumy, uzatvorenie dodatkov znižujúcich zazmluvnenú sumu,...).

Graf č. 1: Vývoj čerpania EŠIF v roku 2023 (do 31.08.2023)

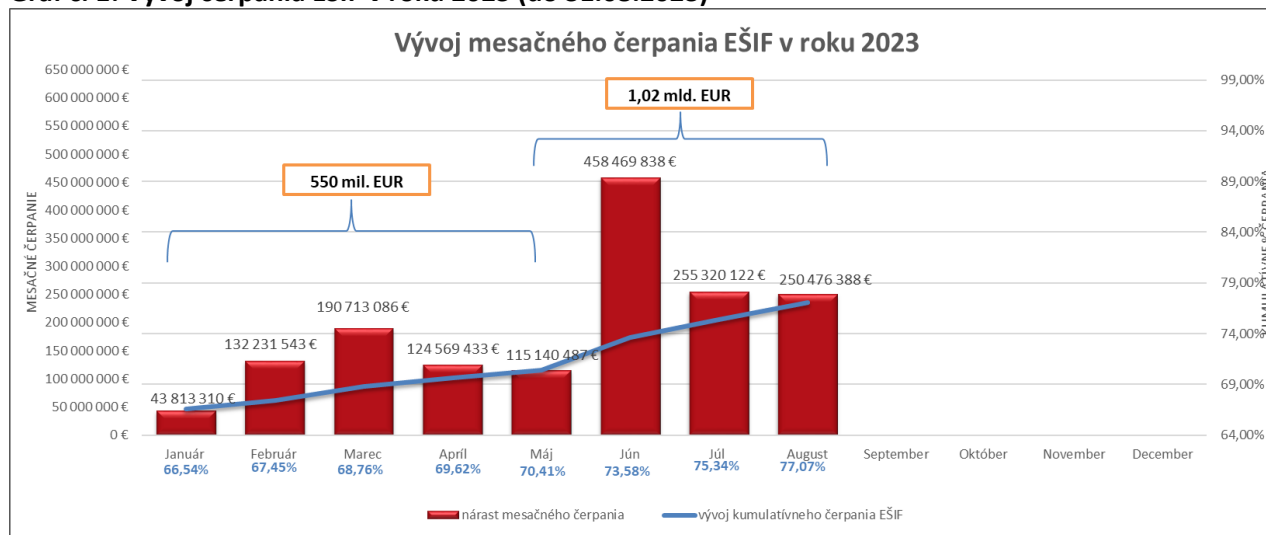


Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

V roku 2023 bolo k 31.08.2023 vyčerpaných spolu 1,57 mld. EUR, z toho v období 01.01.2023 – 14.05.2023 to bolo 550 mil. EUR a v období 15.05.2023 - 31.08.2023 takmer dvojnásobok - 1,02 mld. EUR.

1.2 Porovnanie stavu a zostatkov čerpania k 31.08.2023 podľa jednotlivých OP

Graf č.2: Stav čerpania podľa OP k 31.08.2023

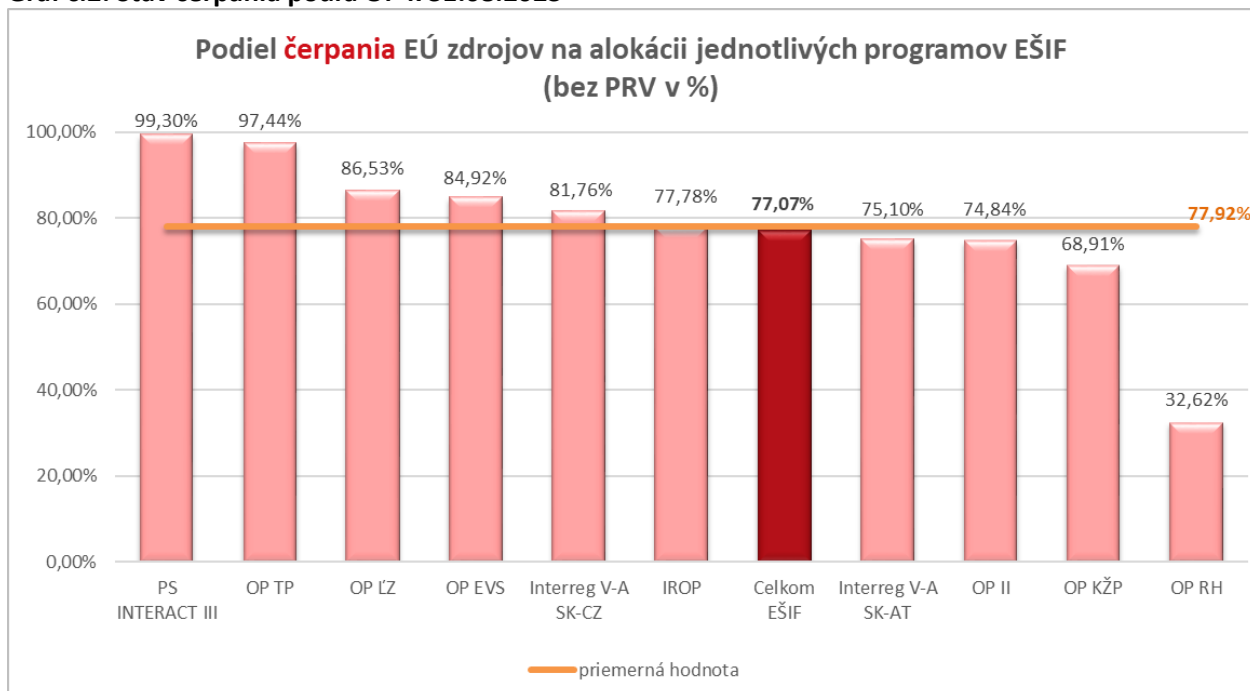

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

Graf č.3: Zostáva vyčerpať do konca programového obdobia podľa OP k 31.08.2023 (vrátane SAFE)



Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

Do konca programového obdobia (najneskôr do marca 2024) zostáva vyčerpať ešte **3,32 mld. EUR**

Najviac zostáva vyčerpať za:

- **OP II (1,51 mld. EUR)**, čo predstavuje 25,16 % alokácie,
- **OP KŽP (880,69 mil. EUR)**, čo predstavuje 31,09 % alokácie,
- **IROP (430,14 mil. EUR)**, čo predstavuje 22,22 % alokácie.

1.3 Stav implementácie podľa jednotlivých rezortov bez prioritných osí technickej pomoci

Viacere rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov podieľajú a sú zodpovedné, či už ako RO alebo SO, za implementáciu celého, resp. časti OP. Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad o stave kontrahovania a čerpania celej alokácie, ktorej implementáciu zabezpečuje príslušný rezort, ako aj prehľad objemov finančných prostriedkov, ktorých čerpanie je potrebné zabezpečiť za jednotlivé rezorty do konca programového obdobia 2014 – 2020.

Tabuľka č. 4: Stav implementácie v rozdelení po rezortoch k 31.08.2023 - súhrnne za rezorty

Rezort/OP	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj) (bez SAFE)	Alokácia SAFE	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (EÚ zdroj)	% kontrahovania (bez SAFE)	% čerpania (bez SAFE)	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (bez SAFE) (alokácia - čerpanie)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	834 458 095		923 333 664	671 789 795	110,65%	80,51%	162 668 300
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP EVS, OP KŽP)	931 935 962		900 024 559	707 249 080	96,58%	75,89%	224 686 882
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 042 579 124		2 155 808 604	1 934 092 008	105,54%	94,69%	108 487 116
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 131 724 683	76 366 735	2 794 669 426	1 694 042 617	131,10%	79,47%	437 682 066
Ministerstvo dopravy SR (OP II)	3 105 676 947	574 818 551	3 749 752 330	2 495 750 886	120,74%	80,36%	609 926 061
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 160 489 587		2 235 176 721	1 910 086 890	103,46%	88,41%	250 402 697
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 326 717 081	422 385 361	1 567 001 925	1 046 954 902	118,11%	78,91%	279 762 179
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (OP RH)	6 932 902		2 325 340	1 720 266	33,54%	24,81%	5 212 636
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	340 477 489		314 385 389	238 452 746	92,34%	70,03%	102 024 743
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	89 938 286		108 168 636	39 154 891	120,27%	43,54%	50 783 395


Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Tabuľka č. 5: Prehľad čerpania jednotlivých rezortov k 31.08.2023 (bez prioritných osí TP a alokácie na SAFE) – zoradené podľa % čerpania

Rezort	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj) (bez SAFE)	Alokácia SAFE	Čerpanie k 31.08.2023	% čerpania alokácie (bez SAFE)	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (bez SAFE)
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 042 579 124		1 934 092 008	94,69%	108 487 116
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 160 489 587		1 910 086 890	88,41%	250 402 697
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	834 458 095		671 789 795	80,51%	162 668 300
Ministerstvo dopravy SR (OP II)	3 105 676 947	574 818 551	2 495 750 886	80,36%	609 926 061
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 131 724 683	76 366 735	1 694 042 617	79,47%	437 682 066
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 326 717 081	422 385 361	1 046 954 902	78,91%	279 762 179
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	931 935 962		707 249 080	75,89%	224 686 882
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	340 477 489		238 452 746	70,03%	102 024 743
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	89 938 286		39 154 891	43,54%	50 783 395
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (OP RH)	6 932 902		1 720 266	24,81%	5 212 636

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

Graf č. 4: Zostáva vyčerpať podľa rezortov k 31.08.2023 – zoradené podľa objemu zdrojov, ktoré zostáva vyčerpať (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE)

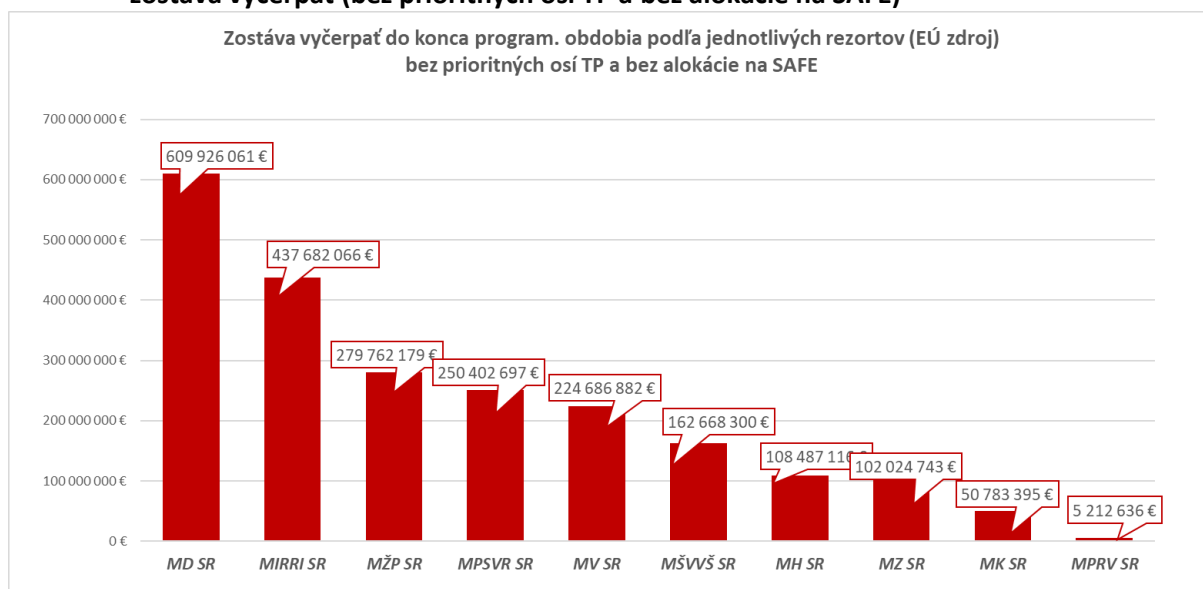

Do konca programového obdobia zostáva rezortom vyčerpať ešte **2,31 mld. EUR** (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE).

Najviac zostáva vyčerpať (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE) za rezorty:

- **MD SR (609,93 mil. EUR)**, čo predstavuje 19,64 % alokácie,
- **MIRRI SR (437,68 mil. EUR)**, čo predstavuje 20,53 % alokácie,
- **MŽP SR (279,76 mil. EUR)**, čo predstavuje 21,09 % alokácie.

2. Stav implementácie FAST-CARE a SAFE a pokrok od 15.05.2023

2.1 Implementácia FAST-CARE

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. SR plánuje využiť disponibilné zdroje EŠIF v objeme **315,26 mil. EUR** v rámci **3 operačných programov**:

Integrovaný regionálny operačný program (alokácia 244,01 mil. EUR)

- ✓ financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov
- ✓ refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s pomocou utečencom
- ✓ **revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou**

OP Ľudské zdroje (alokácia 41,25 mil. EUR)

- ✓ podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce a poskytovanie sociálnych služieb
- ✓ **revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou**

OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR)

- ✓ podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pomoci pri zmierňovaní dopadov migračnej krízy
- ✓ poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok pre žiakov na nákup IT techniky
- ✓ **revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou**

Z dostupnej alokácie 315,26 mil. EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 330,79 mil. EUR (104,93 %), zazmluvnených 307,11 mil. EUR (97,42 %) a vyplatených 220,30 EUR (69,88 %). Od 15.05.2023 sa alokácia vo výzvach a vyzvaniach zvýšila o 16,45 mil. EUR, kontrahovanie sa zvýšilo o 292,94 mil. EUR a čerpanie o 220,30 mil. EUR.

➤ Implementované v rámci OP Ľudské zdroje

1. **NP „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“ (ÚPSVR)** s alokáciou **3,44 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 02.02.2023**, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **18.04.2023**. Zazmluvnená suma predstavuje **3,44 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo už vyplatených **1,52 mil. EUR**.
2. **NP „Pomáhame odídencom – poradenstvo“ (ÚPSVR)** zameraný na začlenenie a integráciu na trh práce prostredníctvom poskytovania poradenských služieb s alokáciou **5,67 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 02.02.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **15.04.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **6,87 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo už vyplatených **3,74 mil. EUR**.
3. **NP „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“ (MPSVR SR)** zameraný na aktívne začlenenie odídencom z Ukrajiny do slovenskej spoločnosti s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie ich zamestnateľnosti s alokáciou **849 000 EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 08.02.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **13.06.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **769 926 EUR** za EÚ zdroj.
4. **NP „Pomáhame odídencom“ (ÚPSVR)** zameraný na poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávanie, podporu mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie odídencom z Ukrajiny

s alokáciou po navýšení **8,28 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 08.02.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 15.04.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **8,28 mil. EUR** za EÚ zdroj.

5. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava) zameraný na poradenstvo zo strany mimovládnych organizácií, týkajúce sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti a zabezpečovanie rôznych aktivít a programov s alokáciou **13 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 27.03.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 06.06.2023**. Zazmluvnená suma predstavuje **13 mil. EUR** za EÚ zdroj.
6. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“ (MPSVR SR) - zameraný na poskytovanie finančných prostriedkov pre samosprávy na zrealizované humanitárne a integračné aktivity v prospech odídencom z Ukrajiny s alokáciou **12,69 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 27.03.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 15.06.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **12,69 mil. EUR** za EÚ zdroj.
7. NP „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa“ – s alokáciou **3,11 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 28.7.2023**, ŽoNFP bola doručená 10.08.2023 a aktuálne je v procese hodnotenia.
8. NP „Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným zdravotným postihnutím v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine“ s indikatívnou alokáciou **10,12 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 09.08.2023**, ŽoNFP bola doručená 11.08.2023 a aktuálne je v procese hodnotenia.

➤ Implementované v rámci **Integrovaného regionálneho OP**

1. Výzva „Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine“ určená **pre 1 463 miest a obcí** a zameraná na refundáciu zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s indikatívnou alokáciou **126,92 mil. EUR** bola **vyhlásená 14.03.2023**. Na túto výzvu bolo prijatých **1 438 ŽoNFP** v sume NFP **126,34 mil. EUR**. Uzavretých je **871 zmlúv** o poskytnutí NFP v objeme **115,35 mil. EUR**. Z tejto sumy bolo už vyplatených **79,98 mil. EUR**.
2. NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ (MIRRI SR) zameraný na zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky s indikatívnou alokáciou **117,10 mil. EUR** - vyzvanie bolo **vyhlásené 27.04.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 14.06.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **117,10 mil. EUR**. Z tejto sumy bolo už vyplatených **115,53 mil. EUR**.

➤ Implementované v rámci **OP Integrovaná infraštruktúra**

1. NP „Digitálny príspevok pre žiakov UA“ (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR) zameraný na zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov utekajúcich z Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia s indikatívnou alokáciou **8,61 mil. EUR**. Vyzvanie na NP bolo **vyhlásené 27.04.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 24.06.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **8,61 mil. EUR** za EÚ zdroj.
3. NP „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ (MV SR) zameraný na podporu odborných kapacít poskytujúcich odborné služby osobám utekajúcim z Ukrajiny s indikatívnou alokáciou **21,00 mil. EUR** - vyzvanie bolo **vyhlásené 27.04.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 06.06.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **21 mil. EUR**. Z tejto sumy bolo už vyplatených **19,53 mil. EUR**.

Tabuľka č. 6 Prehľad implementácie FAST-CARE k 31.08.2023

Operačný program	Rezort	Fond	Alokácia FAST-CARE	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	ESF	11 245 000	4	27 186 242	241,76%	2	15 153 001	134,75%	3 741 519	33,27%
		EFRR	30 000 000	4	29 983 763	99,95%	4	29 904 684	99,68%	1 523 267	5,08%
			41 245 000	8	57 170 005	138,61%	6	45 057 685	109,24%	5 264 787	12,76%
OP Integrovaná infraštruktúra	MIRRI SR	EFRR	30 000 000	2	29 610 000	98,70%	2	29 610 000	98,70%	19 527 778	65,09%
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	EFRR	244 014 456	2	244 014 456	100,00%	872	232 447 056	95,26%	195 507 000	80,12%
Celkom			315 259 456	12	330 794 461	104,93%	880	307 114 741	97,42%	220 299 565	69,88%
z toho EFRR			304 014 456	8	303 608 219	99,87%	878	291 961 740	96,04%	216 558 046	71,23%
z toho ESF			11 245 000	4	27 186 242	241,76%	2	15 153 001	134,75%	3 741 519	33,27%

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

2.2 Implementácia SAFE

Na riešenie problémov spojených s extrémnym nárastom cien energií prijala EK **iniciatívu SAFE** (schválená Nariadením EP a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023). EK umožňuje poskytnúť **pomoc pri úhrade nákladov na spotrebu energie v prípade zraniteľných domácností** a využiť tak zostávajúce nevyčerpané zdroje EŠIF.

Na základe analýzy bola ako najvhodnejšie opatrenie pre podporu v rámci iniciatívy SAFE identifikovaná kompenzácia zvýšených nákladov na dodávky plynu, prípadne elektriny pre zraniteľné domácnosti. Zdroje SAFE budú použité na **preplatenie kompenzácií** rozdielu medzi trhovou cenou energie a limitom určeným vládou Slovenskej republiky, ktoré sú poskytované **dodávateľom energií** aktuálne zo štátneho rozpočtu.

Keďže legislatíva SR stanovuje len definíciu zraniteľného odberateľa bol v podmienkach Slovenska pripravený návrh **definície zraniteľnej domácnosti**. Návrh bol spracovaný na podklade štatistického zisťovania Rodinné účty, ktoré realizuje ŠÚ SR v súlade s metodológiou a odporúčaniami Eurostatu.

Za zraniteľnú je považovaná domácnosť, ktorej ekvivalentný čistý príjem

- nepresahuje hranicu 80. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských domácností, alebo
- nepresahuje hranicu 85. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských domácností a aspoň jeden člen domácnosti patrí do niektorej z nasledujúcich kategórií zraniteľných skupín:
 1. nezaopatrené dieťa,
 2. osoba neschopná pracovať z dôvodu dlhodobých zdravotných ťažkostí,
 3. starobný dôchodca,
 4. osoba vo veku 65 rokov alebo vyššom.

Na základe zisťovania Rodinné účty dosiahol 80. percentil rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských domácností v roku 2020 hodnotu 1 061 EUR a 85. percentil hodnotu 1 142 EUR.

Definícia zraniteľnej domácnosti, ktorá bude aplikovaná v rámci iniciatívy SAFE, bola **prekonzultovaná s Európskou komisiou a schválená uznesením vlády SR č. 217/2023** z 12. mája 2023.

V zmysle uvedenej definície dosahuje **podiel zraniteľných domácností** na výdavkoch všetkých slovenských domácností **79,2 % v prípade výdavkov na plyn a 79,5 % v prípade výdavkov na elektrinu**. Tieto hodnoty zodpovedajú údajom zo zisťovania Rodinné účty za r. 2020, po aktualizácii

na základe údajov za r. 2022 budú použité na identifikovanie podielu kompenzácií oprávnených na financovanie prostredníctvom Iniciatívy SAFE.

Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými cenami a regulovanými cenami pri dodávkach plynu zraniteľným domácnostiam prostredníctvom Iniciatívy SAFE bola vypracovaná v spolupráci MIRRI SR, MF SR, MPSVR SR a MH SR a po konzultácii s Orgánom auditu 05.05.2023 bola oficiálne predložená EK. **EK zaslala 24.05.2023 MIRRI SR stanovisko, že súhlasí s predloženou metodikou.**

Opatrenia SAFE budú realizované prostredníctvom **národných projektov (NP)** prijímateľa – MH SR, ktorý bude jediným prijímateľom pre všetky OP. Kompenzácie budú vyplatené v 2. fázach. **Prvá platba sa uskutoční v priebehu r. 2023** (v prípade OP KŽP na začiatku r. 2024) na základe predbežnej spotreby zaslanej od dodávateľov energií. **Druhá (zúčtovacia) platba sa uskutoční v r. 2024** na základe skutočnej spotreby energií podľa vykonaných mimoriadnych odpočtov prevádzkovateľov distribučných sústav (pre plyn aj elektrinu), určenej pre každé odberné miesto.

Alokácie na energokrízu sú v zmysle úlohy C.5 uznesenia vlády SR č. 806/2022 aktualizované v 3-mesačnom intervale. K poslednému termínu aktualizácie (21.07.2023) bola zo strany dotknutých RO (RO OP II, RO OP KŽP a RO IROP) identifikovaná alokácia 1,073 mld. EUR. Legislatíva EK umožňuje presunúť nevyčerpané zdroje až do výšky 1,45 mld. EUR, čo v prípade potreby vytvára priestor presunúť ešte dodatočných 377 mil. EUR.

Po zohľadnení presunov finančných prostriedkov na energokrízu (1,073 mld. EUR) predstavuje suma, ktorú je potrebné vyčerpať **2,35 mld. EUR** (t. j. 16,2 % z alokácie EŠIF). Objem fin. prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať po zohľadnení presunu časti finančných prostriedkov na energokrízu za jednotlivé OP je nasledovný:

Tabuľka č. 7: Prehľad realokácií na energokrízu a zostatku čerpania podľa jednotlivých OP

Operačný program	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (alokácia - čerpanie)	Plánovaná realokácia na energokrízu	Zostáva vyčerpať po realokácii na energokrízu
OP Integrovaná infraštruktúra	1 511 995 161	574 818 551	937 176 610
OP Kvalita životného prostredia	880 692 871	422 385 361	458 307 510
Integrovaný regionálny OP	430 138 689	76 366 735	353 771 954
OP Ľudské zdroje	403 684 808	-	403 684 808
OP Efektívna verejná správa	53 496 168		53 496 168
PS Interreg V-A SK-AT	18 898 115		18 898 115
PS Interreg V-A SK-CZ	16 440 350		16 440 350
OP Technická pomoc	4 073 331		4 073 331
OP Rybné hospodárstvo	5 212 647		5 212 647
Program spolupráce INTERACT III	277 213		277 213
EŠIF bez PRV:	3 324 909 352	1 073 570 647	2 251 338 705

Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR), RO

Tabuľka č. 8: Prehľad realokácií na energokrízu podľa rezortov

Rezort	Plánovaná realokácia na energokrízu
MŽP SR	422 385 361
MIRRI SR	276 366 735
MD SR	150 000 000
MH SR	150 000 000
MŠVVaŠ SR	74 818 551
MPSVR SR	0
MV SR	0
MZ SR	0
MK SR	0
Rezorty spolu	1 073 570 647

Zdroj: RO

Pod koordináciou MIRRI SR sa v rámci pracovnej skupiny SAFE uskutočnila príprava revízií 3 OP, z ktorých sú vyčleňované zdroje na SAFE. 30.03.2023 bola monitorovacím výborom schválená revízia OP KŽP. Proces SEA je vo finálnej fáze, doručenie odborného posudku k vypracovanej správe o hodnotení sa očakáva do 18.09.2023. Po ukončení procesu SEA bude OP KŽP predložený na schválenie EK najneskôr **do 30.09.2023**, čo je v súlade s termínmi určenými v zmysle legislatívy EÚ. Dňa 30.06.2023 boli oficiálne prostredníctvom SFC systému odoslané EK revízie OP II a IROP (schválené MV 29.05.2023 a 30.06.2023) **s vytvorenými prioritnými osami pre implementáciu iniciatívy SAFE a vyčlenenými alokáciami v prospech iniciatívy SAFE vo výške 574 818 551 EUR z OP II a 76 366 735 EUR z IROP. Revízia OP II bola schválená EK 16.08.2023.** Revízia IROP je vo finálnej fáze schvaľovacieho procesu, predpoklad vydania rozhodnutia EK je v polovici septembra.

Dňa **07.09.2023 sa uskutočnilo v poradí už 16. zasadnutie Pracovnej skupiny SAFE (PS SAFE)**, ktorá bola vytvorená za účelom koordinácie implementácie SAFE v SR. PS SAFE je koordinovaná MIRRI SR, pričom sú v nej zastúpené RO/SO vyčleňujúce zdroje na SAFE, ako aj zástupcovia MF SR, SZEÚ a ÚRSO. PS SAFE koordinovala proces vypracovania **zámerov NP a vzorového modelu hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie projektov SAFE.**

V priebehu júla a augusta sa uskutočnil proces pripomienkovania a následne schvaľovania zámerov NP, aktualizácie zoznamu NP a hodnotiacich a výberových kritérií NP SAFE v rámci relevantných monitorovacích výborov 3 dotknutých OP. Žiadosť o NFP v prípade NP financovaného zo zdrojov OP II (s alokáciou 574,8 mil. EUR) bola predložená 23.08.2023, predpoklad zazmluvnenia je do konca septembra a predloženie prvej žiadosti o platbu možno očakávať začiatkom októbra.

Metodika SAFE bola rozšírená o možnosť kompenzácie výdavkov na elektrinu pre prípad, ak by zdroje vyčlenené na SAFE prevyšovali objem potrebný na kompenzáciu výdavkov na plyn a následne prekonzultovaná s orgánom auditu. Metodika bude formálne vydaná po aktualizácii štatistických údajov zo zisťovania Rodinné účty za r. 2022 (predpoklad koncom septembra). Za účelom efektívnej implementácie iniciatívy SAFE boli pre každý dotknutý OP vypracované podrobné harmonogramy implementácie SAFE, od vyhlásenia vyzvaní národných projektov cez ich schválenie, zazmluvnenie, až po predloženie žiadosti o platbu, ktoré sú pravidelne monitorované v rámci zasadnutí PS SAFE.

3. Fázované a nefunkčné projekty

V čase predloženia dokumentov o ukončení operačných programov Európskej komisii by mali byť všetky projekty fyzicky dokončené alebo plne vykonané, mali by prispievať k cieľom príslušných priorít a všetky súvisiace platby by mali byť uhradené prijímateľom a prijímateľmi. Vzhľadom na to, že niekedy je ťažké zosúladiť realizáciu projektov s programovým obdobím, a v snahe zabezpečiť, aby sa projekty dokončili a prispeli k cieľom operačných programov, umožnila Európska komisia nasledovné flexibility pre projekty pri ukončovaní operačných programov.

3.1 Fázované projekty

V súlade s článkami 118 a 118a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 o spoločných ustanoveniach¹, umožnila Európska komisia **rozdelenie projektu do dvoch samostatných fáz**, z ktorých prvá fáza sa preplatí z alokácie pre programové obdobie 2014 – 2020 a druhá fáza z alokácie pre programové obdobie 2021 – 2027. Fázovanie je umožnené za predpokladu splnenia špecifických podmienok daných predmetnou legislatívou Európskej komisie, ako sú napr. limit celkových nákladov na projekt a oprávnenosť aktivít projektu v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

V nadväznosti na úlohu B.7 z uznesenia vlády SR č. 371/2023 riadiace a sprostredkovateľské orgány aktualizovali a predložili indikatívne prehľady fázovaných projektov z programového obdobia 2014 – 2020 do programového obdobia 2021 – 2027 so stavom k 28. augustu 2023.

Podľa sumarizácie zaslaných údajov za EŠIF, ktoré sú uvedené **v tabuľke č. 9**, možnosť fázovania bude využitá v rámci **40 projektov, v zazmluvnenej výške 936,17 mil. EUR (EÚ zdroje)**, z toho:

- **za IROP** 4 projekty,
- **OP KŽP** 18 projektov,
- **OP II** 18 projektov.

Plánovaný **objem zdrojov EÚ pre 2. fázy** týchto projektov, ktorý bude financovaný z Programu Slovensko predstavuje **555 mil. EUR**. Vzhľadom na koniec oprávnenosti výdavkov 31.12.2023 sú sumy a počty fázovaných projektov stále indikatívne.

Zoznam fázovaných projektov obsahuje príloha č. 1.

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159), zmenené nariadením (EÚ) 2022/2039 o FAST – CARE (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“).

Tabuľka č. 9: Sumár fázovaných projektov z PO 14-20 do PO 21-27 - stav k 28.08.2023

OP/rezort	Počet	Zazmluvnený objem z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Celkové čerpanie z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Plánované nedočerpanie z PO 14-20 (EÚ zdroj) (= zazmluvnený objem - celkové čerpanie)	Plánovaný objem pre 2. fázu projektu z P SK (EÚ zdroj)	Plánované čerpanie SURPLUS (dodatočný príspevok na projekt)
Integrovaný regionálny OP	4	28 741 316	11 294 215	17 447 101	6 641 382	0
MIRRI SR	3	16 492 598	9 851 215	6 641 382	6 641 382	0
MK SR	1	12 248 718	1 442 999	10 805 719	-	0
MZ SR	0	0	0	0	0	0
OP Integrovaná infraštruktúra	18	691 170 322	315 825 628	375 344 694	444 832 683	0
MD SR	12	607 042 124	276 637 304	330 404 820	393 732 683	0
MIRRI SR	0	0	0	0	0	0
MH SR	4	57 833 786	33 000 000	24 833 786	51 100 000	0
MŠVVŠ SR	2	26 294 411	6 188 324	20 106 088	-	0
OP Kvalita životného prostredia	18	216 260 959	63 110 873	103 981 983	103 981 983	4 047 467
MŽP SR	18	216 260 959	63 110 873	103 981 983	103 981 983	4 047 467
MV SR						
SIEA						
OP Ľudské zdroje	0	0	0	0	0	0
MPSVR SR	0	0	0	0	0	0
MŠVVŠ SR	0	0	0	0	0	0
MV SR	0	0	0	0	0	0
OP Efektívna verejná správa	0	0	0	0	0	0
Interreg V-A SK-CZ	0	0	0	0	0	0
Interreg V-A SK-AT	0	0	0	0	0	0
OP Technická pomoc	0	0	0	0	0	0
OP Rybné hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
SPOLU	40	936 172 597	390 230 716	496 773 779	555 456 049	4 047 467

Pozn:

MIRRI SR - v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty verzia 1.1, termín zaslania žiadostí o fázovanie je 31.8.2023. Z toho dôvodu sa bude daný zoznam ešte dopĺňať/meniť.

MK SR - aktuálne eviduje emailovú informáciu so žiadosťou o fázovanie z mesta Nitra, do času spracovania tabuľky nie sú k dispozícii kompletne dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predložiť do 31.08.2023 v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty IROP 2014-2020 a PSK. Vzhľadom na to sú v tabuľke vyplnené len dostupné údaje.

MŽP SR - v súčasnosti nie je možné vyčíslieť objem prvej a druhej fázy pri 6 projektoch vzhľadom na neukončený proces VO - prijímatelia majú termín do 30.09.2023 na požiadanie o fázovanie.

3.2 Nefunkčné projekty

Nefunkčné (alebo nefungujúce) projekty sú projekty, ktoré nie sú finančne alebo vecne zrealizované (nie sú ukončené a uvedené do prevádzky) ku koncu oprávnenosti programového obdobia. Ak prijímatelia neuhradia všetky oprávnené výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 31.12.2023, môžu po dohode s RO dofinancovať a sfunkčniť projekt z vlastných zdrojov za podmienok a do termínov stanovených príslušnými usmerneniami², alebo musia vrátiť už poskytnuté finančné prostriedky.

² Oznámenie Komisie - Usmernenia k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predstupovej pomoci (IPA II) (2014 - 2020)_ zo 14.12.2022; Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020 (Ministerstvo financií SR)

V nadväznosti na úlohu B.8 z uznesenia vlády SR č. 371/2023 riadiace a sprostredkovateľské orgány analyzovali, vypracovali a predložili indikatívne prehľady nefunkčných projektov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 so stavom k 28. augustu 2023.

Podľa sumarizácie zaslaných údajov za EŠIF uvedených v **tabuľke č. 10**, do zoznamu nefunkčných projektov bude zaradených **95 projektov, v zazmluvnenej výške 564,58 mil. EUR (EÚ zdroje)**, z toho:

- za IROP 3 projekty,
- OP II 36 projektov,
- OP KŽP 1 projekt,
- OP ĽZ 55 projektov.

Odhadované nedočerpanie EÚ zdrojov z PO 14 – 20 predstavuje **133,40 mil. EUR** a pre sfunkčnenie projektov je potrebných **130,80 mil. EUR z vlastných zdrojov prijímateľov alebo iných zdrojov bez dodatočného dopadu na štátny rozpočet**.

Vzhľadom na koniec oprávnenosti výdavkov 31.12.2023 sú sumy a počty nefunkčných projektov stále indikatívne.

Zoznam nefunkčných projektov obsahuje príloha č. 2.

Tabuľka č. 10: Sumár nefunkčných projektov z PO 14-20 - stav k 28.08.2023

OP/rezort	Počet	Zazmluvnený objem z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Celkové čerpanie z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Plánované nedočerpanie z PO 14-20 (EÚ zdroj) (= zazmluvnený objem - celkové čerpanie)	Výška sumy potrebnej pre sfunkčnenie projektu (vlastné zdroje prijímateľa/iné zdroje)**
Integrovaný regionálny OP	3	16 057 648	13 459 822	2 597 826	-
MIRRI SR	3	16 057 648	13 459 822	2 597 826	-
MK SR	0	0	0	0	0
MZ SR	0	0	0	0	0
OP Integrovaná infraštruktúra	36	512 028 513	385 450 588	126 577 926	126 577 926
MD SR	12	453 640 879	338 330 292	115 310 587	115 310 587
MIRRI SR	19	34 985 619	32 416 577	2 569 042	2 569 042
MH SR	0	0	0	0	0
MŠVVŠ SR	5	23 402 016	14 703 719	8 698 297	8 698 297
OP Kvalita životného prostredia	1	10 086 393	10 086 393	0	0
MŽP SR	1	10 086 393	10 086 393	0	0
MV SR	0	0	0	0	0
SIEA	0	0	0	0	0
OP Ľudské zdroje	55	26 408 193	22 187 531	4 220 661	4 220 661
MPSVR SR	0	0	0	0	0
MŠVVŠ SR	0	0	0	0	0
MV SR	55	26 408 193	22 187 531	4 220 661	4 220 661
OP Efektívna verejná správa	0	0	0	0	0
Interreg V-A SK-CZ	0	0	0	0	0
Interreg V-A SK-AT	0	0	0	0	0
OP Technická pomoc	0	0	0	0	0
OP Rybné hospodárstvo	0	0	0	0	0
SPOLU	95	564 580 747	431 184 335	133 396 412	130 798 587

** bez dodatočného dopadu na štátny rozpočet

Pozn:

MIRRI SR - v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty verzia 1.1, termín zaslania žiadosti o nefunkčný projekt je do 30.9.2023. Z toho dôvodu sa bude daný zoznam ešte dopĺňať/meniť.

4. Správa k zvýšeniu kvality a návratnosti projektov v PO 7 - Informačná spoločnosť v rámci OP II

Jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády je Zvýšenie kvality projektov financovaných z programového obdobia 2014 - 2020 a zlepšenie prípravy nových projektov v informatizácii. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) v spolupráci s Útvorom hodnoty za peniaze (ÚHP) vypracovalo hodnotenie týchto projektov a pripravilo predkladanú správu o stave, rizikách a odporúčaníach pre úspešné dodanie požadovaných výstupov do konca roka 2023.

Hodnotených bolo 27 projektov (príloha č. 3), v alokácii 152 mil. eur, ktoré boli vybrané na základe dopadu na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov so štátom a digitálnu transformáciu organizácii verejnej správy. Všetky hodnotené projekty sú financované zo zdrojov EÚ, konkrétne z prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra. Podľa pravidiel čerpania eurofondov musia byť projekty ukončené do 31.12.2023. Riziká, ktoré môžu mať dopad na výšku čerpania týchto projektov, sú uvedené v prílohe č.3.

V termíne **18.7.2023 – 31.8.2023** bola realizovaná analýza týchto projektov, keďže kvalita ich realizácie bude mať vplyv na pozíciu Slovenska v **DESI indexe** (kategória e-Government). Viaceré projekty ešte nezačali s testovaním grafických rozhraní, čo obmedzí čas na zapracovanie zistených nedostatkov a môže mať negatívny vplyv na používateľskú skúsenosť užívateľov. Na základe analýzy boli identifikované zákonné povinnosti a úpravy služieb, ktoré je potrebné zohľadniť, resp. dopracovať pre úspešné ukončenie týchto projektov. Zoznam zákonných povinností a úprav služieb je uvedený vo forme odporúčaní pre zlepšenie pozície Slovenska v **DESI indexe** v prílohe č. 4, vrátane projektov, ktorých sa tieto odporúčania týkajú.

Okrem zlepšenia pozície Slovenska v DESI indexe boli analyzované aj projekty s najväčšími úsporami, ktoré majú doručiť ekonomické prínosy, napr., ušetriť čas úradníkov v ekvivalente 2434 plných úväzkov³. Tieto projekty boli schvaľované ako spoločensky návratné, väčšinu úspor hodnotených projektov predstavovala úspora času úradníkov. Deklarované úspory je potrebné monitorovať a vyhodnocovať pri ukončení a po ukončení implementácie projektov. Verejné vyhodnocovanie deklarovaných prínosov bude prebiehať formou cieľov a merateľných ukazovateľov prvkov v rámci programového rozpočtovania verejnej správy.

3

Ministerstvo financií SR – Centrálny ekonomický systém: úspora **1032 FTE**

Zbor väzenskej a justičnej stráže - Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky ZVJS: úspora **512 FTE**

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva: úspora **386 FTE**

Pamiatkový úrad SR - Pamiatkový informačný systém: úspora **357 FTE**

Úrad verejného zdravotníctva SR - Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva: úspora **147 FTE**

Zdroj: MIRRI SR na základe osobných stretnutí a zverejnených štúdií

Príloha č. 1: Zoznam fázovaných projektov z PO 14-20 do PO 21-27 (stav k 28.08.2023)

OP	RO/SO	Kód projektu z ITMS	Prijímateľ	Právna forma	IČO prijímateľa	Názov projektu	Zameranie projektu – NP/DoP/VP	Zazmluvnený objem z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Celkové čerpanie * z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Plánované nedočerpanie z PO 14-20 (EÚ zdroj) (= zazmluvnený objem - celkové čerpanie)	Plánovaný objem pre 2. fázu projektu z P SK (EÚ zdroj)	Plánované čerpanie SURPLUS (dodatočný príspevok na projekt)
IROP	MIRRI SR	302011BBT3	Košický samosprávny kraj	samosprávny kraj	35541016	ID R005 II/533 Gemerská Poloma – SNV- Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov)	DoP	4 238 460	2 586 285	1 652 175	1 652 175	0
IROP	MIRRI SR	302011BCI2	Banskobystrický samosprávny kraj	samosprávny kraj	37828100	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa	DoP	5 360 930	5 139 931	221 000	221 000	-
IROP	MIRRI SR	302021BDL4	Stredná odborná škola elektrotechnická	príspevková organizácia	893102	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce	DoP	6 893 208	2 125 000	4 768 208	4 768 208	0
IROP	MK SR	302031ADT3	Mesto Nitra	obec	165182	Kreatívne centrum Nitra	DoP	12 248 718	1 442 999	10 805 719	-	-
OP II	MD SR	311011BID1	ŽSR	iná právnická osoba	31364501	ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR	NP	29 630 581	6 049 697	23 580 884	27 118 016	0
OP II	MD SR	311011BCP3	ŽSR	iná právnická osoba	31364501	ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplica a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1. fáza)	VP	190 151 065	116 823 991	73 327 074	132 363 636	0
OP II	MD SR	311031CB82	ŽSR	iná právnická osoba	31364501	Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave - Bratislava – Vrakuňa, DSPRS, realizácia	NP	3 665 085	1 299 085	2 366 000	2 366 000	0
OP II	MD SR	311031CHH3	Mesto Bratislava	obec, mesto	00603481	Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosáková ulica - Janíkov dvor	VP	73 144 756	15 053 469	58 091 287	78 091 287	0
OP II	MD SR	311031BDZ1	DPB	akciová spoločnosť	00492736	Elektrický pre Bratislavu (10 ks obojsmerných električiek)	NP	22 958 760	11 351 180	11 607 580	11 607 580	0
OP II	MD SR	311031CBM4	ŽSR	iná právnická osoba	31364501	Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, Lamačská brána, DSPRS - realizácia	NP	7 324 230	0	7 324 230	7 324 230	0
OP II	MD SR	311031BAW3	DPMK	akciová spoločnosť	31701914	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa	NP	19 949 641	10 401 974	9 547 667	10 000 000	0
OP II	MD SR	311031BCD1	DPMP	akciová spoločnosť	31718922	DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov	NP	5 836 141	1 580 055	4 256 086	3 550 582	0
OP II	MD SR	311051BBC7	ŽSR	iná právnická osoba	31364501	Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia	NP	55 503 248	41 380 000	14 123 248	16 241 735	0
OP II	MD SR	311061BCX1	NDS	akciová spoločnosť	35919001	R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. Úsek	VP	140 465 913	40 745 818	99 720 095	71 539 494	0
OP II	MD SR	311061ANP1	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE krají – 1. etapa, I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany	NP	38 866 517	25 979 535	12 886 982	18 187 241	0
OP II	MD SR	311061BFL5	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE krají – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica I. úsek Vernár	NP	19 546 188	5 972 500	13 573 688	15 342 882	0
OP II	MH SR	313021BLP2	InoBat Energy j.s.a.	Jednoduchá spoločnosť na akcie	52722449	IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021	DOP	8 494 908	4 000 000	4 494 908	12 800 000	0
OP II	MH SR	313021BNG4	ENERGO - AQUA a.s.	Akciová spoločnosť	36220005	Úložiská energie z batérií druhej životnosti	DOP	15 207 068	7 000 000	8 207 068	11 600 000	0
OP II	MH SR	313021BUN5	ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.	Akciová spoločnosť	36299782	Regenerácia použitých batérií z elektromobilov	DOP	14 940 043	8 000 000	6 940 043	8 400 000	0
OP II	MH SR	313021CAP4	InoBat Auto j.s.a.	Jednoduchá spoločnosť na akcie	52648192	Vybudovanie pilotnej výrobnéj linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom	DOP	19 191 768	14 000 000	5 191 768	18 300 000	0
OP II	MŠVŠ SR	313011AFG4	Žilinská univerzita v Žiline	univerzita	00397563	Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry	DoP	10 369 761	2 465 174	7 904 588	Projekty budú fázované MZ SR	0
OP II	MŠVŠ SR	313011AFG5	Univerzita Komenského v Bratislave	univerzita	00397865	Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia	DoP	15 924 650	3 723 150	12 201 500	Projekty budú fázované MZ SR	0
OP KŽP	MŽP SR	310021N020	Obec Radôska	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	00314226	Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 2,450 - 2,957 v k.ú. Radôska	DoP	1 407 984	212 500	1 195 484	1 195 484	0
OP KŽP	MŽP SR	310021Q513	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Štátny podnik	36022047	Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - III. etapa	DoP	28 731 721	4 797 621	23 934 100	23 934 100	0
OP KŽP	MŽP SR	310011A093	Obec Pata	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	00306126	Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie	DoP	4 078 125	1 388 125	2 690 001	2 690 001	0
OP KŽP	MŽP SR	310011BNU6	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Akciová spoločnosť	36550949	NESVADY - rozšírenie kanalizácie a ČOV	DoP	14 815 987	6 991 539	7 824 448	7 824 448	0
OP KŽP	MŽP SR	310011BPL9	Obec Pribeta	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	00306649	Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta	DoP	16 842 394	6 745 685	10 096 709	10 096 709	0
OP KŽP	MŽP SR	310011BWX2	ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE	Záujmové združenie právnických osôb	36067725	Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary - II.	DoP	12 839 582	8 839 582	4 000 000	4 000 000	0
OP KŽP	MŽP SR	310011BXF4	Združenie obcí Veselé ČOV	Záujmové združenie právnických osôb	42298296	Borovce, Rakovce, Veselé , Dubovany - dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé - rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV	DoP	14 671 571	7 650 000	7 021 571	7 021 571	3 510 572
OP KŽP	MŽP SR	310011CML7	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Akciová spoločnosť	36550949	Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV	DoP	24 217 414	212 500	24 004 914	24 004 914	0
OP KŽP	MŽP SR	310011AJF9	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Akciová spoločnosť	36550949	Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd	DoP	18 649 165	12 615 412	6 033 752	6 033 752	0
OP KŽP	MŽP SR	310011AUP4	Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša	Záujmové združenie právnických osôb	52820254	Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD	DoP	18 693 367	11 216 020	7 477 347	7 477 347	0
OP KŽP	MŽP SR	310011CLD2	Obec Hrubý Šúr	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	00305987	Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr	DoP	9 533 658	212 500	9 321 158	9 321 158	0
OP KŽP	MŽP SR	310031N708	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	Príspevková organizácia	31753604	Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií	DoP	2 611 890	2 229 390	382 500	382 500	0
OP KŽP	MŽP SR	310011A147	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Akciová spoločnosť	36672076	Pruské - kanalizácia a ČOV	DoP	7 354 256	?	?	?	536 895
OP KŽP	MŽP SR	310011P406	Slovenský hydrometeorologický ústav	Príspevková organizácia	00156884	Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody	DoP	7 900 311	?	?	?	0
OP KŽP	MŽP SR	310011CBR3	Obec Vltaz	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	00327981	Kanalizácia a ČOV - Vltaz	DoP	7 270 055	?	?	?	0
OP KŽP	MŽP SR	310011BLQ3	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	Akciová spoločnosť	36570460	Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota Kanalizácia a ČOV	DoP	8 214 181	?	?	?	0
OP KŽP	MŽP SR	310011A125	Obec Bánov	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	00308765	Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa	DoP	8 191 340	?	?	?	0
OP KŽP	MŽP SR	310011BLM9	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	Akciová spoločnosť	36570460	Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV	DoP	10 237 959	?	?	?	0

*skutočné čerpanie k 28.08.2023 + plán čerpania do konca PO 14-20

Pozn.:

MIRRI SR - v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty verzia 1.1, termín zaslania žiadostí o fázovanie je 31.8.2023 a termín zaslania žiadostí o nefunkčný projekt do 30.9.2023. Z toho dôvodu sa bude daný zoznam ešte dopĺňať/meniť.

MK SR - aktuálne evidujeme emailovú informáciu z mesta Nitra, že podajú žiadosť o fázovanie projektu. Žiaľ do času spracovania tabuľky za MK SR nemáme k dispozícii kompletné dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predložiť do 31.08.2023 v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty IROP 2014-2020 a PSK. Vzhľadom na to, zasielame tabuľku neúplnú a iba s údajmi, ktoré sú nám dostupné.

MŽP SR - otázky znamenajú, že nie je možné v súčasnosti vyčíslieť objem vzhľadom na neukončený proces VO - prijímatelia majú termín do 30.09.2023 na požiadanie o fázovanie

Príloha č. 2: Zoznam tzv. nefunkčných projektov z PO 14-20 (stav k 28.08.2023)

OP	RO/SO	Kód projektu z ITMS	Prijímateľ	Právna forma	IČO prijímateľa	Názov projektu	Zameranie projektu – NP/DoP/VP	Zazmluvnený objem z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Celkové čerpanie * z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Plánované nedočerpanie z PO 14-20 (EÚ zdroj) (= zazmluvnený objem - celkové čerpanie)	Výška sumy potrebnej pre sfunkčnenie projektu (vlastné zdroje prijímateľa/iné zdroje)**
IROP	MIRRI SR	302011W727	Trenčiansky samosprávny kraj	samosprávny kraj	36126624	Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa	DoP	6 798 223	6 798 223	0	***AVIZOVANÝ nefunkčný projekt, prijímateľ pripravuje žiadosť o zmenu projektu k 30.9.2023.
IROP	MIRRI SR	302011ARD9	Prešovský samosprávny kraj	samosprávny kraj	37870475	Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537	DoP	5 517 065	3 310 239	2 206 826	AVIZOVANÝ nefunkčný projekt, prijímateľ pripravuje žiadosť o zmenu projektu k 30.9.2023.
IROP	MIRRI SR	302011BCH9	Banskobystrický samosprávny kraj	samosprávny kraj	37828100	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – I. etapa	DoP	3 742 360	3 351 360	391 000	AVIZOVANÝ nefunkčný projekt, prijímateľ pripravuje žiadosť o zmenu projektu k 30.9.2023.
OP II	MD SR	311021D234	NDS	akciová spoločnosť	35919001	D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza)	VP	273 301 668	232 444 446	40 857 222	40 857 222
OP II	MD SR	311021CPN5	NDS	akciová spoločnosť	35919001	D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto - Privádzač	NP	14 045 774	9 207 472	4 838 303	4 838 303
OP II	MD SR	311021BBY5	NDS	akciová spoločnosť	35919001	D3 Zelený most, Svrčinovec	NP	12 587 927	5 724 538	6 863 389	6 863 389
OP II	MD SR	311021BMZ1	NDS	akciová spoločnosť	35919001	Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce - štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce - Vysné Nemecké)	NP	637 500	199 473	438 027	438 027
OP II	MD SR	311061BJK6	NDS	akciová spoločnosť	35919001	R3 Tvrdošín – Nižná	NP	52 743 122	18 032 390	34 710 732	34 710 732
OP II	MD SR	311061AWD1	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota	NP	22 050 130	13 016 959	9 033 172	9 033 172
OP II	MD SR	311061AYM9	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji	NP	4 245 410	2 725 427	1 519 984	1 519 984
OP II	MD SR	311061BAB1	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa	NP	34 485 894	19 979 070	14 506 824	14 506 824
OP II	MD SR	311061AYL5	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa	NP	20 631 189	19 582 699	1 048 490	1 048 490
OP II	MD SR	311061BRC9	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji	NP	6 184 678	5 217 463	967 215	967 215
OP II	MD SR	311061BDS8	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III.etapa v TT, NR a KE kraji	NP	3 692 628	3 692 220	408	408
OP II	MD SR	311061BTH6	SSC	rozpočtová organizácia	00003328	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa	NP	9 034 959	8 508 136	526 823	526 823
OP II	MIRRI SR	311071S922	Čeladice	obec	00307831	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071AJX6	Zeleneč	obec	00313211	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071X976	Tuhár	obec	00316482	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071X785	Látky	obec	00316148	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071S959	Habovka	obec	00314471	Wifí pre Teba v obci Habovka	DoP	9 874	0	9 874	9 874
OP II	MIRRI SR	311071Z974	Dúbravy	obec	00319899	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071W924	Horné Lefantovce	obec	00399418	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071V143	Vyšný Žipov	obec	00332950	Wifí pre Teba v obci Vyšný Žipov	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071CKA4	Sobrance	obec	00325791	Wifí pre Teba II	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071V140	Plešivec	obec	00328642	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071CJW7	Liptovská Porúbka	obec	17061229	Wifí pre Teba II	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071Z746	Tekovské Lužany	obec	00307548	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071CJD2	Horná Mičiná	obec	00313459	Wifí pre Teba II	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071S913	Horné Háme	obec	00320641	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071S918	Tekovská Breznica	obec	00321036	Wifí pre Teba pre obec Tekovská Breznica	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071AJW4	Ardanovce	obec	00699110	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071CKF8	Veľké Kapušany	obec	00332038	Wifí pre Teba II	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071AKA4	Košecké Podhradie	obec	00317870	Wifí pre Teba	DoP	12 750	0	12 750	12 750
OP II	MIRRI SR	311071A172	Ministerstvo vnútra SR	321 - Rozpočtová organizácia	00151866	Cloud Ministerstva vnútra SR	NP	34 758 995	32 416 577	2 342 418	2 342 418
OP II	MŠVVŠ SR	313011AUB1	Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach	univerzita	00397768	Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov	DoP	5 364 936	4 742 963	621 973	621 973
OP II	MŠVVŠ SR	313011AUA4	Univerzita Komenského v Bratislave	univerzita	00397865	Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneho skríningu SARS-Cov-2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme	DoP	5 316 721	2 100 619	3 216 101	3 216 101
OP II	MŠVVŠ SR	313011AUA5	Univerzita Komenského v Bratislave	univerzita	00397865	Nové možnosti manažmentu závažných ochorení v liečebno-preventívnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť zdravotníckych profesionálov	DoP	5 233 919	3 743 731	1 490 188	1 490 188
OP II	MŠVVŠ SR	313011ASY8	Asseco Central Europe, a. s	a.s.	35760419	Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podporu boja proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní jej negatívnych následkov monitorovaním zdravotného stavu ľudí za účelom eliminácie rizika nákazy u rizikových skupín obyvateľstva.	DoP	5 703 709	3 452 467	2 251 242	2 251 242
OP II	MŠVVŠ SR	313011ASX4	Slovenská technická univerzita	univerzita	00397687	Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podporu monitorovania možného šírenia ochorenia COVID-19 s cieľom rozvoja analytických nástrojov slúžiacich na znižovanie rizika nákazy	DoP	1 782 732	663 939	1 118 793	1 118 793
OP LZ	MV SR	312061BWN1	Obec Oľšovany	obec	00324574	Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany.	DoP	551 351	17 891	533 460	533 460
OP LZ	MV SR	312061CGY1	Obec Jasov	obec	00324264	Sanácia nelegálnych skládok v obci Jasov	DoP	4 939 709	4 445 738	493 971	493 971
OP LZ	MV SR	312061BRL2	Obec Varhaňovce	obec	00327956	Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie	DoP	1 538 494	1 240 638	297 856	297 856
OP LZ	MV SR	312061BVU7	Mesto Sabinov	obec	00327735	Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov	DoP	608 730	392 857	215 873	215 873
OP LZ	MV SR	312061BRU6	Obec Lubeník	obec	00328472	Rekonštrukcia kanalizácie v prostredí MRK v obci Lubeník	DoP	381 449	190 724	190 724	190 724
OP LZ	MV SR	312061AKU8	Obec Červenica	obec	00326917	Novostavba MŠ v Červenci	DoP	718 792	535 028	183 764	183 764
OP LZ	MV SR	312061BLI5	Obec Chmeľov	obec	00327115	Budovanie inžinierskych sietí v obci Chmeľov	DoP	555 938	399 175	156 763	156 763
OP LZ	MV SR	312061BDP1	Obec Lenartov	obec	00322270	„Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov“	DoP	523 467	378 971	144 496	144 496
OP LZ	MV SR	312061BQM8	Obec Ľubotín	obec	00330035	Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník	DoP	465 040	336 126	128 915	128 915
OP LZ	MV SR	312061CAF1	Obec Jasov	obec	00324264	Novostavba materskej školy v obci Jasov	DoP	1 699 835	1 574 253	125 581	125 581
OP LZ	MV SR	312061AKU9	Obec Uzovské Pekľany	obec	00327930	Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany	DoP	411 409	289 689	121 720	121 720
OP LZ	MV SR	312061BAT9	Obec Jelka	obec	00306011	Prestupné bývanie - Obec Jelka	DoP	457 307	340 391	116 916	116 916
OP LZ	MV SR	312061CHN4	Obec Beňanovce	obec	00328952	Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Beňanovce	DoP	226 028	121 399	104 629	104 629
OP LZ	MV SR	312061W791	Rómske srdcia - Romane Jile	obec	36106488	Výstavba komunitného centra občianskeho združenia Rómske srdcia - Romane Jile	DoP	273 211	178 025	95 187	95 187
OP LZ	MV SR	312061BAR8	Obec Varadka	obec	00322695	Bytové domy Varadka - prestupné bývanie	DoP	1 022 825	929 563	93 262	93 262
OP LZ	MV SR	312061BYI7	Obec Ostrovany	obec	00690554	Materská škola v obci Ostrovany	DoP	1 071 000	978 775	92 225	92 225
OP LZ	MV SR	312061Y093	Obec Varhaňovce	obec	00327956	Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce	DoP	927 444	838 780	88 664	88 664
OP LZ	MV SR	312061BVQ4	Obec Nacina Ves	obec	00325511	Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci	DoP	297 584	215 642	81 942	81 942
OP LZ	MV SR	312061BRX8	Obec Sedliská	obec	00332836	Kanalizácia a ČOV Sedliská	DoP	354 177	288 178	65 999	65 999
OP LZ	MV SR	312061BAU3	Obec Spišský Hrhov	obec	00329592	VÝSTAVBA BYTOV DVOJSTUPNÉHO PRESTUPNÉHO BYVANIA V OBCI SPIŠSKÝ HRHOV.	DoP	366 405	301 897	64 508	64 508
OP LZ	MV SR	312061BVR3	Obec Sučany	obec	00316938	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany	DoP	213 261	149 282	63 978	63 978
OP LZ	MV SR	312061Y799	Mesto Veľký Meder	obec	00305332	MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder	DoP	344 598	275 679	68 920	68 920
OP LZ	MV SR	312061AIR4	Obec Drienov	obec	00326984	Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov	DoP	654 665	601 370	53 295	53 295
OP LZ	MV SR	312061BWT2	Obec Svinica	obec	00324761	Svinica - kanalizácia	DoP	534 946	481 996	52 950	52 950
OP LZ	MV SR	312061F075	Obec Košické Oľšany	obec	00324361	Komunitné centrum v obci Košické Oľšany	DoP	212 260	161 354	50 905	50 905
OP LZ	MV SR	312061Y829	Obec Vojka	obec	00332143	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka	DoP	253 673	207 110	46 563	46 563
OP LZ	MV SR	312061Y429	Mesto Stará Ľubovňa	obec	00330167	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa	DoP	493 160	446 860	46 300	46 300
OP LZ	MV SR	312061AQK5	Mesto Sládkovičovo	obec	00306177	Rozšírenie kapacity MŠ Fučkova výstavbou nového objektu.	DoP	523 619	477 974	45 645	45 645
OP LZ	MV SR	312061Z897	Obec Brezina	obec	00331384	Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci Brezina	DoP	201 953	156 620	45 333	45 333
OP LZ	MV SR	312061L683	Obec Nálepškovo	obec	00329398	Výbudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci Nálepškovo	DoP	360 435	319 255	41 179	41 179
OP LZ	MV SR	312061BVV1	Obec Bálka	obec	00318604	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – Bálka	DoP	206 849	166 576	40 273	40 273
OP LZ	MV SR	312061W948	Obec Pohorelá	obec	00313696	KOMUNITNÉ CENTRUM POHORELÁ	DoP	202 852	162 881	39 971	39 971
OP LZ	MV SR	312061Y037	Obec Smolnícka Huta	obec	00329584	Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Smolnícka Huta	DoP	137 020	98 046	38 975	38 975
OP LZ	MV SR	312061S827	Obec Fričovce	obec	00327026	Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom výstavby budovy Materskej školy v obci Fričovce	DoP	436 184	401 950	34 234	34 234
OP LZ	MV SR	312061Z817	Obec Cerovo	obec	00319775	Zlepšenie dostupnosti služieb obyvateľom separovaného rómskeho osídlenia v obci Cerovo	DoP	187 080	149 664	37 416	37 416

OP	RO/SO	Kód projektu z ITMS	Prijímateľ	Právna forma	IČO prijímateľa	Názov projektu	Zameranie projektu – NP/DoP/VP	Zazmluvnený objem z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Celkové čerpanie * z PO 14-20 (EÚ zdroj)	Plánované nedočerpanie z PO 14-20 (EÚ zdroj) (= zazmluvnený objem - celkové čerpanie)	Výška sumy potrebnej pre sfunkčnenie projektu (vlastné zdroje prijímateľa/iné zdroje)**
OP LZ	MV SR	312061BWC7	Obec Ražňany	obec	00327689	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany	DoP	267 199	241 834	25 364	25 364
OP LZ	MV SR	312061W942	Obec Jelka	obec	00306011	Komunitné centrum - obec Jelka	DoP	265 367	240 519	24 848	24 848
OP LZ	MV SR	312061Z280	Obec Teplička	obec	00329690	Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Teplička	DoP	200 848	177 811	23 036	23 036
OP LZ	MV SR	312061Q914	Obec Zvolenská Slatina	obec	00320447	Komunitné centrum Zvolenská Slatina	DoP	272 387	249 373	23 014	23 014
OP LZ	MV SR	312061BVF8	Obec Pašková	obec	00328626	Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková	DoP	118 874	96 869	22 005	22 005
OP LZ	MV SR	312061X614	Mesto Krompachy	obec	00329282	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy	DoP	872 146	872 146	0	0
OP LZ	MV SR	312061Y685	MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA	obec	00319031	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota	DoP	442 625	442 625	0	0
OP LZ	MV SR	312061Y442	Obec Plášťovce	obec	00307360	Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Plášťovce	DoP	127 500	127 500	0	0
OP LZ	MV SR	312061Y608	Obec Malý Slavkov	obec	31984673	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov	DoP	619 526	619 526	0	0
OP LZ	MV SR	312061BVK1	Obec Kameňany	obec	00328367	Vybudovanie chodníkov- zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností v obci Kameňany	DoP	65 907	65 907	0	0
OP LZ	MV SR	312051BDB8	Mesto Medzev	obec	00324442	Podpora vysporiadania majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v lokalitách s prílohosťou MRK postupom JPÚ v meste Medzev	DoP	174 477	174 477	0	0
OP LZ	MV SR	312051BAU6	Obec Červenica	obec	00326917	Červenica – vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom s prílohosťou MRK postupom JPÚ	DoP	69 105	69 105	0	0
OP LZ	MV SR	312051AYS2	Obec Svinia	obec	00327760	Vysporiadanie pozemkov v osade Svinia	DoP	64 709	64 709	0	0
OP LZ	MV SR	312051AXB9	Obec Pečovská Nová Ves	obec	00327590	Podpora vysporiadania majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav	DoP	50 568	50 568	0	0
OP LZ	MV SR	312051AYP6	Obec Vikartovce	obec	00326691	Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v obci Vikartovce	DoP	62 487	62 487	0	0
OP LZ	MV SR	312051AVC9	Obec Stráne pod Tatrami	obec	00326593	Vysporiadanie pozemkov v osade Stráne pod Tatrami	DoP	167 676	167 676	0	0
OP LZ	MV SR	312051AYZ5	Obec Šarišská Poruba	obec	00327778	Šarišská Poruba – vysporiadanie majetko-právných vzťahov k pozemkom s prílohosťou MRK postupom JPÚ	DoP	30 954	30 954	0	0
OP LZ	MV SR	312051BFR7	Obec Hlinné	obec	00332411	Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v obci Hlinné	DoP	97 060	97 060	0	0
OP LZ	MV SR	312051AWQ1	Obec Toporec	obec	00326631	Vysporiadanie pozemkov v osade Toporec	DoP	61 209	61 209	0	0
OP LZ	MV SR	312051AXB7	Obec Chmeľov	obec	00327115	Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v rámci rómskeho osídlenia v obci Chmeľov	DoP	24 818	24 818	0	0
OP KŽP	MŽP SR	310021ALM3	Slovenský hydrometeorologický ústav	Príspevková organizácia	00156884	Hodnotenie a manažment povodňového rizika - aktualizácia	DoP	10 086 393	10 086 393	0	0

*skutočné čerpanie k 28.08.2023 + plán čerpania do konca PO 14-20

** bez dodatočného dopadu na štátny rozpočet

Pozn.:

*** prijímateľ nenaplní merateľné ukazovatele

Príloha č. 3: Zoznam 27 projektov, hodnotených v období 18.07.2023 – 31.08.2023 (informácie zodpovedajú stavu k 31.08.2023)

Názov	Celková zazmluvnená suma €	Organizácia	Úroveň rozpracovania/ implementácie projektu v %	Služby budú realizované v jednotnom dizajne IDSK	Služba alebo systém poskytuje otvorené dáta voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok	Užívateľské testovanie		Služba alebo systém sú integrované na IS Centrálnej správy referenčných údajov (1x a dost)
				Vyhláška č. 78/2020 Z. z., § 35a a § 17	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2	Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1	Služba alebo systém prešli používateľskými testami funkčného používateľskéh o rozhrania	Služba alebo systém prešli užívateľskými akceptačnými testami
Centrálny informačný systém štátnej služby	3 358 959	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	100	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Informačný systém Centra právnej pomoci	2 037 121	Centrum právnej pomoci	60	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie	2 717 271	Centrum spoločných činností SAV	60	nerelevanté	nerelevanté	nerelevanté	nerelevanté	nerelevanté
Modernizácia informačného systému DCOM	6 833 749	Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	100	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno
Malé zlepšenia služieb IS DCOM	985 403	Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	50	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 25001- 40 000 obyvateľov	4 273 992	Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	70	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 14 000 - 20 000 obyvateľov	3 197 918	Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	70	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 20 001 - 25 000 obyvateľov	3 197 918	Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	70	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ	4 259 851	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	50	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Centrálny ekonomický systém	27 594 993	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	70	nerelevanté	Áno	Nie	Áno	Áno
Malé zlepšenia eGov služieb	998 148	Ministerstvo spravodlivosti SR	80	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)	9 316 736	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	80	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR	3 895 561	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	80	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Zvyšovanie užitočnej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie VS	13 927 492	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	60	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia	915 516	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	50	Nie	nerelevanté	Nie	Nie	nerelevanté
Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia – rozšírenie	623 038	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	10	Nie	nerelevanté	Nie	Nie	nerelevanté
Jednotná digitálna brána – služby MV SR	594 077	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	20	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Pamiatkový informačný systém	7 089 574	Pamiatkový úrad SR	70	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
POZ (Podpisovač, overovač, zapisovač) v elektronickej komunikácii so štátom	765 441	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	30	Áno	nerelevanté	Nie	Nie	nerelevanté
Jednotný informačný systém štatistických údajov	8 224 132	Štatistický úrad Slovenskej republiky	100	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR	1 522 888	Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky	80	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Malé zlepšenia služieb SVP	426 884	Slovenský vodohospodársky podnik	30	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
Služby laboratórneho IS ÚKSÚP	638 611	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave	20	Nie	Áno	Nie	Nie	Áno
Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR	767 961	Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky	60	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
IS eForms	2 203 875	Úrad pre verejné obstarávanie	90	Nie	Áno	Nie	Nie	Áno
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva	17 950 436	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky	90	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky ZVJS SW-ostatné	23 748 111	GR Zboru väzenskej a justičnej stráže	40	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno

Príloha č. 4: Odporúčania pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe

Odporúčené funkcie a princípy	Legislatíva a DESI index (GUI & UX funkcie)
Responzívny dizajn - služba je realizovaná v designe, ktorý umožňuje zobrazenie na mobilných zariadeniach bez zhoršenia používateľskej skúsenosti ("mobile-friendly")	Vyhláška č. 78/2020 Z. z., § 35a a § 17
Single sign on (SSO) - služba je prístupná cez prenos autentifikácie bez potreby opätovnej autentifikácie	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2
Možnosť hodnotenia služby - užívateľ má možnosť ohodnotiť službu priamo v procese alebo na jeho konci	Vyhláška č. 547/2021 Z. z., § 11
Predvyplnenie údajov - v službe sú užívateľovi predvyplnené jeho osobné údaje, ktoré o ňom už štát vlastní	Vyhláška č. 78/2020, Príloha č.1
eID - prepojenie na elektronickú schránku	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 13
Prístupnosť webových sídiel - webových obsah upravený tak, aby rešpektoval používateľa, jeho zdravotnú spôsobilosť, vedomosti, skúsenosti, ale aj technické vybavenie.	Vyhláška 78/2020 Z.z., § 14
Modul spätnej väzby	Vyhláška č. 547/2021 Z. z., § 11
Systém zasiela notifikácie	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 18, ods. 2 a Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2
IDSK - služby sú v jednotnom dizajne manuále elektronických služieb a webových sídiel	Vyhláška č. 78/2020 Z. z., § 35a a § 17
API - verejne dostupné aplikačné rozhranie na vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 25, ods. 7
Prihlásenie pomocou mobilného ID (mID)	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 13
Úroveň autentifikácie - rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa úrovni autentifikácie a ich správne označenie	Vyhláška č. 78/2020 Z. z., § 34
Formulár evidovaný v module elektronických formulárov	Zákon č. 305/2013 Z.z., § 24
Po nasadení diela bude odovzdaný zdrojový kód s možnosťou editácie a zverejnenia	Zákon č. 95/2019 Z. z., § 15, ods. 2, písm. d)
Funkčné testovanie (FAT)	Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1
Systémové a integračné testovanie (SIT)	Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1
Záťažové a výkonnostné testovanie	Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1
Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)	Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1
Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)	Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1
Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)	Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1
Open API - Služba alebo systém poskytuje otvorené dáta voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2
Napojenie na CSRÚ - Služba alebo systém sú integrované na IS Centrálnej správy referenčných údajov	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2
Integrácia na schránku ÚPVŠ	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2
Integrácia na IAM (Identity access management)	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2
Integrácia na CUD (Centrálne úradné doručovanie)	Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2
Dodávateľ má podľa zmluvy dodať integračné manuály	Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1
Automaticky publikovné datasety ako otvorené údaje	Uznesenie vlády SR č. 457/2022, Vyhláška 78/2020 Z. z., § 39 a § 40,
Publikované datasety ako analytické údaje	Zákon 211/2000 Z. z., § 3, ods. 4
Sekcia často kladených otázok - služba obsahuje sekciu často kladených otázok na viditeľnom a prístupnom mieste	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
Demo služby - služba obsahuje demo inštrukcií vo forme videa	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
Živá podpora - služba obsahuje ľahký prístup ku online podpore (napr. formou chatu, info linky, ...)	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
Diskusné fórum alebo social. médiá - služba obsahuje diskusné fórum alebo odkaz na sociálne médium, kde je možné diskutovať a vyjadrovať sa ku službe	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
Sledovanie krokov v službe - služba prehľadne zobrazuje postup krokov, ktoré je potrebné vykonať a sleduje v ktorom kroku sa užívateľ nachádza	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
Uložiť návrh - služba umožňuje používateľovi uložiť rozprávané podanie a vrátiť sa k nemu neskôr	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
Odhadovaný čas vybavenia služby - služba na začiatku informuje užívateľa o odhadovanom čase potrebnom na realizáciu celého procesu	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
Maximálny čas ukončenia vybavenia služby - služba na začiatku informuje užívateľa o maximálnom čase na realizáciu celého procesu (vrátane legislatívneho čakania)	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
informácie na mieru pre cudzincov - služba poskytuje jazykové mutácie a prispôbenie pre potreby zahraničných používateľov	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
Spätná väzba pre zahraničných používateľov - služba umožňuje zahraničným používateľom zadávať spätnú väzbu v jazykových mutáciách	Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe
