



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Implementácia EŠIF k 31.12.2020




13.01.2021

Plnenie pravidla N+3 v roku 2020

- ✓ Všetky prostriedky **vyčerpané** za fondy - Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Európsky sociálny fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka; okrem operačného programu Rybné hospodárstvo (Európsky námorný a rybársky fond), ktorý nesplnil pravidlo N+3
- ✓ Drvivá väčšina úloh pre ministrov pre zabránenie rizika dekomitmentu **splnená**

Plnenie pravidla N+3 k 31.12.2020
podľa fondov a sumy, ktorú bolo potrebné vyčerpať

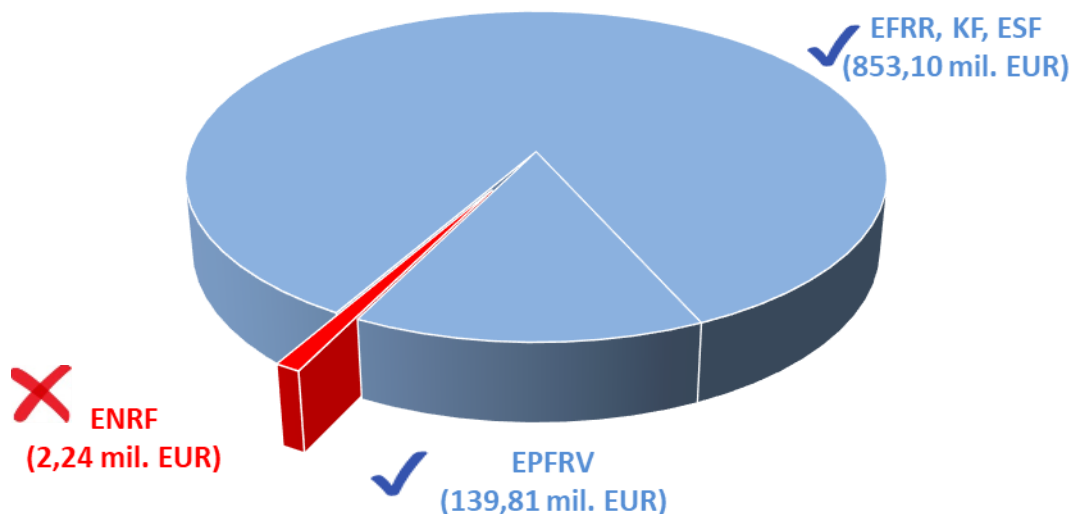

Zdroj: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), RO PRV


Celková suma za všetky fondy, ktorú bolo potrebné vyčerpať do 31.12.2020: 995,15 mil. EUR

✓ EFRR, KF a ESF - 100 % plnenie (853,10 mil. EUR)

✓ EPFRV – 100 % plnenie (139,81 mil. EUR)

✗ ENRF - 0 % plnenie (2,24 mil. EUR)

Stav plnenia pravidla N+3 k 31.12. v jednotlivých rokoch
(za fondy EFRR, KF, ESF a ENRF v EUR)

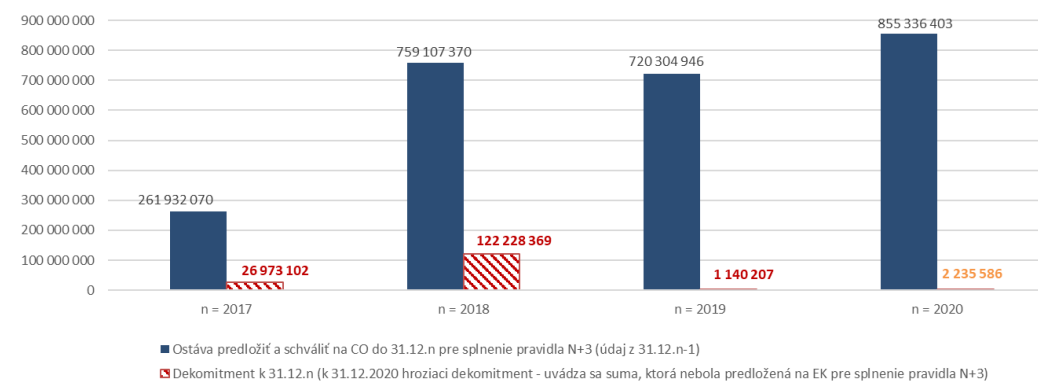


Zdroj: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)



Stav výziev, kontrahovania a čerpania EŠIF k 31.12.2020

✓ Od 21.03.2020 zvýšenie čerpania o 1,98 mld. EUR
Za viac ako 6 rokov vyčerpané len 4,88 mld. EUR

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 21.03.2020		Stav k 31.12.2020		Nárast od 21.03.2020	
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v p.b.
Výzvy/vyzvania	17 727 452 763	115,83%	19 071 851 735	124,62%	+ 1 344 398 972	8,79%
Kontrahovanie	10 801 367 796	70,39%	12 386 716 116	80,73%	+ 1 585 348 320	10,34%
Čerpanie	4 877 932 942	31,79%	6 859 290 851	44,71%	+ 1 981 357 910	12,92%

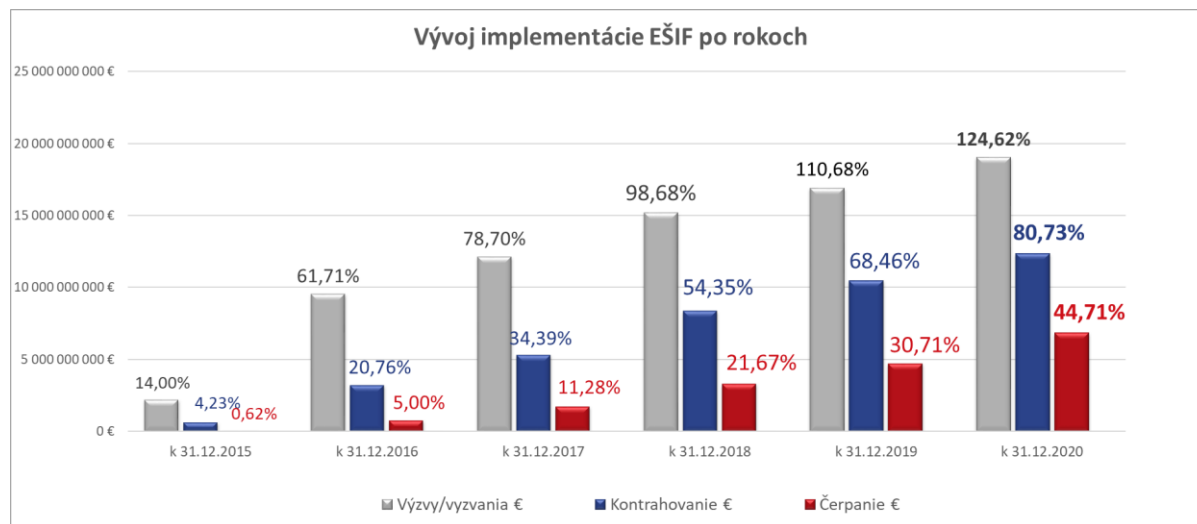

Alokácia EŠIF

15,34 mld. EUR

Ostáva vyčerpať do 2023

8,48 mld. EUR


+ alokácia REACT-EU

0,78 mld. EUR

**Spolu za 3 roky ostáva vyčerpať
do konca programového obdobia:
9,26 mld. EUR**


Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR), RO PRV, RO Interreg V-A SK-AT, RO PS INTERACT III

Porovnanie stavu plnenia N+3 k 31.10.2020 a k 31.12.2020

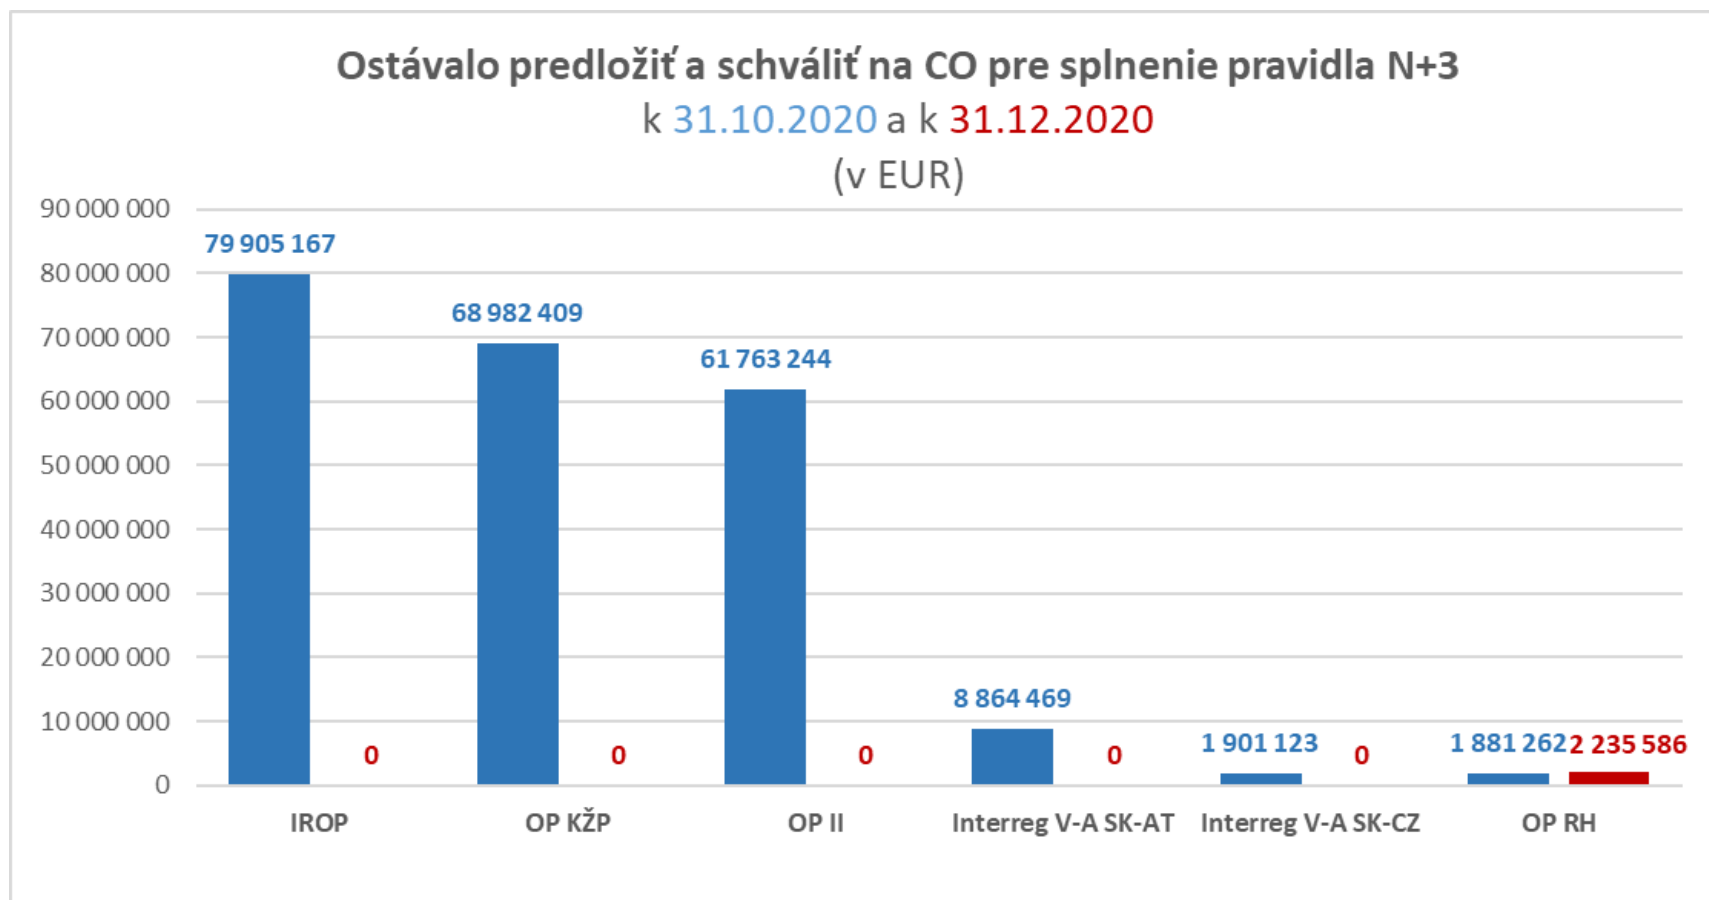

Zdroj: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)


✓ K 31.10.2020 bolo potrebné za 1,5 mesiaca ešte vyčerpať za 6 OP spolu 223,30 mil. EUR



✓ Splnené za 5 programov
✗ Nesplnené za 1 program (OP RH)



Porovnanie čerpania krajín EÚ 27 a Veľkej Británie – stav k 30.11.2020

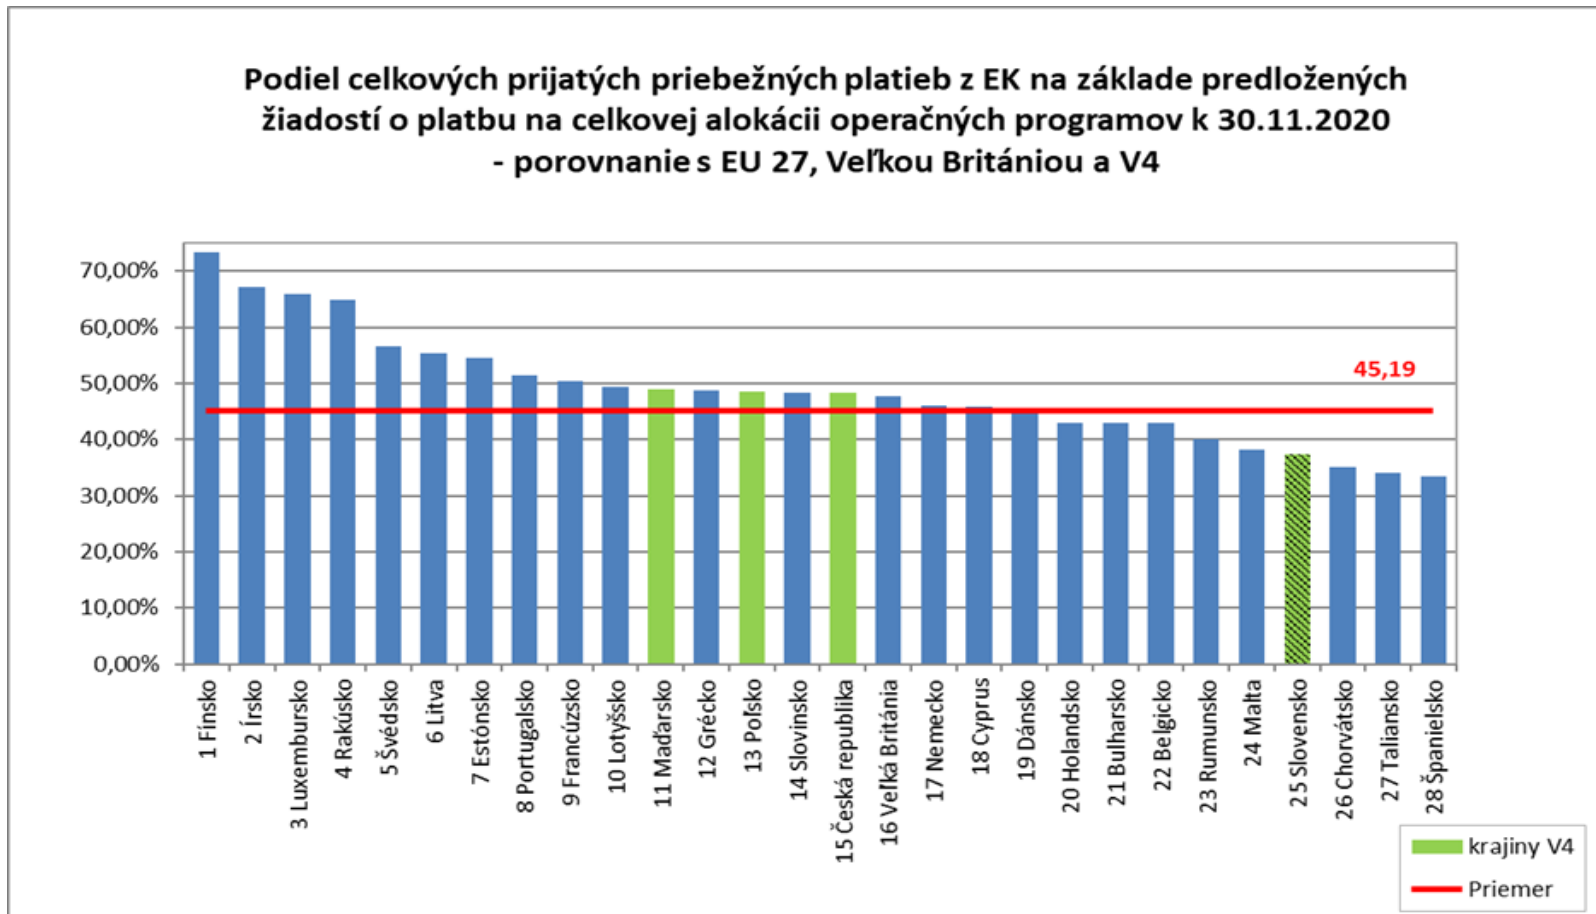

Zdroj: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

Oproti stavu ku koncu marca 2020 sa Slovensko posunulo o dve priečky nahor z **27 miesta na 25. miesto**. Úroveň prijatých priebežných platieb z EK oproti celkovej alokácii na programy predstavuje **37,39 %**.

Prehľad programov a ich riadiacich orgánov

Za implementáciu operačných programov/programov zodpovedá riadiaci orgán

Program	Riadiaci orgán
Operačný program Ľudské zdroje	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program Integrovaná infraštruktúra	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Operačný program Kvalita životného prostredia	Ministerstvo životného prostredia SR
Integrovaný regionálny operačný program	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Program spolupráce Interreg V-A SK-AT	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program Technická pomoc	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program Efektívna verejná správa	Ministerstvo vnútra SR
Program spolupráce INTERACT III	Bratislavský samosprávny kraj
Operačný program Rybné hospodárstvo	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Program rozvoja vidieka	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Stav kontrahovania jednotlivých OP k 31.12.2020

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020	Kontrahovanie - stav k 31.12.2020		Kontrahovanie - stav k 21.03.2020		Nárast kontrahovania od 21.03.2020	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	p.b.
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516	2 626 829 217	100,52%	2 024 965 344	77,49%	601 863 873	23,03%
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	4 771 158 393	79,39%	4 094 056 917	68,12%	677 101 475	11,27%
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	1 932 891 286	68,24%	1 894 413 158	66,88%	38 478 128	1,36%
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778	1 277 393 886	75,14%	1 200 244 855	70,61%	77 149 031	4,54%
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497	206 942 784	82,29%	202 161 358	80,39%	4 781 426	1,90%
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	136 323 968	85,70%	111 893 199	70,34%	24 430 769	15,36%
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	3 607 141	30,54%	3 261 389	27,61%	345 752	2,93%
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	67 490 556	74,87%	65 904 246	73,11%	1 586 310	1,76%
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	54 140 174	71,34%	50 093 333	66,01%	4 046 841	5,33%
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	39 392 594	100,00%	39 392 594	100,00%	-	-
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	11 116 169 997	80,65%	9 686 386 393	70,27%	1 429 783 605	10,38%
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844	1 270 546 118	81,46%	1 114 981 403	71,49%	155 564 716	9,97%
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	12 386 716 116	80,73%	10 801 367 796	70,39%	1 585 348 320	10,34%

Zdroj údajov: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021 o 7:00hod), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III




Stav čerpania jednotlivých OP k 31.12.2020 a pravidlo N+3 v nasledujúcich rokoch

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020	Čerpanie EŠIF - stav k 31.12.2020		Čerpanie EŠIF - stav k 21.03.2020		Nárast čerpania od 21.03.2020		Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) v roku 2023 a 01-03/2024 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 03/2024 pre splnenie pravidla N+3 (kumulatívne)
	EÚ zdroj	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	p.b.	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516	1 513 258 127	57,91%	847 295 496	32,42%	665 962 631	25,48%	0	0	1 099 908 389	1 099 908 389
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	2 302 335 173	38,31%	1 764 376 887	29,36%	537 958 286	8,95%	500 759 524	783 812 834	2 423 030 080	3 707 602 438
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	1 159 823 167	40,95%	899 783 923	31,77%	260 039 244	9,18%	318 254 260	405 124 207	949 329 656	1 672 708 123
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778	634 176 636	37,31%	380 346 269	22,37%	253 830 368	14,93%	146 240 098	219 727 722	699 797 322	1 065 765 142
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497	107 861 316	42,89%	75 621 239	30,07%	32 240 077	12,82%	23 398 828	35 927 146	84 289 207	143 615 181
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	106 754 022	67,11%	87 952 293	55,29%	18 801 730	11,82%	0	0	52 317 890	52 317 890
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	642 026	5,43%	1 041 000	8,81%	-398 974	-3,38%	1 925 228	1 940 008	5 042 660	8 907 896
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	26 199 080	29,07%	11 261 889	12,49%	14 937 192	16,57%	11 889 997	15 820 942	36 229 444	63 940 383
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	20 303 165	26,75%	7 733 640	10,19%	12 569 525	16,56%	11 765 831	13 320 399	30 503 286	55 589 516
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	21 680 711	55,04%	17 326 343	43,98%	4 354 368	11,05%	0	1 878 933	15 832 950	17 711 883
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	5 893 033 425	42,75%	4 092 738 978	29,69%	1 800 294 446	13,06%	1 014 233 764	1 477 552 191	5 396 280 884	7 888 066 839
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844	966 257 427	61,95%	785 193 963	50,34%	181 063 463	11,61%	163 065 271	214 844 203	215 524 943	593 434 417
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	6 859 290 851	44,71%	4 877 932 942	31,79%	1 981 357 910	12,92%	1 177 299 036	1 692 396 394	5 611 805 827	8 481 501 256

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Pozn. : Ostáva predložiť a schváliť na CO v roku 2023 a 01-03/2024 - oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov prijímateľmi je umožnené v termíne do 31.12.2023

Porovnanie minimálnej sumy potrebnej vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v rokoch 2021 - 2024 za EŠIF celkom

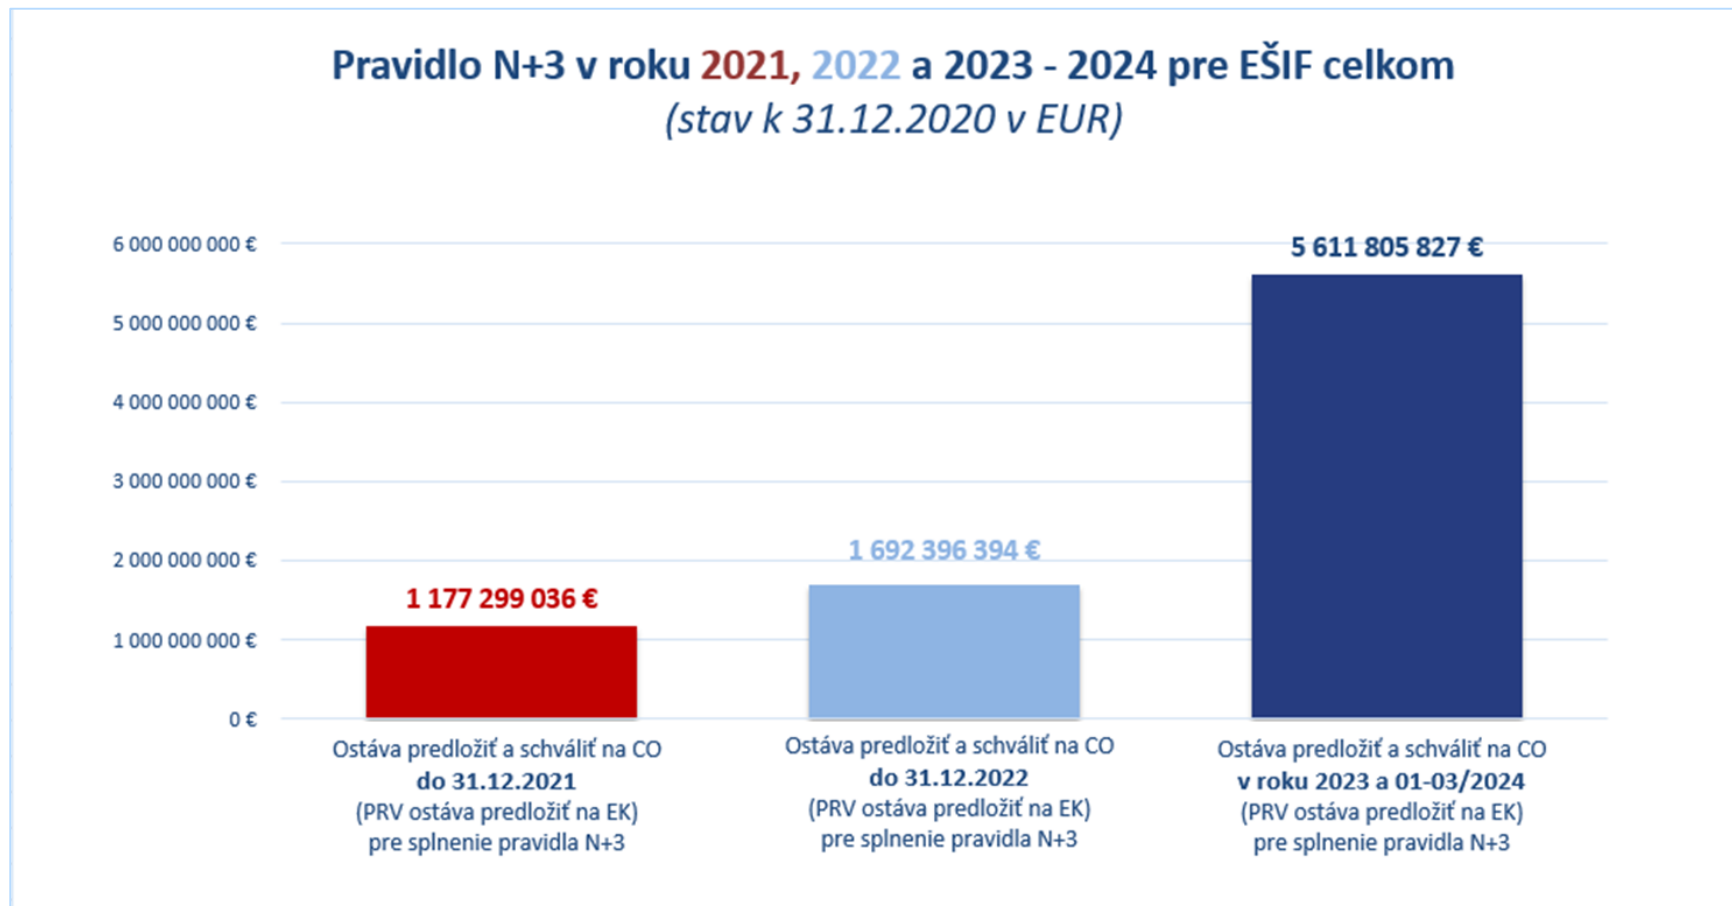

Zdroj: Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV,

Pozn. : Ostáva predložiť a schváliť na CO v roku 2023 a 01-03/2024 - oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov prijímateľmi je umožnené v termíne do 31.12.2023



Korekcie s dopadom na rozpočet EÚ k 31.12.2020

Z deklarovaných výdavkov na EK bola k 31.12.2020 **odpočítaná celková suma 498 mil. EUR**, z tejto sumy **SR trvalo uplatnila korekcie vo výške 194 mil. EUR**. Zostatok odpočítanej sumy vo výške **305 mil. EUR** predstavujú **rizikové výdavky s prebiehajúcim skúmaním** zákonnosti a oprávnenosti na základe zistení auditov EK alebo národných kontrol/auditov, najmä porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ne hospodárnosť výdavkov, konflikt záujmov alebo porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. K 31.12.2020 suma **neuhradených korekcií** zodpovedá výške **148 mil. EUR**.

Operačný program	Vykázané a uplatnené korekcie voči rozpočtu EÚ			Dočasne vylúčené rizikové výdavky z deklarovania voči rozpočtu EÚ			Podiel uplatnených korekcií z čerpania	Podiel dočasne vylúčených výdavkov z čerpania	Podiel uplatnených korekcií a dočasne vylúčených výdavkov z čerpania
	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	EÚ	EÚ
OP INTERACT III	35 205,57	6 212,76	41 418,33	0,00	0,00	0,00	0,16%	0,00%	0,16%
OP Technická pomoc	2 208 814,41	482 356,31	2 691 170,72	0,00	0,00	0,00	2,08%	0,00%	2,08%
Integrovaný regionálny OP	1 498 529,07	550 108,88	2 048 637,95	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,00%	0,27%
OP Rybné hospodárstvo	150 616,92	24 782,34	175 399,26	0,00	0,00	0,00	13,60%	0,00%	13,60%
Interreg V-A SK-CZ	96 558,88	11 154,64	107 713,52	0,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,36%
Interreg V-A SK-AT	28 403,22	1 045,49	29 448,71	0,00	0,00	0,00	0,16%	0,00%	0,16%
OP Kvalita životného prostredia	4 150 288,87	564 252,06	4 714 540,93	60 503 465,40	3 941 536,26	64 445 001,66	0,37%	5,33%	5,69%
OP Ľudské zdroje	19 664 686,35	3 426 839,81	23 091 526,16	1 707 996,02	458 301,67	2 166 297,69	1,47%	0,13%	1,60%
OP Efektívna verejná správa	118 856,96	32 261,85	151 118,81	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,11%
OP Integrovaná infraštruktúra	133 793 115,15	23 959 294,00	157 752 409,15	189 427 162,43	33 428 332,78	222 855 495,21	8,39%	11,88%	20,28%
OP Výskum a inovácie	2 477 422,38	384 614,55	2 862 036,93	14 227 882,23	882 275,85	15 110 158,08	0,44%	2,51%	2,95%
OP Integrovaná infraštruktúra (vrátane OP Val)	136 270 537,53	24 343 908,55	160 614 446,08	203 655 044,66	34 310 608,63	237 965 653,29	6,31%	9,42%	15,73%
SPOLU	164 222 497,78	29 442 922,69	193 665 420,47	265 866 506,08	38 710 446,56	304 576 952,64	3,00%	4,86%	7,87%

Najvyššiu sumu korekcií vykazuje OP Integrovaná infraštruktúra vo výške 158 mil. EUR a OP Ľudské zdroje vo výške 23 mil. EUR.

Zdroj: MF SR



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

www.mirri.gov.sk

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Riziková analýza jednotlivých OP


Aktuálnu kondíciu jednotlivých programov v porovnaní s ostatnými je možné stanoviť na základe **vyhodnotenia nasledovných základných kritérií rizikovosti** s tým, že najvyššiu váhu má riziko neplnenia N+3, výsledkom ktorých je **zaradenie programu medzi vysoko rizikové, menej rizikové a nerizikové**

Porovnanie stavu rizikovosti

k 31.10.2020



k 31.12.2020

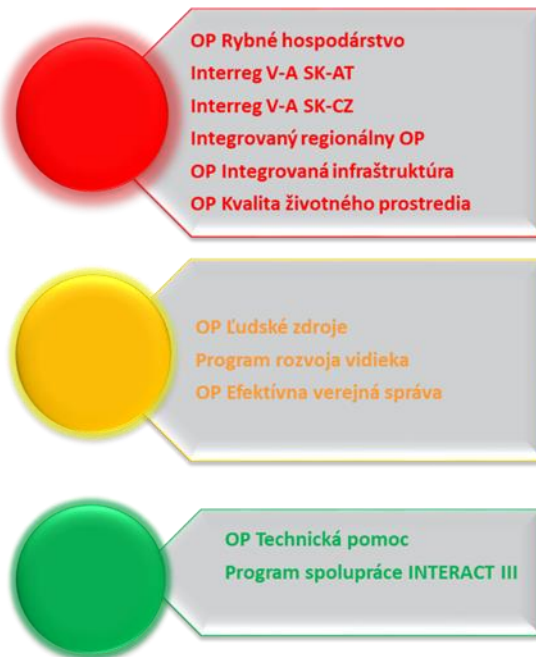

Dôvody presunu OP:

Vysoko rizikové:

+ OP KŽP zaradený do červeného semaforu - vysoký objem sumy, ktorú je potrebné vyčerpať v r. 2021 v kombinácii s ostatnými rizikovými faktormi

+ OP II zaradený do červeného semaforu - vysoký objem sumy, ktorú je potrebné vyčerpať v r. 2021 v kombinácii s ostatnými rizikovými faktormi, veľmi veľký OP s alokáciou 6 mld. EUR

+ Interreg V-A SK-CZ zaradený do červeného semaforu – vysoký objem sumy, ktorú je potrebné vyčerpať v r. 2021, plnenie N+3 zvyčajne až koncom roka

Menej rizikové:

+ OP EVS preradený zo zeleného do žltého semaforu – vysoký objem sumy, ktorú je potrebné vyčerpať v r. 2021, plnenie N+3 zvyčajne až v závere roka

Nerizikové:

V zelenom semafore ostali len dva OP, ktoré majú už splnenú N+3 na r. 2021 a nemajú iné rizikové faktory



Vyhodnotenie plnenia úloh jednotlivých ministrov k 31.12.2020 - rekapitulácia

Bolo stanovených 60 úloh pre ministrov, z nich bolo k 31.12.2020:

- ✓ **42 splnených** (2 MPSVaR, 8 MV SR, 3 MŽP SR, 3 MH SR, 6 MŠVVaŠ SR, 4 MDV SR, 2 MZ SR, 1 MK SR, 9 MIRRI SR, 4 MPRV SR)
- ✓ **9 čiastočne splnených** (1 MPSVaR, 2 MV SR, 2 MZ SR, 2 MK SR, 1 MIRRI SR, 1 MPRV SR) – ide najmä o prijatie a overenie opatrení z následných auditných zistení
- ✓ **4 v plnení** (1 MŠVVaŠ SR, 1 MIRRI SR, 2 MPRV SR) – úlohy, ktoré sa plnia priebežne
- ✗ **4 nesplnené** (4 MPRV SR) – týkajú sa výlučne OP Rybné hospodárstvo
- ✓ **1 úloha s posunom termínu** (MŠVVaŠ SR)




Operačný program Rybné hospodárstvo

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)

Sprostredkovateľský orgán (SO): Pôdohospodárska platobná agentúra

Financované EÚ z: Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), Alokácia: 11,81 mil. EUR



AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **3,61 mil. EUR** z EÚ zdrojov, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **30,54 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **642,03 tis. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **5,43 %** z celkovej alokácie;
- trvá prerušenie lehoty na úhradu žiadostí o platbu v zmysle čl. 83 nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 1303/2013;
- **dekomitment za rok 2018 bol vo výške 1,88 mil. EUR a za rok 2019 vo výške 1,14 mil. EUR**;
- **strata výkonnostnej rezervy vo výške 0,95 mil. EUR**;
- **očakávaný dekomitment za rok 2020 je vo výške 1,50 až 2,24 mil. EUR v závislosti od uplatnenia čl. 87 – COVID19 vis major**;


RIZIKÁ

- × **od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo na úrovni CO vyčerpaných len 20 037 EUR (EÚ zdroj), po zohľadnení dvoch vrátených ŽoP zo strany EK došlo k poklesu čerpania o viac ako 445 tis. EUR (EÚ zdroj);**
- × RO v spolupráci s CKO a CO pripravuje argumentáciu pre uplatnenie výnimky zo zrušenia viazanosti finančných prostriedkov z dôvodu pandemickej situácie v zmysle čl. 87;
- × pre naplnenie pravidla N+3 **je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO** finančné prostriedky vo výške **1,93 mil. EUR, čo predstavuje trojnásobok toho, čo bolo vyčerpané za OP RH počas šiestich rokov implementácie**;
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 11,14 mil. EUR, t. j. 94,33 % z celkovej alokácie**;
- × nízky záujem potencionálnych žiadateľov o NFP;
- × EK listom Ref.Ares (2020)142428 z 10.01.2020 **prerušila lehoty na úhradu platieb** najviac na 6 mesiacov, tzn. do 10.7.2020. Zároveň listom Ref.Ares (2020)2652850 z 20.05.2020 požiadala slovenské orgány, aby súhlasili s predĺžením obdobia prerušenia o ďalšie tri mesiace. Listom Ref.Ares (2020)5062021 zo dňa 28.09.2020 (SJ verzia 14.10.2020) EK oznamuje, že môže začať procedúru pozastavenia platieb pre OP RH 2014 – 2020, keďže v rámci účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP existujú závažné nedostatky, ktoré ohrozili príspevok Únie na program a pre ktoré neboli prijaté primerané nápravné opatrenia. Na videocalle s DG MARE (07.10.2020) sa dohodla spoločná odpoveď na všetky 3 listy do 28.11.2020. RO dňa 27.11.2020 zaslal list č. 47958/2020 v ktorom informuje EK o prijatých nápravných opatreniach. Následne OA listom č. MF/019699/2020-1473 zo dňa 14.12.2020 informoval EK o záveroch vládneho auditu č. A1017 (kategória 4), vyhodnotení splnenia opatrení k nedostatkom z prechádzajúceho systémového auditu č. A953 a vyhodnotení stavu plnenia úloh z Akčného plánu implementácie OP RH na rok 2020 vypracovaného riadiacim orgánom.
- × **neprijatie adekvátnych nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z auditov na odblokovanie platieb z EK**;
- × RO zaslal listom 46651/20020 dňa 04.11.2020 EK reakciu k priebehu nastavenia programovania pre obdobie rokov 2021-2027. Dňa 22.12.2020 bol zo strany EK zaslaný list Ref.Ares(2020)7838253 z 21.12.2020, v ktorom EK informovala o príprave nového programového obdobia v rámci ENRF. Vzhľadom na súčasnú celosvetovú situáciu je potrebné začať čo najskôr so schvaľovaním potrebných dokumentov a následne so samotnou implementáciou nového OP, keďže už od 01.01.2021 plyní obdobie oprávnenosti výdavkov. EK zároveň informovala, že na konci januára 2021 sa uskutoční online stretnutie, ktorého cieľom je preskúmať spoločný pracovný plán, úroveň prípravy nového OP vrátane cestovnej mapy a i



Operačný program Rybné hospodárstvo

ÚLOHY PRE MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA




1. Zazmluvniť 2 schválené ŽoNFP (NFP303050AFI8, NFP303020X641) – T: najneskôr do 30.11.2020.
 - ❖ **Úloha nesplnená.** Aktuálne prebieha implementovanie nápravných opatrení na základe zistení ÚVA A1017, je potrebné aktualizovať riadiacu dokumentáciu na úrovni RO a SO tak, aby sa zamedzilo chybovosti. ŽoNFP č. NFP303050AFI8 a NFP303020X641 budú musieť byť na základe zistení ÚVA A1017 opätovne vyhodnotené.
2. Finálne dovyhodnotiť všetky prijaté ŽoNFP, ktoré sú aktuálne v ITMS2014+ v rôznom stave spracovania a v prípade ich schválenia aj zazmluvniť – T: najneskôr do 31.12.2020.
 - ❖ **Úloha nesplnená.** Aktuálne prebieha implementovanie nápravných opatrení na základe zistení vládneho auditu A1017, je potrebné aktualizovať riadiacu dokumentáciu na úrovni RO a SO tak, aby sa zamedzilo chybovosti a uvedené ŽoNFP mohli byť korektne vyhodnotené. Všetky prijaté ŽoNFP musia byť vyhodnotené až po vydaní aktualizovanej riadiacej dokumentácie.
3. Spracovať všetky prijaté ŽoP ktoré sú v ITMS2014+ v rôznom stave spracovania a predložiť ich v súhrnnej ŽoP – T: ASAP, najneskôr do 30.11. 2020
 - ❖ **Úloha nesplnená.** Na základe zistení orgánu auditu v rámci vládneho auditu č. A1017 nebude v roku 2020 predložená zo strany PJ na CO ani jedna SŽP.
4. V prípade prijatia ďalších ŽoP, urgentne ich spracovať a predložiť ich do súhrnnej ŽoP – T: ASAP po ich prijatí na RO.
 - ❖ **Úloha nesplnená.** Na základe zistení orgánu auditu v rámci vládneho auditu č. A1017 nebude v roku 2020 predložená zo strany PJ na CO ani jedna SŽP.
5. Informovať CKO o plánovanej implementácii pripravovaného pilotného projektu na zber dát v rámci PÚ 3 – T: 13.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO informoval CKO o aktuálnom stave pripravovaného pilotného projektu na zber dát mailom dňa 16.11.2020. Návrh zámeru NP bol predložený na pripomienkovanie členom MV dňa 2.12.2020. RO zaslal na CKO dňa 28.10.2020 Indikatívny plán pripravovaných výziev/vyzvaní do konca programového obdobia 2014 -2020.
6. Dôsledne aktualizovať a zrealizovať údaje v týždennnej tabuľke o plánovanom kontrahovaní a čerpaní, ktorú RO posielala v rámci krízového riadenia každý pondelok - T: najneskôr do 2.11.2011.
 - ❖ **Úloha čiastočne splnená.** RO zaslal predbežnú tabuľku implementácie ešte na rok 2020 dňa 02.11.2020. Aktuálny plán čerpania a kontrahovania projektov OP RH bude spracovaný ako súčasť opatrení na odstránenie nedostatkov z vládneho auditu. Vládny audit č. A1017 bol ukončený dňa 11.12.2020. RO má prijať opatrenia k identifikovaným nedostatkom v lehote do 31.12.2020 a splniť prijaté opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov najneskôr do 31.03.2021.
7. Prijat' adekvátne opatrenia na odstránenie nedostatkov zo systémového auditu A953 a zaslaných Warning Letters EK zo dňa 10.01.2020, 20.05.2020 a 28.09.2020 – T: ASAP.
 - ❖ **Úloha sa plní.** RO odstránil/odstraňuje nedostatky z vládneho auditu A953 (5. účtovný rok), ako aj z následného vládneho auditu A1017 (6. účtovný rok). RO realizuje prijaté adekvátne opatrenia do 31.3.2021 na základe finálnej správy z vládneho auditu A1017, ktorý bol ukončený dňa 11.12.2020.
8. Zaslať na pripomienkovanie na CKO, OA a CO návrh listu s prijatými opatreniami aby sa predišlo pozastaveniu platieb, ako reakcia na listy EK (Ref. Ares(2020)142428 zo dňa 10.1.2020, Ref. Ares(2020)2652850 zo dňa 20.05.2020, Ref. Ares(2020)5062021 zo dňa 28.9.2020) - T: najneskôr do 20.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** List zaslaný na pripomienky dňa 20.11.2020
9. Pripraviť odpoveď na listy EK k prerušeniu platieb z 10.01.2020, 20.05.2020 a 28.09.2020 s odpočtom prijatých opatrení - T: najneskôr do 28.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** List zaslaný dňa 01.12.2020.
10. Zaslať list na EK s podrobným harmonogramom prípravy na nové programovacie obdobie T: 7.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** List zaslaný dňa 06.11.2020.

ÚLOHY PRE ROK 2021:

1. Zaslať analýzu využitia článku 87(2), všeob. nariadenia č. 1303/2013 ohľadom vyššej moci z titulu výskytu ochorenia COVID-19 podľa jednotlivých priorít únie na EK – T: najneskôr do 31.01.2021.
2. Zabezpečiť konsolidáciu implementácie OP RH, stabilizovať administratívne kapacity na RO a prijať všetky nápravné opatrenia na naštartovanie celého operačného programu. T: 31.03.2021.



Program Interreg V-A SK-AT



Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 75,89 mil. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 30.11.2020 na úrovni **54,14 mil. EUR** podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **71,34 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **20,30 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **26,75 %** z celkovej alokácie;

RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 11,77 mil. EUR (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 12,70 mil. EUR);
- × do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 55,59 mil. EUR, t. j. 73,25 % z celkovej alokácie;
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 3 (Podpora udržateľných dopravných riešení) - čerpanie na úrovni 0,00 %.

ÚLOHY PRE PODPRESEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE

- ❖ Všetky úlohy k 31.12.2020 sú splnené.




Program Interreg V-A SK-CZ

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 90,14 mil. EUR



AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **67,49 mil. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **74,87 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **26,20 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **29,07 %** z celkovej alokácie.


RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 je **potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 11,89 mil. EUR** (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 14,94 mil. EUR)
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 63,94 mil. EUR**, t. j. **70,93 % z celkovej alokácie**;
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 1** (Využívanie inovačného potenciálu) - čerpanie na úrovni 18,89 %.

ÚLOHY PRE PODPRESEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE

- ❖ **Úlohy k 31.12.2020 sú splnené/čiastočne splnené.**





Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Ministerstvo kultúry SR (MK SR), 7 samosprávnych krajov a 8 krajských miest

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 1,70 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **1,28 mld. EUR**, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **75,14 %**;
- k 31.12.2020 je **vyčerpaných 634,18 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **37,31 %** z celkovej alokácie;
- **dekomitment** za rok 2018 bol vo výške **38,89 mil. EUR**;
- vytvorený nový špecifický cieľ 2.1.4 **Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19** s dodatočnou alokáciou **117,30 mil. EUR**;

RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné **do 31.12.2021 predložiť a schváliť na CO** finančné prostriedky vo výške **146,24 mil. EUR** (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške **259,50 mil. EUR**);
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,07 mld. EUR**, t. j. **62,69 %** z celkovej alokácie;
- × **nedostatočný pokrok v čerpaní v rámci PO 2** – v rámci dopytovo orientovaných výziev (Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti a nemocnice), ktorých implementáciu zabezpečuje **SO - MZ SR**, čerpanie dosiahlo úroveň **24,00 %** z alokácie na dané výzvy;
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 3 (SO - MK SR)**, kde je čerpanie na úrovni **11,29 %**
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 5** (Miestne akčné skupiny), kde je čerpanie **12,52 %**;
- × v nadväznosti na uzavretie zistenia z follow up auditu EK na KŽP č. REGC414SK0114 týkajúceho sa kartelu – stavebných firiem, EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi kartelovej dohody v dištančnej dobe v rámci všetkých operačných programov, t.j. aj v rámci IROP; zároveň vzhľadom na varovný list EK č. (2020)3498579 z 03.07.2020 na KŽP a varovný list EK č. (2020)3498592 z 03.07.2020 na OP II nie je možné na EK deklarovať žiadne výdavky za kartel – stavebné firmy.

ÚLOHY PRE PODPRESEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE

- ❖ **Všetky úlohy k 31.12.2020 sú splnené.**

ÚLOHY PRE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA (PO 2) a MINISTERKU KULTÚRY (PO 3)

- ❖ **Úlohy k 31.12.2020 sú splnené/čiastočne splnené.**




Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 6,01 mld. EUR



AKTUÁLNY STAV


- **kontrahovanie** k 31.12.2020 je na úrovni **4,77 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **79,39 %** z celkovej alokácie;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **2,30 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **38,31 %** z celkovej alokácie;
- **dekomitment OP Val** za rok 2017 bol vo výške **26,97 mil. EUR**, **dekomitment OP Val** za rok 2018 bol vo výške **81,45 mil. EUR**;
- **dňa 13.12.2019 došlo k zlúčeniu dvoch operačných programov, a to OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie**;

RIZIKÁ

- × komplexný OP s najväčšou alokáciou;
- × pre naplnenie pravidla N+3 je **potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 500,76 mil. EUR (aktuálne čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 582,09 mil. EUR)**;
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 3,71 mld. EUR, t. j. 61,69 % z celkovej alokácie**;
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 4** (Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)) – čerpanie na úrovni **0,73 %**, **PO 5** (Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov) – čerpanie na úrovni **6,48 %**, **PO 6** (Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)) – čerpanie na úrovni **17,06 %**, **PO 7** (Informačná spoločnosť) – čerpanie na úrovni **19,31 %**, **PO 9** (Podpora výskumu, vývoja a inovácií) – čerpanie na úrovni **27,59 %**, **PO 10** (Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BK) – čerpanie na úrovni **10,08 %**, **PO 11** (Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP) – čerpanie na úrovni **29,60 %**, **PO 12** (Rozvoj konkurencieschopných MSP v BK) – čerpanie na úrovni **24,17 %**;
- × **Warning Letter Ares(2019)2836041 z 26.04.2019** – reakcia na zaslanú Výročnú kontrolnú správu a auditorské stanovisko zaslané EK vo februári 2019 vo vzťahu k 4. účtovnému roku – časť implementovaná MŠVVŠ SR a MH SR;
- × **Warning Letter Ares (2020)1053480 z 19.2.2020** - reakcia na výsledok systémového auditu č. **A920** - stupeň uistenia **3,- časť implementovaná MDV SR**;
- × **Warning Letter Ares (2020)3498592 z 03.07.2020** – EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi **kartelovej dohody** – **stavebné firmy** v dištančnej dobe, a to v zmysle zistenia identifikovaného auditom EK č. REGC414SK0086 na OP II, zároveň nie je možné deklarovať na EK žiadne výdavky za kartel – stavebné firmy. Dňa 26.11.2020 orgán auditu zaslal na EK list týkajúci sa určenia dištančnej doby. EK následne žiadala dodatočné informácie týkajúce sa zdôvodnenia dištančnej lehoty, udelenia výšky finančnej opravy a doplnenia údajov k dotknutým zákazkám. Údaje boli vyžiadané od RO, v roku 2020 nebolo možné ich sfinalizovať, takže výdavky za kartel nebolo možné do konca roka deklarovať na EK;
- × **Audit EK č. REGC414SK0190** - EK vykonala audit postupov VO, kde bola predložená 1 ponuka v rámci OP II, OP Val a ÚVO. EK identifikovala systémové aj projektové zistenia, pričom niektoré z nich majú finančný vplyv. Stupeň uistenia **za OP II bol klasifikovaný Kategóriou 3** – systém funguje čiastočne, ale sú potrebné značné zlepšenia.



Operačný program Integrovaná infraštruktúra



ÚLOHY PRE MINISTRA DOPRAVY A VÝSTAVBY

- ❖ Všetky úlohy k 31.12.2020 sú splnené

ÚLOHY PRE PODPRESEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE (PO 7)

- ❖ Úlohy k 31.12.2020 sú splnené/v plnení.

ÚLOHY PRE PODPRESEDU VLÁDY SR A MINISTRA HOSPODÁRSTVA (PO 9 - PO 13)


- ❖ Všetky úlohy k 31.12.2020 sú splnené.

ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 9, PO 10, PO 13)

- ❖ Úlohy k 31.12.2020 sú splnené/v plnení, jedna úloha má posun do 30.6.2021.



Operačný program Kvalita životného prostredia



Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Slovenská agentúra ŽP (SAŽP), Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Ministerstvo hospodárstva SR (Slovenská inovačná a energetická agentúra - SIEA)

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 2,83 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **1,93 mld. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **68,24 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **1,16 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **40,95 %** z celkovej alokácie;

RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 je **potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 318,25 mil. EUR** (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 302,45 mil. EUR)
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,67 mld. EUR, t. j. 59,05 % z celkovej alokácie;**
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 2** (SO-SAŽP - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami) – **čerpanie na úrovni 12,41 %**;
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 3** (SO-MV SR a SO-SAŽP - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy) – **čerpanie na úrovni 25,40 %**;
- × v nadväznosti na uzavretie zistenia z follow up auditu EK na KŽP č. REGC414SK0114 týkajúceho sa kartelu – stavebných firiem, EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi kartelovej dohody v dištančnej dobe, a zároveň v rámci **Warning Letter Ares (2020)3498579 z 03.07.2020** nie je možné deklarovať na EK žiadne výdavky za kartel – stavebné firmy Dňa 26.11.2020 orgán auditu zaslal na EK list týkajúci sa určenia dištančnej doby. EK následne žiadala dodatočné informácie týkajúce sa zdôvodnenia dištančnej lehoty, udelenia výšky finančnej opravy a doplnenia údajov k dotknutým zákazkám. Údaje boli vyžiadané od RO, v roku 2020 nebolo možné ich sfinalizovať, takže výdavky za kartel nebolo možné do konca roka deklarovať na EK;
- × druhé najnižšie percento kontrahovania v porovnaní s ostatnými OP (68,24 % z celkovej alokácie).

ÚLOHY PRE MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRE MINISTRA VNÚTRA (PO 3) A PRE PODPREDESEDU VLÁDY SR A MINISTRA HOSPODÁRSTVA (PO 4)

- ❖ **Všetky úlohy k 31.12.2020 sú splnené.**



Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Implementačná agentúra MPSVaR SR (IA MPSVaR SR)

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)

Alokácia: 2,61 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** k 31.12.2020 je na úrovni **2,63 mld. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **100,52 %**;
- **čerpanie** k 31.12.2020 je na úrovni **1,51 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **57,91 %** z celkovej alokácie;
- pravidlo N+3 **je pre roky 2021 a 2022 splnené**;
- **od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vyčerpaných 717,90 mil. EUR (EÚ zdroj)**;
- v rámci boja proti pandémie **COVID-19** a zmiernovania jej dopadov boli realokované dodatočné zdroje pre PO3 vo výške 410,26 mil. EUR (vnútorná realokácia z PO 2 a realokácia z iných OP), pre PO5 vo výške 8 mil. EUR (vnútorná realokácia z PO 6), v rámci PO1 alokované zdroje na vyzvania vo výške 73,3 mil. EUR a v rámci PO 5 vo výške 28 mil. EUR. Dodatočný presun ešte 20 mil. EUR z PO 9 OP II do PO 3 OP IZ na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.

RIZIKÁ


- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,10 mld. EUR, t.j. 42,09 % z celkovej alokácie**;
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 1** (SO-MŠVVaŠ SR) - čerpanie na úrovni 27,13 %, nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 6** (SO-MV SR) – čerpanie na úrovni 17,92 %.
- × **Warning Letter Ares(2020)31981 zo 6.1.2020** - reakcia na výsledok systémového auditu č. **A924** – stupeň uistenia 3 pre SO IA MPSVR SR (dopytovo-orientované projekty), výdavky implementované SO IA MPSVR SR sa na EK neдекlarujú, až do predloženia finálneho stanoviska Európskej komisii;
- × **Warning Letter Ares (2020)2544197 zo 14.5.2020** - reakcia na vyhlásenie auditorskej skupiny k VKS a na výsledok auditu operácií č. **A1010**. EK upozorňuje hlavne na závažné nedostatky v postupoch overovania VO a vo fungovaní SO MV SR (PO 6), schvaľovanie súhrnných ŽoP na národnej úrovni nie je prerušené, je možné na CO predkladať výdavky, pri ktorých RO nemá pochybnosti o ich zákonnosti, oprávnenosti a správnosti.

ÚLOHY PRE MINISTRA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A PRE MINISTRA VNÚTRA (PO 5 a PO 6)

- ❖ **Úlohy k 31.12.2020 sú splnené/čiastočne splnené.**

ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 1)

- ❖ **Všetky úlohy k 31.12.2020 sú splnené.**




Program rozvoja vidieka

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)

Sprostredkovateľský orgán (SO): Pôdohospodárska platobná agentúra

Financované EÚ z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Alokácia: 1,56 mld. EUR



AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **1,27 mld. EUR** z EÚ zdrojov, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **81,46 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **966,26 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **61,95 %** z celkovej alokácie.

RIZIKÁ


- × pre naplnenie pravidla N+3 je **potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť ešte 163,07 mil. EUR** (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 190,85 mil. EUR);
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 593,43 mil. EUR**, t.j. 38,05 % z celkovej alokácie;
- × neuspokojivá implementácia CLLD - **kontrahovanie aj čerpanie** projektov v Miestnych akčných skupinách (MAS) je na úrovni **0,00 %**.

ÚLOHY PRE MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

- ❖ **Úloha k 31.12.2020 sa plní, bude sa odpočtovať aj v roku 2021.**



Operačný program Efektívna verejná správa



Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR (MV SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): N/A

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)

Alokácia: 251,48 mil. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** bolo k 31.12.2020 na úrovni **206,94 mil. EUR**, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **82,29 %**;
- **čerpanie** bolo k 31.12.2020 na úrovni **107,86 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **42,89 %** celkovej alokácie;

RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 23,40 mil. EUR (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 35,58 mil. EUR)
- × do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 143,61 mil. EUR, t. j. 57,11 % z celkovej alokácie;
- × zo 143 uzavretých zmlúv je zatiaľ iba 14 ukončených projektov.

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA

- ❖ Všetky úlohy k 31.12.2020 sú splnené.



Ministerstvo financií SR

ÚLOHA PRE PODPREDESEDU VLÁDY SR A MINISTRA FINANCIÍ

1. na rokovaní vlády SR dňa 04.11.2020 bolo dohodnuté, že MF SR **vytvorí expertný tím** za účasti Orgánu auditu, riadiacich orgánov a OLAF, prípadne iných orgánov, ktorého úlohou bude preskúmať systém udeľovania korekcií, využitie *lessons learned*, z už udelených korekcií a poučiť sa ako ostatné krajiny využívajú audit aj na preventívne opatrenia.



Opatrenia na eliminovanie dopadov pandémie COVID – 19

Uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 bol schválený materiál “Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandemiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov”, ktorý má vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať. Plánovaná **realokácia 1,25 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF, bola **na základe negociácií s EK znížená na 1,105 mld. EUR**.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: 410,26 mil. EUR (OP ĽZ)
- podporu zdravotníckeho systému: 204,30 mil. EUR (IROP, OP II)
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: 330,20 mil. EUR (OP II)
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: 51,00 mil. EUR (OP KŽP)
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: 109,30 mil. EUR (OP ĽZ)

Stav implementácie COVID opatrení z EŠIF k 31.12.2020:

alokácia	1 105,00 mil. EUR	zmena od 31.10.2020
☐ výzvy	1 116,04 mil. EUR	+ 37,54 mil. EUR
☐ kontrahovanie	968,28 mil. EUR	+ 79,10 mil. EUR
☐ čerpanie	342,86 mil. EUR	+ 8,34 mil. EUR

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je **3. balíček podpory EK – REACT-EU** v celkovej hodnote približne 780 mil. EUR:

- 23.09.2020 schválený materiál na rokovaní vlády SR, ktorý určil **smerovanie podpory na vytváranie a udržanie pracovných miest, poskytovanie soc. služieb, zateplovanie byt. domov, zvýšenie kapacít ZŠ, podporu regiónov, podporu zamestnancov v prvej línii v boji s pandemiou a podporu najodkázanejších osôb**
- MIRRI SR v spolupráci s RO finalizuje negociácie s EK
- Schválenie revízií OP (OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP FEAD) sa očakáva **koncom I.Q 2021** a následne začne vyhlasovanie výziev.



ĎAKUJEME!

www.mirri.gov.sk



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

