

Obsah

I.	Stav implementácie EŠIF k 31.03.2021.....	2
	Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020	2
	Plnenie pravidla N+3.....	8
	Stav implementácie EŠIF v rozdelení podľa rezortov	9
	Stav pozastavení / prerušení platieb.....	12
	Korekcie.....	13
	Závazné plány a krízové riadenie	15
	Zjednodušovanie procesov implementácie.....	18
II.	Stav implementácie jednotlivých programov, riziká a návrh opatrení na ich elimináciu	24
	Riadiace orgány operačných programov	25
	a) Operačný program Integrovaná infraštruktúra	26
	b) Integrovaný regionálny operačný program.....	32
	c) Operačný program Kvalita životného prostredia	37
	d) Program Interreg V-A SK-AT	42
	e) Program Interreg V-A SK-CZ	45
	f) Operačný program Rybné hospodárstvo	48
	g) Operačný program Ľudské zdroje.....	51
	h) Program rozvoja vidieka.....	56
	i) Operačný program Efektívna verejná správa.....	58
III.	Opatrenia na eliminovanie dopadov pandémie COVID – 19	60
	Schválené realokácie a stav implementácie opatrení.....	60
	REACT-EU	63
IV.	Zoznam použitých skratiek	65
V.	Prílohy.....	67
	Príloha 1 Stav implementácie EŠIF k 31.03.2021	67

I. Stav implementácie EŠIF¹ k 31.03.2021

Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020

K 31.03.2021 bolo vo výzvach a vyzvaniach EŠIF alokovaných **19,52 mld. EUR**, čo predstavuje **127,54 %** alokácie programového obdobia 2014 – 2020. Od začiatku roka 2021 sa zvýšila alokácia vo výzvach/vyzvaniach o 446,47 mil. EUR (2,92 p. b.) a od 21.03.2020 sme zaznamenali nárast alokácie vo výzvach/vyzvaniach o 1,79 mld. EUR (11,71 p. b.).

K 31.03.2021 bolo prijatých spolu **30 858 žiadostí o nenávratný finančný príspevok** (ďalej len „ŽoNFP“), z toho 15 768 ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje 51,10 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 24,08 mld. EUR bolo schválených 17,12 mld. EUR, čo predstavuje 71,10 % z požadovanej sumy NFP.

K 31.03.2021 bolo **kontrahovanie** EŠIF na úrovni **12,82 mld. EUR**, čo predstavuje **83,54 %**. Voľné zdroje predstavovali výšku 2,53 mld. EUR t. j. 16,46 % z alokovaných zdrojov na programové obdobie 2014 – 2020. Od začiatku roka 2021 sa zvýšilo kontrahovanie o 429,79 mil. EUR, t. j. o 2,80 p. b.


Od 21.03.2020 sme zaznamenali **nárast kontrahovania o 2,01 mld. EUR**, t. j. 13,15 p. b..

K 31.03.2021 dosiahol **čerpanie** EŠIF z celkového záväzku (15,34 mld. EUR) výšku **6,90 mld. EUR**, čo predstavuje **44,97 %**. **Od začiatku roka 2021** sa zvýšilo čerpanie o **464,95 mil. EUR**, t. j. o 3,03 p. b.

Od 21.03.2020 sme zaznamenali **nárast v čerpaní o 2,02 mld. EUR**, t. j. o 13,18 p. b.

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 9,22 mld. EUR (8,44 mld. EUR + 0,78 mld. EUR – REACT-EU).

Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF do 31.03.2021

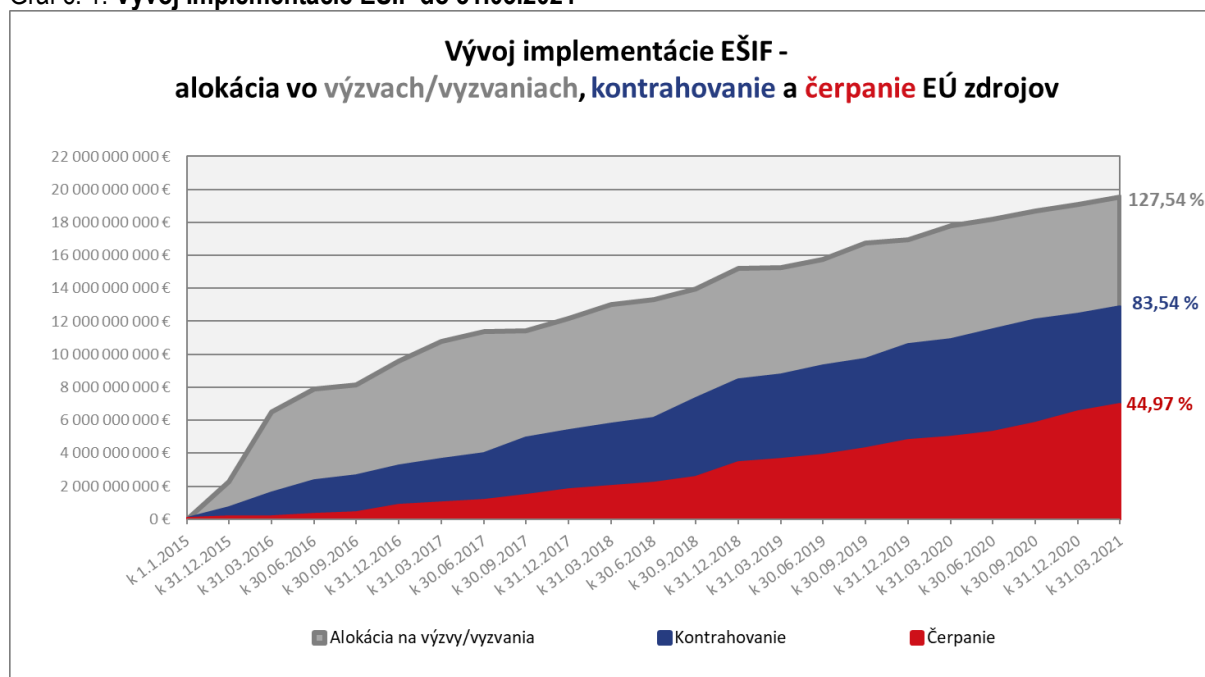

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)

Tabuľka č. 1: Stav implementácie EŠIF k 21.03.2020 a k 31.03.2021 a nárast od 21.03.2020

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 21.03.2020		Stav k 31.03.2021		Nárast od 21.03.2020		
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v %	v p.b.
Výzvy/vyzvania	17 727 452 763	115,83%	19 518 317 792	127,54%	1 790 865 029	10,10%	11,71%
Kontrahovanie	10 801 367 796	70,39%	12 817 694 579	83,54%	2 016 326 784	18,67%	13,15%
Čerpanie	4 877 932 942	31,79%	6 899 392 880	44,97%	2 021 459 938	41,44%	13,18%

Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)

¹ Európske štrukturálne a investičné fondy vrátane Programu rozvoja vidieka


Tabuľka č. 2: Stav implementácie EŠIF k 31.12.2020 a k 31.03.2021 a nárast od 01.01.2021

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 31.12.2020		Stav k 31.03.2021		Nárast od 01.01.2021		
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v %	v p.b.
Výzvy/vyzvania	19 071 851 735	124,62%	19 518 317 792	127,54%	446 466 057	2,34%	2,92%
Kontrahovanie	12 387 903 342	80,74%	12 817 694 579	83,54%	429 791 238	3,47%	2,80%
Čerpanie	6 434 445 265	41,94%	6 899 392 880	44,97%	464 947 615	7,23%	3,03%

Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-A a PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)

Z pohľadu implementácie jednotlivých fondov EÚ k 31.03.2021 medzi najúspešnejšie patria Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky sociálny fond, zaostáva Európsky fond regionálneho rozvoja a dlhodobo najhoršiu implementáciu dosahuje Európsky námorný a rybársky fond.

Graf č. 2: Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 31.03.2021 (v %)

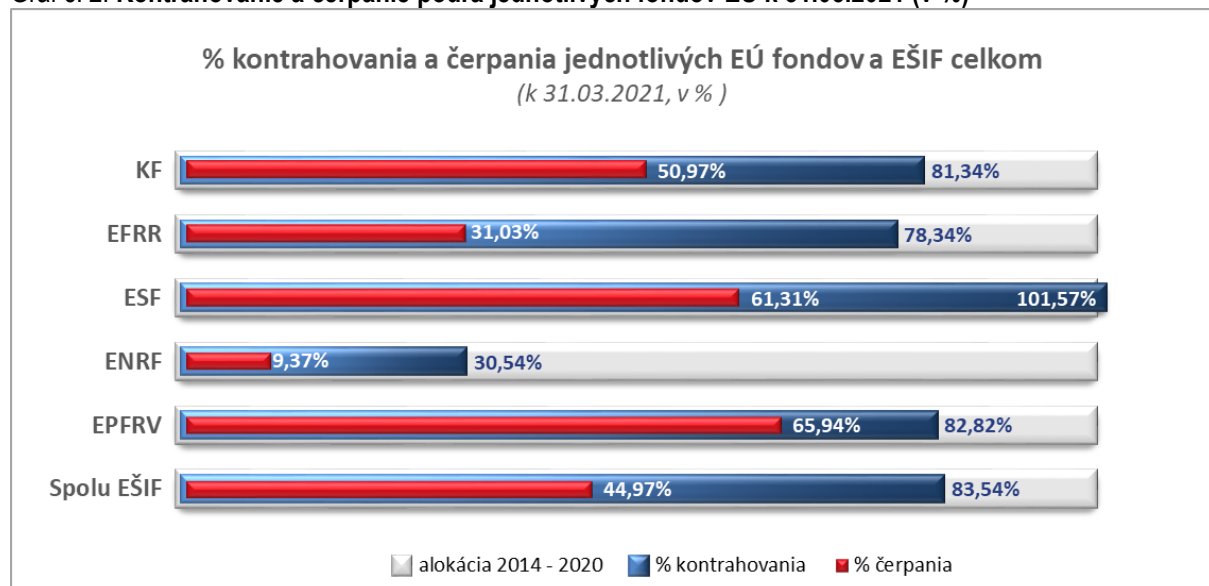

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)

Pozn.: ESF vrátane IZM

Tabuľka č. 3: Prijaté a schválené Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k 31.03.2021

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 – 2020		Prijaté ŽoNFP		Schválené ŽoNFP	
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	žiadaný NFP	počet	schválený NFP
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516	492 163 705	5 223	4 124 069 274	3422	3 572 165 163
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	1 023 408 243	4 181	8 001 802 631	2557	6 238 704 410
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	329 249 335	4 699	5 084 106 352	2304	2 870 812 843
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778	310 981 158	3 555	2 740 836 194	2412	1 938 580 339
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497	47 955 668	302	362 176 703	165	320 242 545
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	28 034 015	237	227 553 089	194	202 767 867
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	3 788 423	79	11 974 030	38	5 612 799
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	6 228 064	524	248 135 787	143	91 122 602
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	3 651 172	84	130 391 393	46	74 421 648
SPOLU EŠIF (bez PRV a PS Interact III)	13 743 970 566	2 245 459 783	18 884	20 931 045 453	11 281	15 314 430 215
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844	539 507 853	11974	3 148 222 146	4487	1 806 353 399
SPOLU EŠIF	15 303 662 410	2 784 967 636	30 858	24 079 267 599	15 768	17 120 783 614

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV a Interreg V-A SK-AT

Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti o podporu neprojektových opatrení. K 31.03.2021 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 53 670 žiadostí a schválených 50 496 žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú a údaje za PS INTERACT III.

K 31.03.2021 bolo spolu prijatých 30 858 ŽoNFP, z toho 15 768 ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje 51,10 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 24,08 mld. EUR bolo schválených 17,12 mld. EUR, čo predstavuje 71,10 % z požadovanej sumy NFP.


Tabuľka č. 4: Stav kontrahovania EŠIF k 31.03.2021 a nárast kontrahovania od 21.03.2020

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020	Kontrahovanie - stav k 31.03.2021		Kontrahovanie - stav k 21.03.2020		Nárast kontrahovania od 21.03.2020		Ostáva nakontrahovať do konca PO
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	p.b.	EÚ zdroj
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516	2 645 850 776	101,25%	2 024 965 344	77,49%	620 885 432	23,76%	-32 684 260
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	5 004 311 943	83,27%	4 094 056 917	68,12%	910 255 025	15,15%	1 005 625 668
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	2 016 683 217	71,20%	1 894 413 158	66,88%	122 270 059	4,32%	815 848 073
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778	1 344 199 776	79,07%	1 200 244 855	70,61%	143 954 921	8,47%	355 742 002
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497	205 515 661	81,72%	202 161 358	80,39%	3 354 303	1,33%	45 960 836
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	133 200 693	83,74%	111 893 199	70,34%	21 307 495	13,39%	25 871 219
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	3 607 141	30,54%	3 261 389	27,61%	345 752	2,93%	8 205 677
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	72 415 001	80,34%	65 904 246	73,11%	6 510 755	7,22%	17 724 462
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	60 812 810	80,13%	50 093 333	66,01%	10 719 477	14,12%	15 079 871
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	39 392 594	100,00%	39 392 594	100,00%	-	-	0
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	11 525 989 611	83,62%	9 686 386 393	70,27%	1 839 603 219	13,35%	2 257 373 549
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844	1 291 704 968	82,82%	1 114 981 403	71,49%	176 723 565	11,33%	267 986 876
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	12 817 694 579	83,54%	10 801 367 796	70,39%	2 016 326 784	13,15%	2 525 360 425

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

K 31.03.2021 bolo kontrahovanie² finančných prostriedkov EŠIF vo výške 12,82 mld. EUR, čo predstavuje 83,54 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje OP ĽZ, PS INTERACT III a OP TP. V porovnaní so stavom k 21.03.2020 dosiahli najväčší percentuálny pokrok v kontrahovaní OP ĽZ, OP II a Interreg V-A SK-AT. Čo sa týka objemu nakontrahovanej sumy, najväčší pokrok dosiahli OP II, OP ĽZ, PRV a IROP.

Graf č. 3: Stav podielu kontrahovania podľa operačných programov k 31.03.2021 s označením zmeny od 21.03.2020

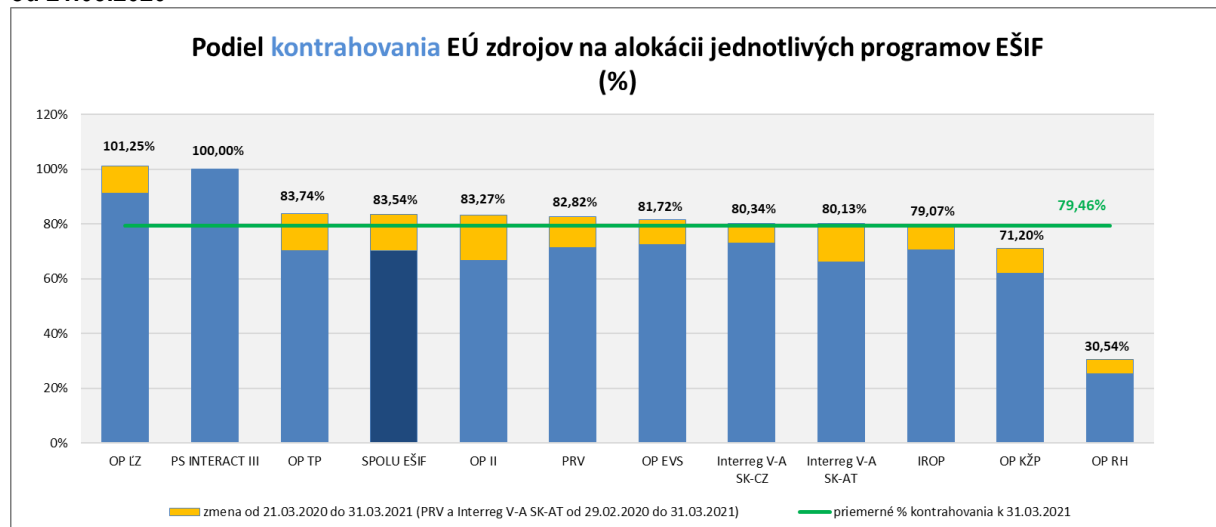

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

² Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.


Čerpanie³ finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.03.2021 vo výške **6,90 mld. EUR, čo predstavuje 44,97 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj). Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP, PRV a OP LZ. **V porovnaní so stavom k 21.03.2021 dosiahli najväčší percentuálny pokrok v čerpaní OP LZ, Interreg V-A SK-CZ a OP TP. Čo sa týka objemu čerpanej sumy, najväčší pokrok dosiahli OP LZ, OP II, KŽP a PRV.**

Tabuľka č. 5: Stav čerpania EŠIF k 31.03.2021 a nárast čerpania od 21.03.2020

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020		Čerpanie EŠIF - stav k 31.03.2021		Čerpanie EŠIF - stav k 21.03.2020		Nárast čerpania od 21.03.2020		Ostáva vyčerpať do konca PO	
									Alokácia 2014 - 2020	REACT-EU
	EÚ zdroj		EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	p.b.	EÚ zdroj	EÚ zdroj
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516		1 552 733 145	59,42%	847 295 496	32,42%	705 437 649	27,00%	1 060 433 371	401 200 000
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV S)	6 009 937 611		2 259 916 626	37,60%	1 764 376 887	29,36%	495 539 738	8,25%	3 750 020 985	-
OP Kvalita životného prostredia (MŽP S)	2 832 531 290		1 199 406 453	42,34%	899 783 923	31,77%	299 622 531	10,58%	1 633 124 837	-
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778		558 442 202	32,85%	380 346 269	22,37%	178 095 933	10,48%	1 141 499 576	246 800 000
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497		111 344 721	44,28%	75 621 239	30,07%	35 723 482	14,21%	140 131 776	108 000 000
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912		115 104 786	72,36%	87 952 293	55,29%	27 152 493	17,07%	43 967 126	-
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818		1 107 219	9,37%	1 041 000	8,81%	66 219	0,56%	10 705 599	-
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463		31 698 233	35,17%	11 261 889	12,49%	20 436 344	22,67%	58 441 230	-
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681		18 058 521	23,79%	7 733 640	10,19%	10 324 881	13,60%	57 834 160	-
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594		23 055 114	58,53%	17 326 343	43,98%	5 728 771	14,54%	16 337 480	-
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160		5 870 867 020	42,59%	4 092 738 978	29,69%	1 778 128 042	12,90%	7 912 496 140	756 000 000
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844		1 028 525 859	65,94%	785 193 963	50,34%	243 331 896	15,60%	531 165 985	-
SPOLU EŠIF	15 343 055 004		6 899 392 880	44,97%	4 877 932 942	31,79%	2 021 459 938	13,18%	8 443 662 124	756 000 000
OP FEAD										24 000 000
SPOLU REACT-EU										780 000 000

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 4: Stav podielu čerpania podľa operačných programov k 31.03.2021 s označením zmeny od 21.03.2020

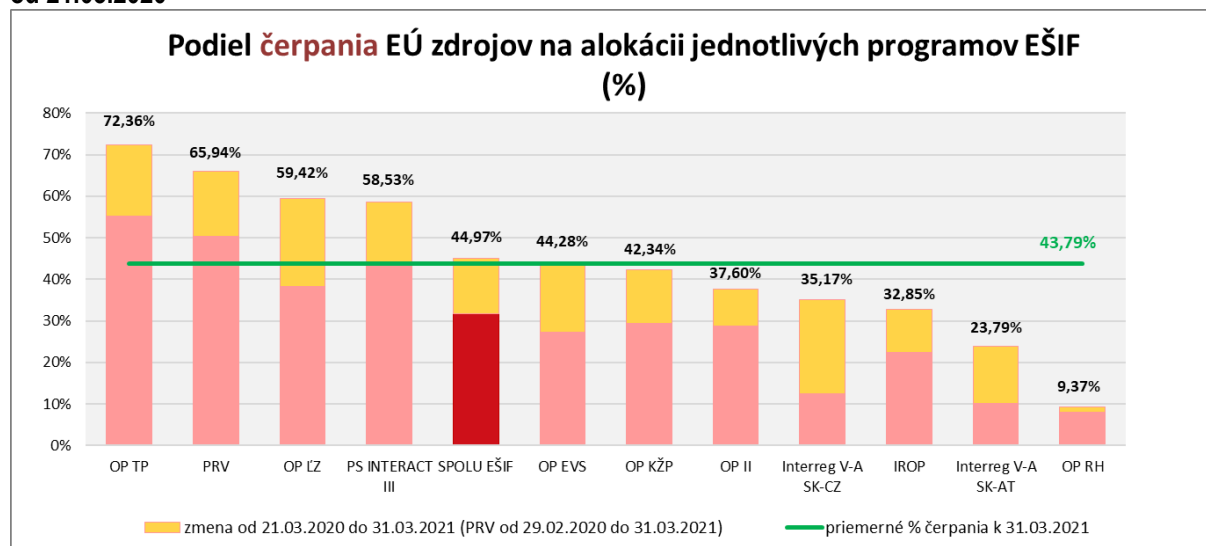

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

³ Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).


Pokiaľ ide o implementáciu EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 31.03.2021 evidujeme najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v **Žilinskom, Prešovskom a Košickom** samosprávnom kraji. Keďže jednotlivým krajom neboli pridelené alokácie, uvedený údaj predstavuje konštatovanie, v akom objeme sa realizujú projekty financované z fondov EÚ na území daného kraja, to znamená, že **okrem dopytovo-orientovaných projektov vstupujú do tejto štatistiky aj napr. veľké dopravné infraštruktúrne projekty implementované na území kraja (diaľnice, železnice, rýchlostné cesty,..).**

Tabuľka č. 6: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 31.03.2021

Samosprávny kraj	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	podiel z kontrahovanej sumy za všetky kraje	Čerpanie (EÚ zdroj)	podiel z čerpanej sumy za všetky kraje
Žilinský	1 987 599 449	21%	1 126 665 330	26%
Prešovský	1 534 915 405	16%	572 768 691	13%
Košický	1 316 024 047	14%	680 382 187	16%
Trenčiansky	1 310 235 918	14%	568 977 400	13%
Banskobystrický	1 175 343 594	12%	484 608 675	11%
Nitriansky	984 975 084	10%	410 185 185	9%
Trnavský	805 248 672	8%	294 502 367	7%
Bratislavský	485 727 100	5%	197 861 843	5%
SPOLU VŠETKY KRAJE	9 600 069 269	100%	4 335 951 678	100%

Zdroj: ITMS2014+


Graf č. 5: Implementácia EŠIF podľa krajov

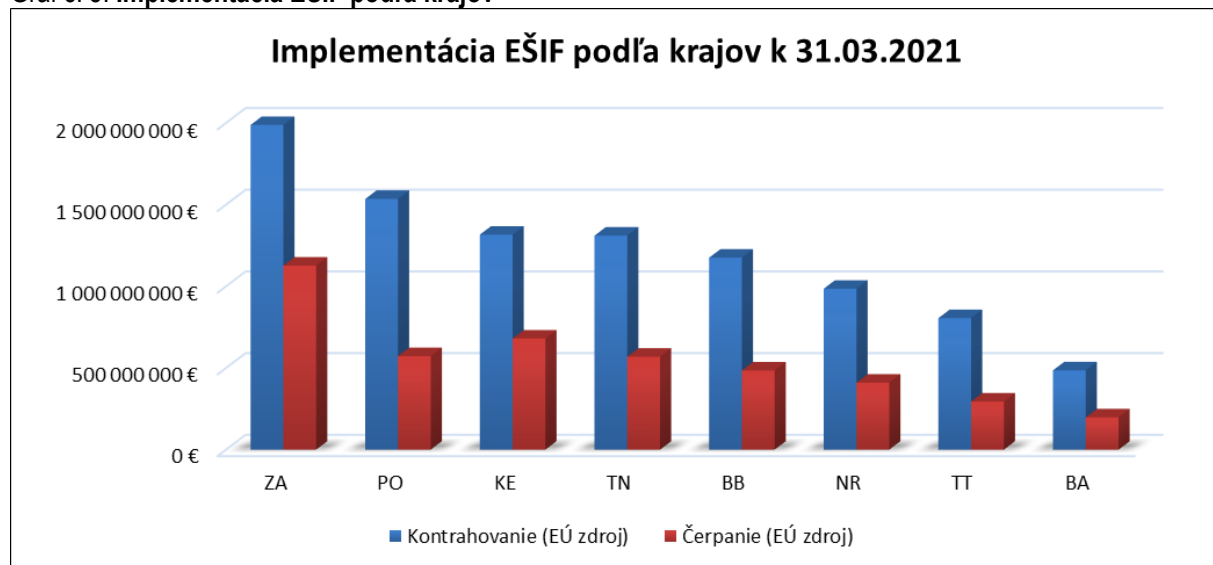

Zdroj: ITMS2014+


Z celkového počtu **14 198 zazmluvnených projektov EŠIF** bolo k 31.03.2021 riadne **ukončených** a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom **5 016 projektov** v rámci 9 OP, čo predstavuje **35,33 %**. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP KŽP, OP II, IROP a OP LZ.

Graf č. 6: Počet ukončených projektov za jednotlivé programy k 31.03.2021

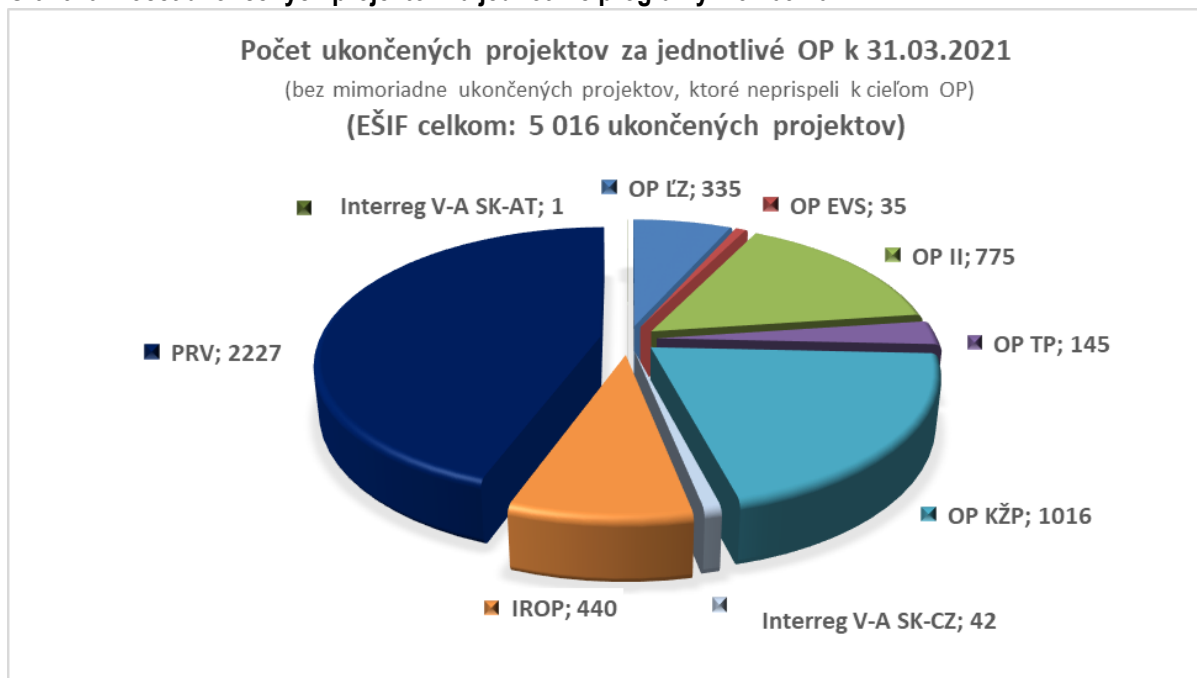

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV a Interreg V-A SK-AT

Graf č. 7: Podiel jednotlivých typov projektov na celkovom čerpaní EŠIF (schválené súhrnné žiadosti o platbu) k 31.03.2021

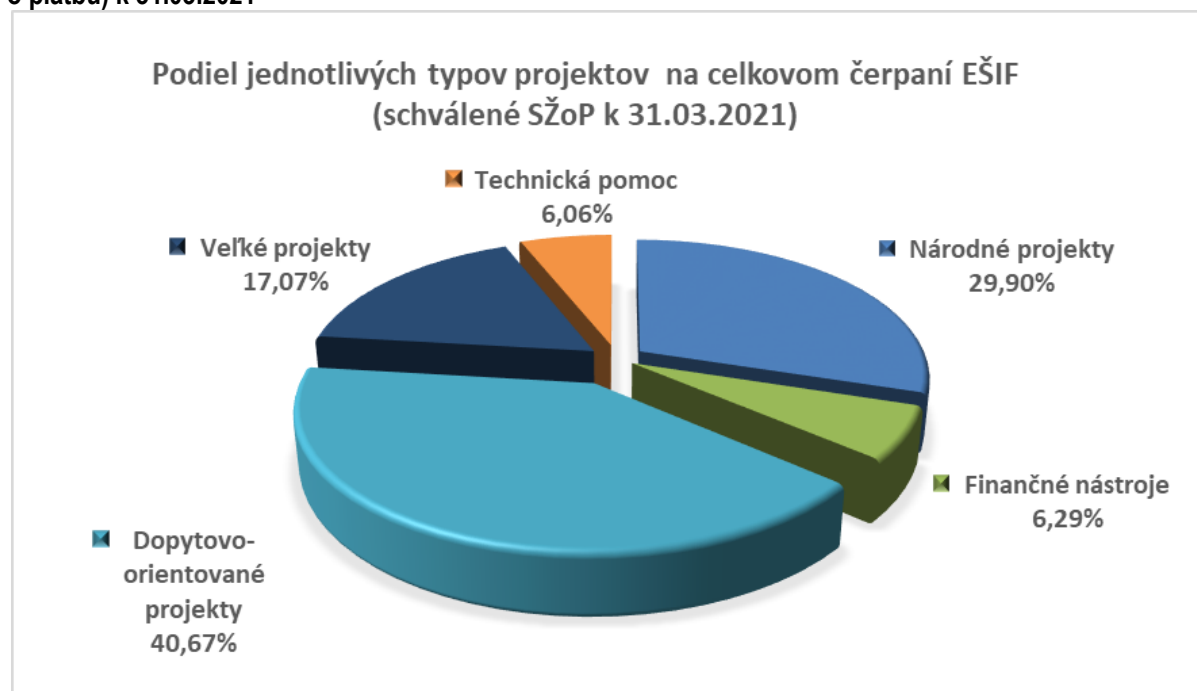

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV

Plnenie pravidla N+3

Pravidlo N+3 bolo v roku 2020 splnené pre všetky OP okrem OP Rybné hospodárstvo, v rámci ktorého bude uplatnené automatické zrušenie viazanosti (decommitment) **vo výške od 1,50 - 2,24 mil. EUR** (v závislosti od stanoviska EK ohľadom udelenia výnimky podľa čl. 87 všeobecného nariadenia týkajúcej sa zrušenia viazanosti časti záväzku z dôvodu vyššej moci).


V roku 2021 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 predložiť a schváliť na certifikačnom orgáne (pre PRV predložiť na EK) spolu za EŠIF 1,20 mld. EUR, pričom 3 programy už naplnili pravidlo N+3 (OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III). K 31.03.2021 **zostáva ešte predložiť a schváliť na certifikačnom orgáne (pre PRV predložiť na EK) sumu 928,27 mil. EUR**. Najvyššie objemy je potrebné ešte čerpať v rámci OP II, OP KŽP a IROP.

Tabuľka č. 7: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v rokoch 2021 – 2024 za EŠIF k 31.03.2021

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) v roku 2023 a 01-03/2024 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 03/2024 pre splnenie pravidla N+3 (kumulatívne)
	EÚ zdroj	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516	0	0	924 776 673	924 776 673
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	383 450 167	783 812 834	2 759 601 488	3 926 864 488
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	246 630 226	405 124 207	1 030 504 833	1 682 259 266
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778	164 234 086	219 727 722	732 514 841	1 116 476 650
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497	12 219 143	35 927 146	84 842 154	132 988 444
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	0	0	43 962 975	43 962 975
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	1 925 227	1 940 008	5 220 587	9 085 822
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	6 614 106	15 820 942	36 654 347	59 089 395
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	11 403 511	13 320 399	30 580 686	55 304 596
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	0	503 556	15 833 924	16 337 480
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	826 476 466	1 476 176 814	5 664 492 507	7 967 145 788
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844	101 796 838	214 844 203	215 524 943	532 165 984
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	928 273 304	1 691 021 017	5 880 017 450	8 499 311 772

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 8: Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV predložiť na EK) pre splnenie pravidla N+3 v roku 2021 za jednotlivé OP (okrem programov, ktoré už splnili toto pravidlo pre rok 2021) k 31.03.2021

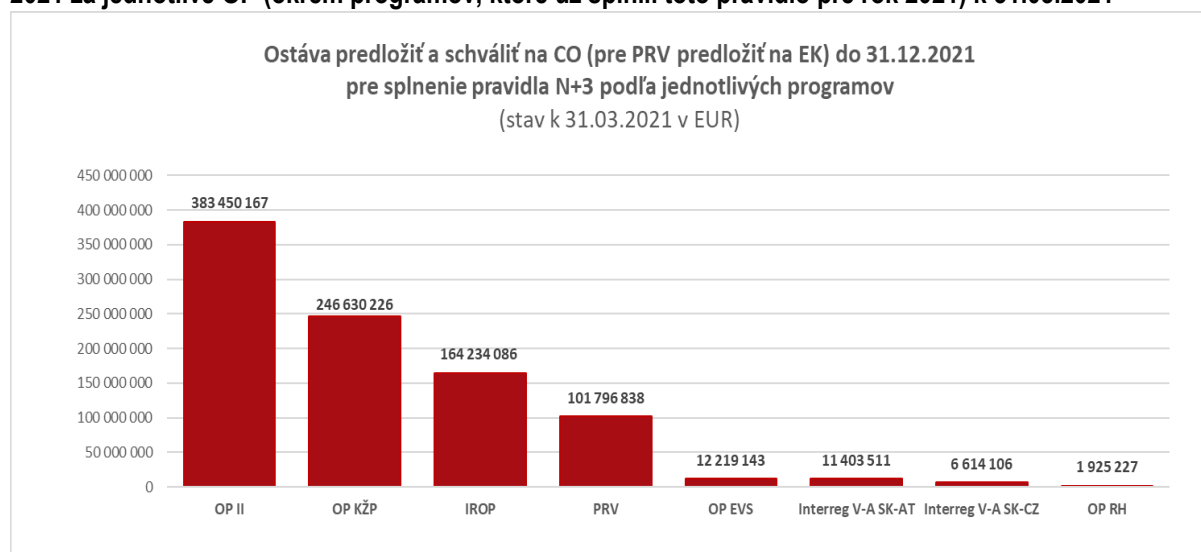

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Stav implementácie EŠIF v rozdelení podľa rezortov

Za implementáciu OP je zodpovedný riadiaci orgán (RO), ktorý však môže delegovať právomoci pre implementáciu niektorej časti OP na sprostredkovateľský orgán (SO). Nasledovná tabuľka sumarizuje rozdelenie zodpovednosti za implementáciu OP medzi rezorty, s priradením zodpovedajúcej alokácie ako aj aktuálneho stavu kontrahovania a čerpania pridelennej alokácie.


Tabuľka č. 8: **Prehľad alokácie, kontrahovania a čerpania jednotlivých OP podľa RO a SO k 31.03.2021 (bez prioritných osí týkajúcich sa technickej pomoci)**

Operačný program	RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	% kontrahovania	% čerpania
OP Ľudské zdroje	RO - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	1 803 163 050	106,74%	70,76%
	SO - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	348 741 004	93,60%	30,99%
	SO - Ministerstvo vnútra SR	382 662 462	83,35%	29,62%
	OP Ľudské zdroje celkom	2 534 566 516	101,25%	59,42%
OP Integrovaná infraštruktúra	RO - Ministerstvo dopravy a výstavby SR	3 270 976 947	80,53%	45,51%
	SO - Ministerstvo hospodárstva SR	1 253 146 311	88,78%	33,58%
	SO - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	676 940 302	88,85%	20,03%
	SO - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	651 874 051	78,55%	17,93%
	OP Integrovaná infraštruktúra celkom	5 852 937 611	83,27%	36,60%
OP Kvalita životného prostredia	RO - Ministerstvo životného prostredia SR	1 749 102 442	65,46%	40,72%
	SO - Ministerstvo hospodárstva SR	787 772 813	82,75%	48,01%
	SO - Ministerstvo vnútra SR	218 656 035	72,36%	25,30%
	OP Kvalita životného prostredia celkom	2 755 531 290	68,26%	42,34%
Integrovaný regionálny OP	RO - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vrátane 8 VUC a 8 krajských miest ako SO	1 182 503 747	81,96%	34,87%
	SO - Ministerstvo zdravotníctva SR	333 310 470	65,32%	34,68%
	SO - Ministerstvo kultúry SR	122 127 561	90,75%	11,88%
	OP Integrovaný regionálny operačný program celkom	1 637 941 778	79,07%	32,85%
OP Efektívna verejná správa	RO - Ministerstvo vnútra SR	238 338 525	80,96%	43,50%
OP Technická pomoc	RO - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	159 071 912	83,74%	72,36%
OP Rybné hospodárstvo	RO - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	10 875 718	29,07%	8,28%
Program spolupráce V-A SK-CZ	RO - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	84 731 096	79,66%	34,24%
Program spolupráce V-A SK-AT	RO - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	71 339 121	79,04%	22,34%
Program spolupráce INTERACT III	RO - Bratislavský samosprávny kraj	37 265 300	100,00%	58,62%
Program rozvoja vidieka	RO - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	1 500 400 054	82,93%	66,84%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III


Viacere rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti v zmysle kompetenčného zákona podieľajú a sú zodpovedné či už ako RO alebo SO za implementáciu celého alebo časti OP. Nasledovné grafy poskytujú prehľad o stave kontrahovania a čerpania celej alokácie, ktorej implementáciu zabezpečuje príslušný rezort, ako aj prehľad objemov finančných prostriedkov, ktorých čerpanie je potrebné zabezpečiť za jednotlivé rezorty do konca programového obdobia 2014 – 2020.

Graf č. 9: Prehľad stavu kontrahovania celkovej alokácie, ktorá je v zodpovednosti jednotlivých rezortov (bez prioritných osí týkajúcich sa technickej pomoci) k 31.03.2021

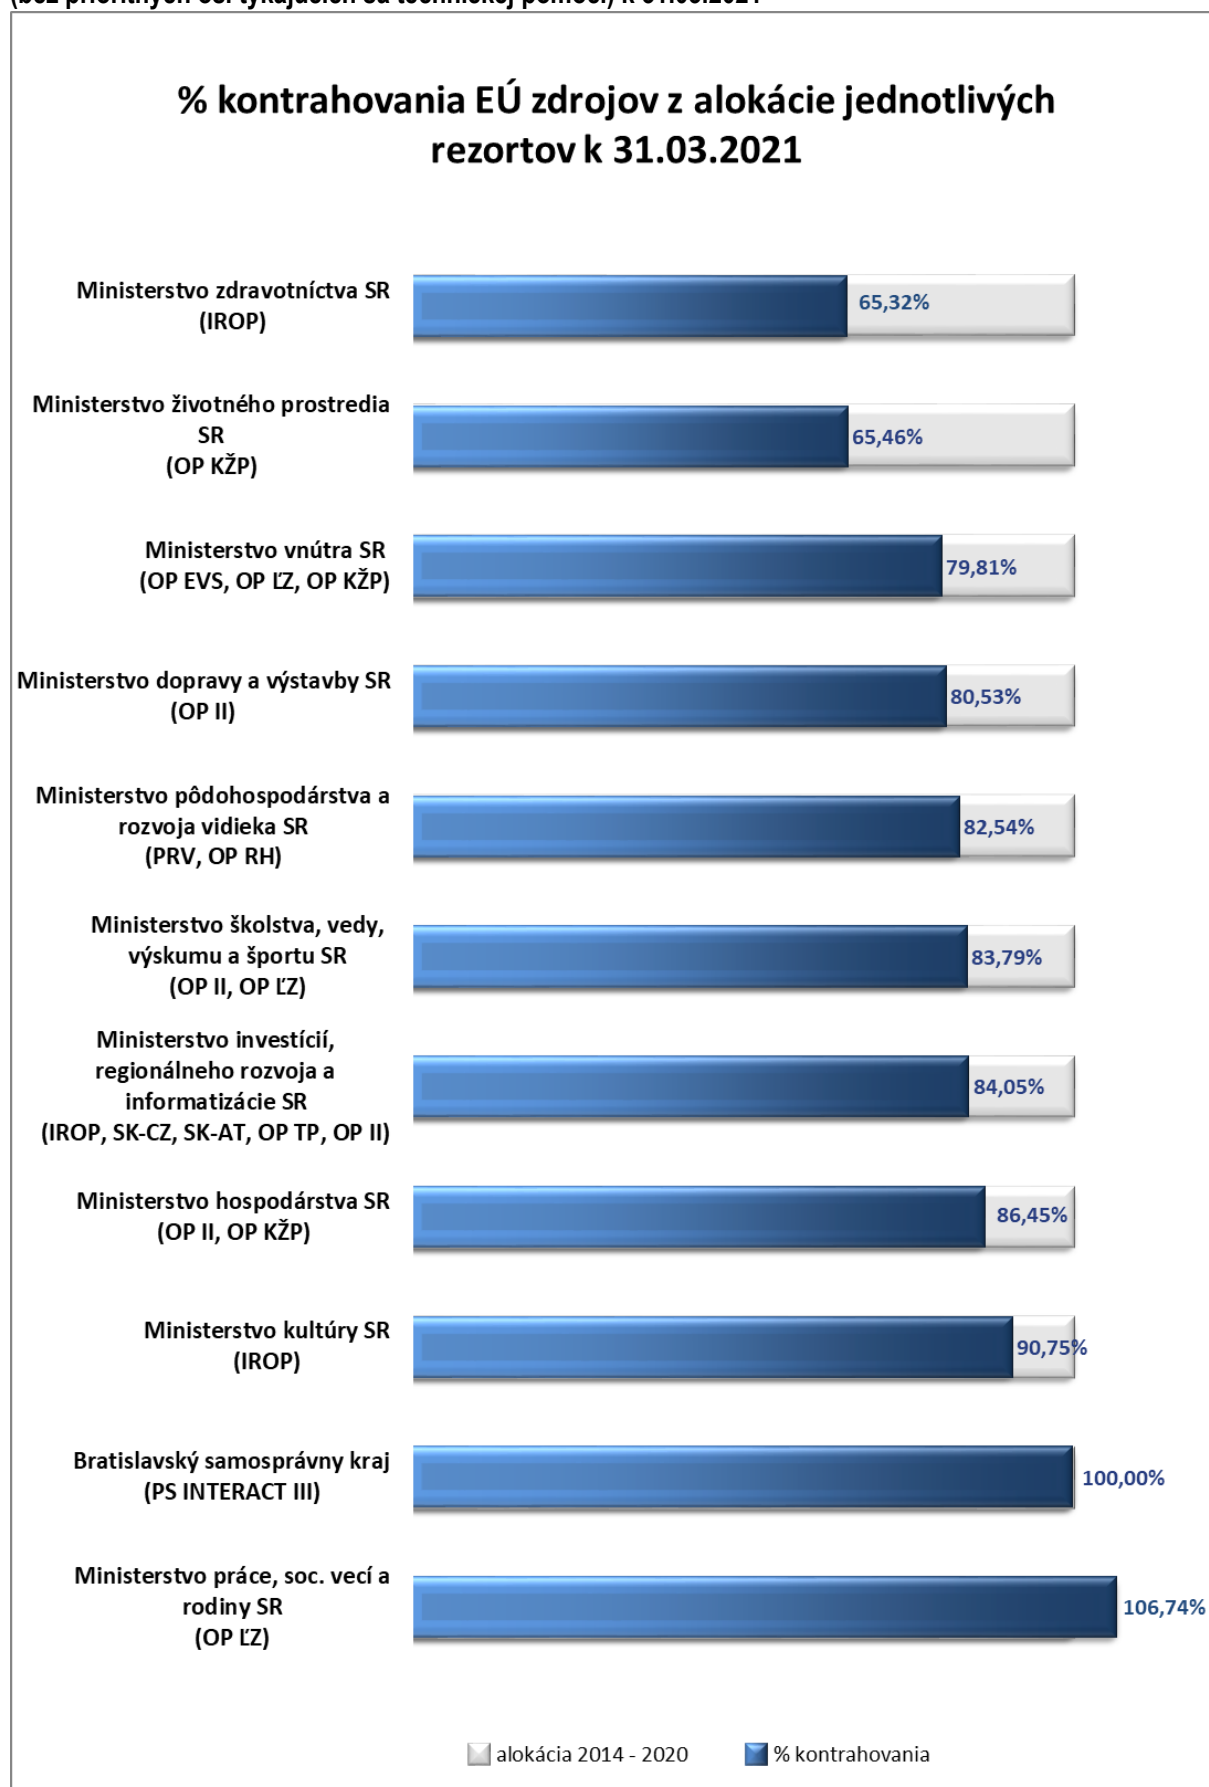


Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Graf č. 10: Prehľad stavu čerpania celkovej alokácie, ktorá je v zodpovednosti jednotlivých rezortov (bez prioritných osí týkajúcich sa technickej pomoci) k 31.03.2021

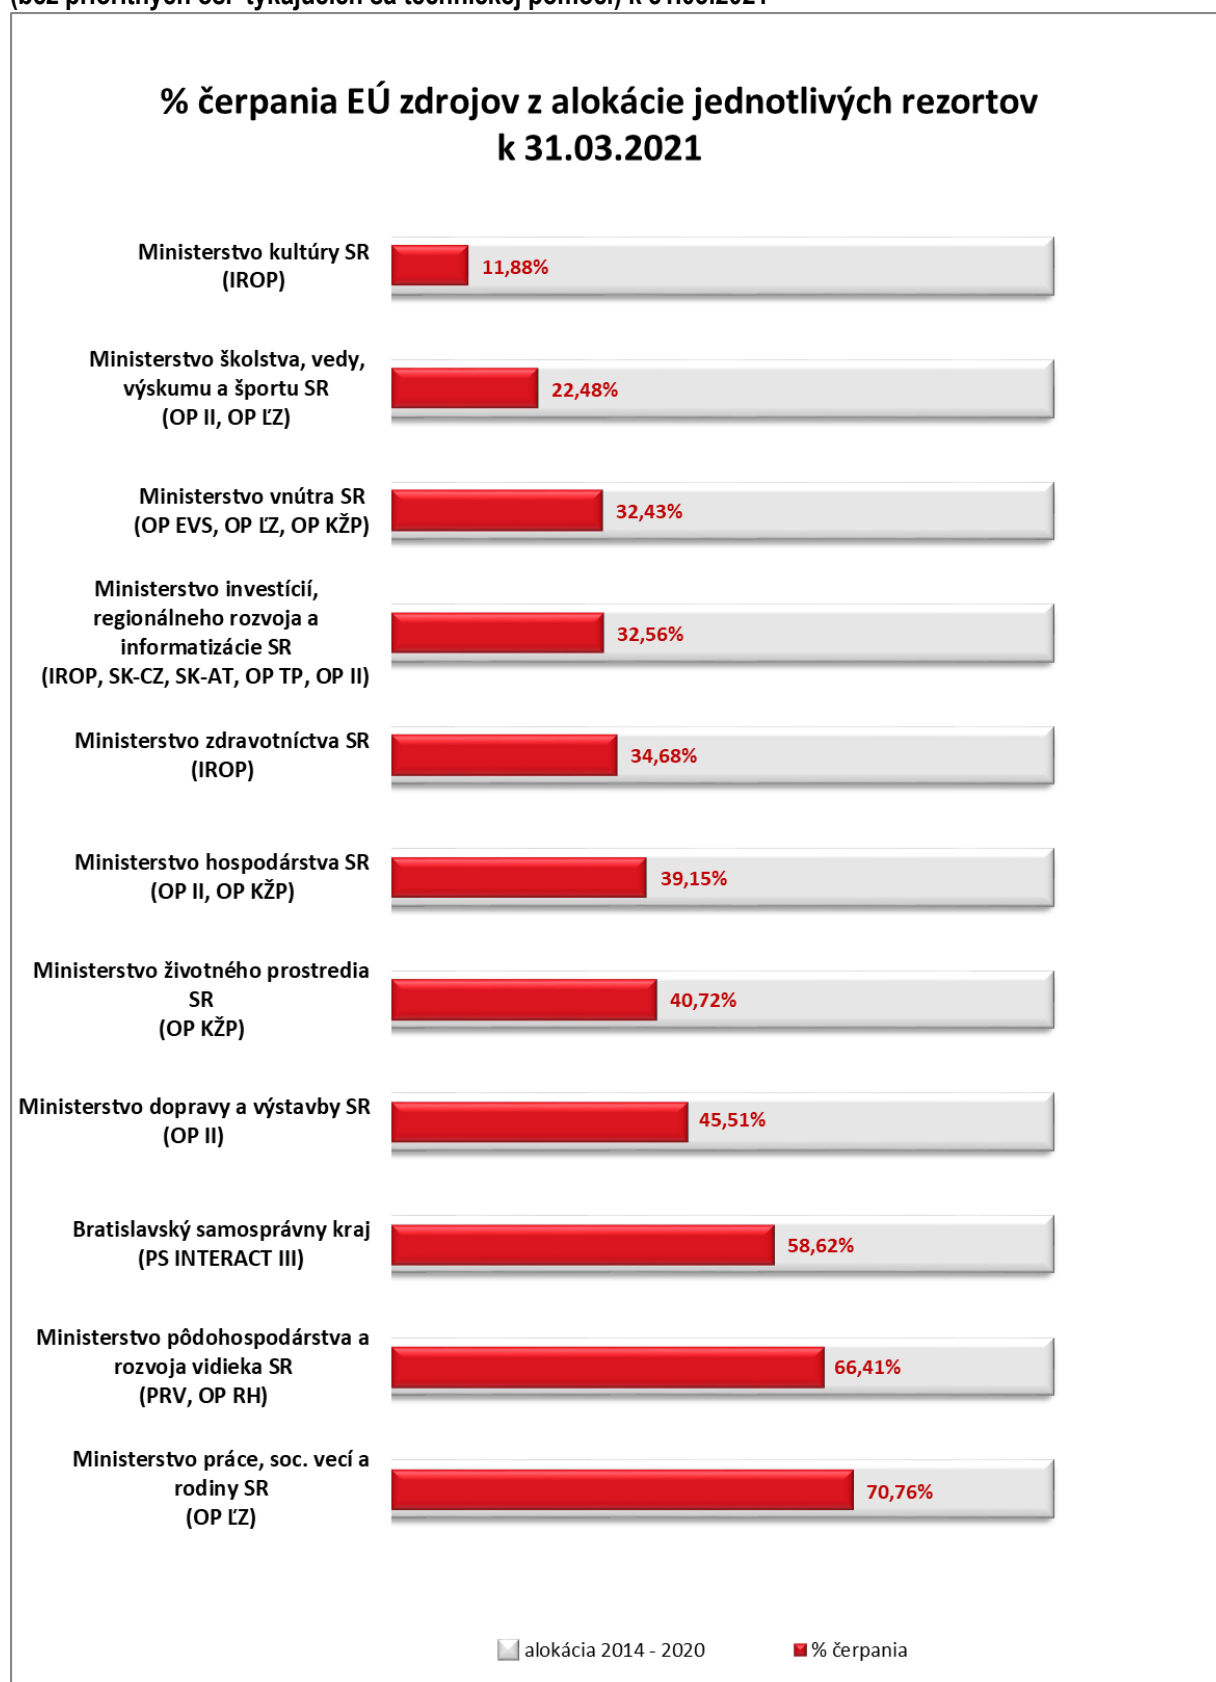

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 11: Prehľad súm, ktoré je potrebné vyčerpať do konca programového obdobia 2014 – 2020 za jednotlivé rezorty s vyznačením navýšenia v súvislosti s dodatočnou alokáciou z REACT-EU (bez prioritných osí týkajúcich sa technickej pomoci)

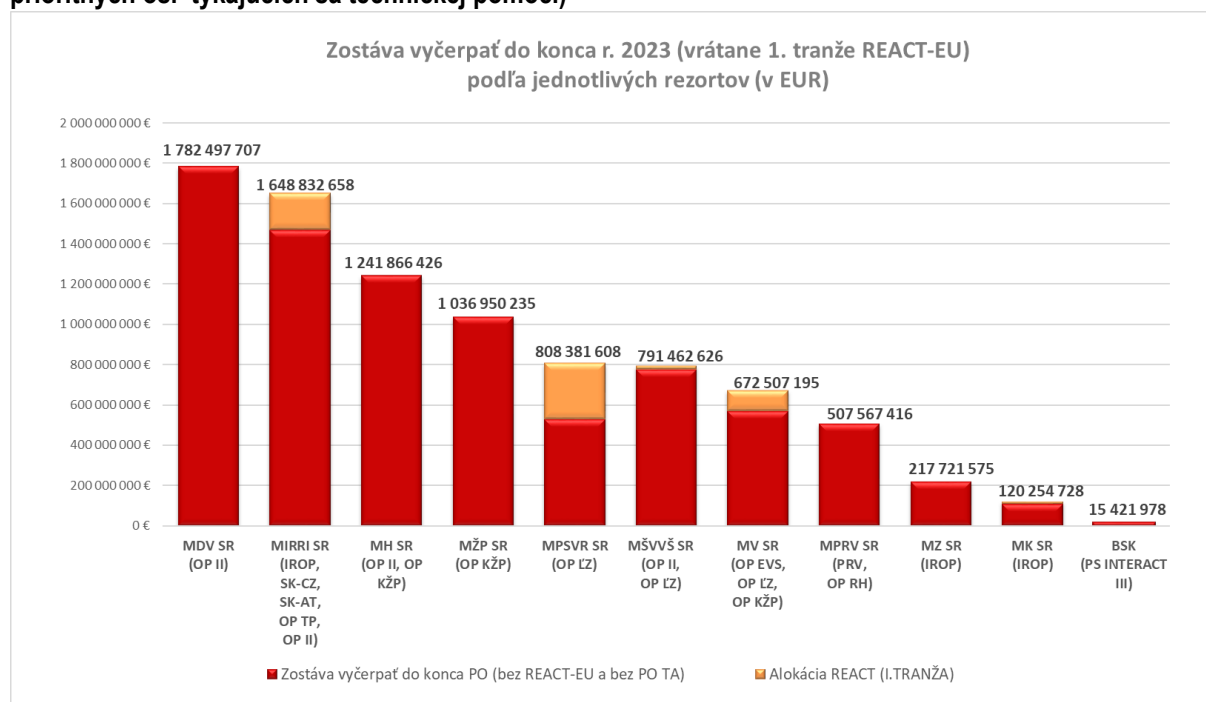

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV

Stav pozastavení / prerušení platieb

V priebehu roku 2019 – 2020 boli doručené varovné listy Európskej komisie na možné prerušenie lehoty na platbu celkovo za 4 operačné programy a v rámci 1 operačného programu Európska komisia zaslala list k prerušeniu lehoty na platby. Varovné listy sú za 4 operačné programy z toho 1 za OP Ľudské zdroje, 3 za OP Integrovaná infraštruktúra, 1 za OP Kvalita životného prostredia a 2 za Integrovaný regionálny operačný program.

V januári 2020 **EK prerušila lehoty na úhradu platieb v rámci OP Rybné hospodárstvo**, v septembri 2020 Európska komisia upozornila na riziko začatia procedúry pozastavenia platieb, vzhľadom k tomu, že neboli prijaté adekvátne nápravné opatrenia na zlepšenie systému riadenia a kontroly.

Voči stavu z marca 2020 sa stav v ďalších operačných programoch ku konca roku 2020 zmenil nasledovne.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bolo v januári 2021 doručené zrušenie varovného listu s tým, že po analýze prijatých odpovedí vnútroštátnych orgánov SR z 01.07.2020 a 30.09.2020 k varovnému listu z 19.02.2020 požadujúcim vykonanie nápravných opatrení pre Integrovaný regionálny OP, boli podmienky na zrušenie varovania splnené. Výdavky je možné deklarovať na EK. **Stav sa oproti marcu 2020 zlepšil - varovanie bolo ukončené.**

Za OP Integrovaná infraštruktúra bola v rámci prijatia nápravných opatrení za zníženú funkčnosť riadiaceho a kontrolného systému vo vzťahu ku kontrole verejného obstarávania vykomunikovaná výška korekcie 4,34 % za výdavky od 01.04.2019 do 31.03.2020, ktoré neboli predmetom spätného overenia VO a následne boli výdavky deklarované na Európsku komisiu, resp. upravené v Účtoch, pričom riadiaci orgán zlepšil postupy kontroly a prijal adekvátne opatrenia na zlepšenie kontrolného systému. **Celkovo sa stav oproti marcu 2020 zlepšil.**

Za OP Ľudské zdroje bola v rámci prijatia nápravných opatrení za zníženú funkčnosť riadiaceho a kontrolného systému na Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo vzťahu k neprekrývaniu sa výdavkov s Európskou komisiou vykomunikovaná výška korekcie 16,9 % za výzvy spochybnené auditom a základňa na jej výpočet, následne boli výdavky upravené v Účtoch, pričom riadiaci orgán prijal adekvátne opatrenia na zlepšenie kontrolného systému. **Stav oproti marcu 2020 sa zlepšil - varovanie bolo ukončené** (26.03.2021 bol zo strany EK zaslaný Lifting letter).

Nadalej zostávajú otvorené zistenia z auditov EK v rámci OP Integrovaná infraštruktúra a OP Kvalita životného prostredia týkajúce sa kartelovej dohody stavebných firiem (BETAMONT s.r.o., Zvolen; STRABAG, a.s., Praha 5, Česká republika; Doprastav, a.s., Bratislava; Inžinierske stavby, a.s., Košice (od 05.06.2019 COLAS Slovakia, a. s.); Skanska DS, a.s., Brno, Česká republika (od 01.01.2010 Skanska, a.s. so sídlom v Prahe) a/alebo MOTA – ENGIL, ENGENHARIE E CONSTRUCAO, S.A., Amarante, Portugalsko) a ich účasti na verejných obstarávaníach v čase od 20.03.2014 do 08.02.2015 a od 13.01.2017 do 21.02.2019, ktoré môžu mať vplyv na výdavky za OP Kvalita životného prostredia, OP Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program a Interreg V-A SK-CZ.

Korekcie

K 26.03.2021 SR trvalo uplatnila finančné opravy v celkovej výške **1,27 mld. EUR**, z toho **1,06 mld. EUR** za programové obdobie 2007 – 2013 a **208,59 mil. EUR** za programové obdobie 2014 – 2020. V rámci čerpaných a deklarovaných výdavkov na EK tento podiel uplatnených finančných opráv predstavuje úroveň **7,95 %** v rámci programového obdobia 2007 – 2013 a úroveň **3,07 %** v rámci programového obdobia 2014 – 2020, v rámci ktorého sa Slovenská republika v 7. roku implementácie nachádza na úrovni čerpania 41,86 % z celkovej alokácie v objeme 13,78 mld. EUR. Bilancia čerpania výdavkov a uplatňovaných korekcií sa v programovom období 2014 – 2020 sleduje podľa tzv. účtovných rokov, čo pre **aktuálne prebiehajúci 7. účtovný rok zodpovedá obdobiu od 01.05.2020 do 30.04.2021 na úrovni žiadostí o platbu predkladaných certifikačným orgánom (MF SR) na EK.**

V rámci programového obdobia **2014 – 2020** boli k 26.03.2021 z deklarovaných výdavkov na EK odpočítané sumy v celkovej výške **581,40 mil. EUR** (505,19 mil. EUR za EÚ zdroj), pričom z tejto sumy SR **trvalo uplatnila** finančné opravy v celkovej sume **208,59 mil. EUR** (177,25 mil. EUR za EÚ zdroj). Z uvedenej sumy **208,59 mil. EUR** priamy dopad na rozpočet SR majú nezrovnalosti evidované na dlžníkov ministerstvá (riadiace orgány/ sprostredkovateľské orgány) v celkovej výške **141,7 mil. EUR** (120,8 mil. EUR za EÚ zdroj), z ktorých k dnešnému dňu **124,6 mil. EUR** (106 mil. EUR za EÚ zdroj) stále nie je zaplatených zo strany dlžníkov, jednotlivých ministerstiev. Zostatok odpočítanej sumy z deklarovania výdavkov na EK predstavujú rizikové výdavky v celkovej výške **372,81 mil. EUR** (327,95 mil. EUR za EÚ zdroj), ku ktorým nebolo ukončené skúmanie ich zákonnosti a oprávnenosti na základe zistení auditov EK alebo národných kontrol/auditov, a to z dôvodu podozrení z porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, nehospodárnosti výdavkov, konfliktu záujmov alebo porušení hospodárskej súťaže.

Zo sumy trvalo uplatnených finančných opráv voči rozpočtu EÚ v celkovej sume **208,59 mil. EUR** (177,25 mil. EUR za EÚ zdroj) vykazuje najvyššiu sumu **OP Integrovaná infraštruktúra** vo výške **163,68 mil. EUR** (138,83 mil. EUR za EÚ zdroj) a **OP Ľudské zdroje** vo výške **25,76 mil. EUR** (21,95 mil. EUR za EÚ zdroj). Z pohľadu vecného porušenia a časovej línie, **kedy a akými činnosťami** boli dotknuté nezrovnalosti za trvalo uplatnené korekcie a dočasne vylúčené rizikové výdavky v sume **581,40 mil. EUR** (502,20 EUR za EÚ zdroj) spôsobené, ide najmä o činnosti a úkony súvisiace s priebehom verejného obstarávania (napr. umelé rozdeľovanie zákaziek, diskriminačné podmienky), procesom overovania hospodárnosti výdavkov, konfliktu záujmov, porušení hospodárskej súťaže (kartel) a netransparentným hodnotiacim a výberovým procesom projektov **za obdobie rokov 2015 až 2019, tzn. počas predchádzajúcej vlády, kedy v roku 2015 sa spustila praktická implementácia projektov a bolo vykázané prvé čerpanie finančných prostriedkov za programové obdobie 2014 – 2020.**

Z hľadiska prekročenia prípustnej 2 % miery chybovosti systému riadenia a kontroly operačného programu vysoký podiel trvalo uplatnených finančných opráv na čerpaných výdavkoch predstavuje **OP Rybné hospodárstvo na úrovni 13,60 %** a **OP Integrovaná infraštruktúra na úrovni 8,32 %**.

Tabuľka č. 9: **Prehľad trvalo stiahnutých finančných opráv a dočasne vylúčených rizikových výdavkov z deklarovania podľa operačných programov k 26.03.2021**

Operačný program	Vykázané a uplatnené korekcie voči rozpočtu EÚ			Dočasne vylúčené rizikové výdavky z deklarovania voči rozpočtu EÚ			Podiel uplatnených korekcií z čerpania	Podiel dočasne vylúčených výdavkov z čerpania	Podiel uplatnených korekcií a dočasne vylúčených výdavkov z čerpania
	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	EÚ	EÚ
OP INTERACT III	36 179,33	6 384,61	42 563,94	0,00	0,00	0,00	0,16%	0,00%	0,16%
OP Technická pomoc	2 208 814,41	482 356,31	2 691 170,72	0,00	0,00	0,00	1,94%	0,00%	1,94%
Integrovaný regionálny OP	5 497 806,84	1 035 896,24	6 533 703,08	5 060 563,41	626 640,02	5 687 203,43	0,96%	0,88%	1,84%
OP Rybné hospodárstvo	150 616,92	24 782,34	175 399,26	0,00	0,00	0,00	13,60%	0,00%	13,60%
Interreg V-A SK-CZ	430 534,23	28 667,39	459 201,62	0,00	0,00	0,00	1,52%	0,00%	1,52%
Interreg V-A SK-AT	98 331,46	3 754,86	102 086,32	0,00	0,00	0,00	0,54%	0,00%	0,54%
OP Kvalita životného prostredia	4 892 748,15	588 894,37	5 481 642,52	61 379 354,98	4 021 669,00	65 401 023,98	0,41%	5,17%	5,58%
OP Ľudské zdroje	21 952 560,93	3 804 479,84	25 757 040,77	5 051 556,71	1 020 257,25	6 071 813,96	1,50%	0,34%	1,84%
OP Efektívna verejná správa	331 411,45	89 875,32	421 286,77	275,86	57,64	333,50	0,30%	0,00%	0,30%
OP Integrovaná infraštruktúra	138 831 392,53	24 850 558,00	163 681 950,53	218 474 965,41	38 554 405,66	257 029 371,07	8,32%	13,10%	21,42%
OP Výskum a inovácie	2 815 970,66	426 680,61	3 242 651,27	37 981 120,03	640 462,46	38 621 582,49	0,49%	6,55%	7,04%
OP Integrovaná infraštruktúra (vrátane OP Val)	141 647 363,19	25 277 238,61	166 924 601,80	256 456 085,44	39 194 868,12	295 650 953,56	6,30%	11,41%	17,71%
SPOLU	177 246 366,91	31 342 329,89	208 588 696,80	327 947 836,40	44 863 492,03	372 811 328,43	3,07%	5,68%	8,76%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

V rámci programového obdobia **2007 – 2013** SR k 31.03.2021 uplatnila finančné opravy v celkovej výške **1,06 mld. mld. EUR** (889 mil. EUR za EÚ zdroj), z toho finančné opravy za systémové pochybenia riadiacich orgánov vo výške **607 mil. EUR** (506 mil. EUR za EÚ zdroj), z ktorých k dnešnému dňu **2,8 mil. EUR** (2,5 mil. EUR za EÚ zdroj) nie je zaplatených zo strany ministerstiev. **Po nástupe novej vlády v marci 2020** Ministerstvo financií SR zabezpečilo finančné zdroje zo štátneho rozpočtu (finančné prostriedky daňových poplatníkov) a v priebehu mesiacov septembra až decembra 2020 **minister financií schválil úhradu vysporiadania korekcií za jednotlivé ministerstvá** (dlžníkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán) v celkovej výške **363 mil. EUR**.

Zo sumy uplatnených finančných opráv voči rozpočtu EÚ v celkovej sume **1,06 mld. EUR** (889 mil. EUR za EÚ zdroj) vykazuje najvyššiu sumu **OP Doprava** vo výške **434,53 mil. EUR** (363,40 mil. EUR za EÚ zdroj) a **OP Výskum a vývoj** vo výške **134,29 mil. EUR** (117 mil. EUR za EÚ zdroj).

Časť finančných opráv vzniká aj vo fáze ukončovania programov programového obdobia 2007 – 2013 z dôvodu fázovania veľkých projektov, kedy na základe zistení z programového obdobia 2014 – 2020 sa zodpovedajúcim podielom musia preniesť tieto „nové“ zistenia a z časti aj „nové prísnejšie prístupy“ k uplatňovaniu finančných opráv aj na výdavky predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013.

Za všetkých 14 OP boli na EK zaslané podklady k predbežnému ukončeniu operačného programu. V rámci 14 OP sú 2 OP, ktoré sú už uzatvorené s EK. Ide o OP INTERACT II a OP Rybné hospodárstvo. Návrh na predbežné ukončenie OP bol z EK zaslaný za všetky OP s výnimkou OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré sú aktuálne predmetom bilančnej analýzy s EK.

Tabuľka č. 10: **Prehľad uplatnených korekcií s finančným dopadom na rozpočet EÚ za programové obdobie 2007 – 2013**

Operačný program	Vykázané a uplatnené korekcie voči rozpočtu EÚ			Rizikové výdavky s prebiehajúcim šetrením na národnej úrovni/zo strany EK			Podiel uplatnených korekcií z čerpania	Podiel rizikových výdavkov z čerpania	Podiel uplatnených korekcií a rizikových výdavkov z čerpania
	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	EÚ	EÚ
OP Informatizácia spoločnosti	96 188 058,85	30 325 842,68	126 513 901,53	15 821 688,56	5 187 060,12	21 008 748,68	11,83%	1,95%	13,77%
OP Bratislavský kraj	5 955 344,15	861 201,05	6 816 545,20	218 216,20	25 672,49	243 888,69	6,42%	0,24%	6,66%
OP Konkurenc. a hosp. rast	47 118 846,93	7 884 276,87	55 003 123,80	48 933 424,18	8 593 320,13	57 526 744,31	4,97%	5,16%	10,12%
Regionálny OP	67 045 832,26	8 604 168,05	75 650 000,31	8 008 813,12	1 129 130,82	9 137 943,94	4,54%	0,54%	5,08%
OP Cezhraničnej spolupráce SR-	2 999 132,95	281 004,48	3 280 137,43	0,00	0,00	0,00	3,53%	0,00%	3,53%
OP Rybné hospodárstvo	939 059,54	336 678,71	1 275 738,25	103 025,04	34 341,69	137 366,73	9,24%	1,01%	10,25%
OP Zdravotníctvo	38 952 312,67	6 827 808,38	45 780 121,05	3 221 200,28	568 447,11	3 789 647,39	17,86%	1,48%	19,34%
OP Výskum a vývoj	117 027 547,92	17 258 556,81	134 286 104,73	36 670 501,47	5 213 524,73	41 884 026,20	9,92%	3,11%	13,03%
OP Technická pomoc	9 752 991,23	2 090 735,92	11 843 727,15	17 362 775,42	4 009 692,33	21 372 467,75	10,98%	19,55%	30,53%
OP Vzdelávanie	34 359 880,74	5 863 545,22	40 223 425,96	1 022 978,40	164 651,03	1 187 629,43	6,97%	0,21%	7,18%
OP Životné prostredie	62 069 783,66	9 413 814,29	71 483 597,95	28 111 430,40	3 594 781,15	31 706 211,55	3,57%	1,62%	5,19%
OP Doprava	363 400 528,08	71 128 483,50	434 529 011,58	31 488 129,12	5 556 728,66	37 044 857,78	11,69%	1,01%	12,70%
OP Zamestn. a sociálna inklúzia	43 347 420,04	7 559 708,60	50 907 128,64	13 970 009,92	2 443 499,06	16 413 508,98	4,79%	1,54%	6,34%
OP INTERACT II	71 762,67	12 663,99	84 426,66	0,00	0,00	0,00	0,25%	0,00%	0,25%
Spolu	889 228 501,69	168 448 488,55	1 057 676 990,24	204 932 192,11	36 520 849,32	241 453 041,43	7,95%	1,83%	9,78%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) už 20 rokov poskytuje EÚ svoje odborné znalosti s cieľom zabezpečiť, aby sa peniaze daňovníkov vynakladali správne, a bojuje proti podvodom, korupcii a falšovaniu. OLAF je dôležitý pre Európu najmä dnes, keď podvodníci obracajú svoj zrak na rozpočet 2021 – 2027 vo výške 1,8 bilióna EUR určený na zotavenie Európy z následkov pandémie COVID-19. V posledných rokoch silnie trend podvodov zameraných na finančné prostriedky EÚ určené na projekty v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja.

10. septembra 2020 OLAF zverejnil Výročnú správu za rok 2019, v ktorej informuje o svojej činnosti za predchádzajúci rok a poskytuje prehľad o štatistických informáciách o nahlásených nezrovnalostiach a nahlásených podozreniach z podvodu v rámci čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ za jednotlivé členské štáty.

Niektoré z hlavných trendov vyšetrovania podvodov, ktoré OLAF publikoval v správe, sú chronické choroby aj Slovenska:

- tajné dohody a machinácie pri **verejnom obstarávaní** = v priemere sa preplácajú reálne výdavky až **o 127 % podľa analýz OLAF**,
- podvody zamerané na prostriedky určené na **financovanie výskumu**.

Zo zverejnených štatistik **už štvrtý rok po sebe Slovensko** obsadzuje prvé miesta v počte a objeme reportovaných nezrovnalostí spomedzi všetkých členských štátov. **V publikovanej správe sa Slovensko za roky 2015 – 2019 opakovane umiestnilo na 1. mieste** z krajín EÚ s úrovňou **podielu 21,03 % všetkých reportovaných nezrovnalostí na OLAF na poskytnutých platbách z rozpočtu EÚ**, pričom priemer za všetky členské štáty je na úrovni 1,91 %. Pre bližšie porovnanie 6 najhorších krajín okrem Slovenska dosahuje v zverejnenej štatistike zásadne odlišné pozície, a to:

- Česká republika úroveň podielu 2,22 %,
- Grécko úroveň podielu 2,24 %,
- Malta úroveň podielu 2,57 %,
- Španielsko úroveň podielu 2,70 %,
- Rumunsko úroveň podielu 2,92 %.

Záväzné plány a krízové riadenie

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z. ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení nariadenia vlády č. 71/2018 Z. z. (ďalej len „nariadenie č. 247/2016 Z. z.“) CKO schvaľuje a vyhodnocuje záväzné plány jednotlivých operačných programov. Záväzný plán obsahuje kumulatívne hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť

od začiatku implementácie k dátumu vyhodnotenia plánu, a to na úrovni prioritných osí a v členení na kategórie regiónov. Závazný plán zahŕňa ukazovatele výkonnostného rámca, kontrahovanie a čerpanie.

V prípade nesplnenia kritérií záväzných plánov aspoň na 80 %, a ak o tom rozhodne vláda SR, je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) oprávnené vykonávať krízové riadenie príslušného operačného programu.

V krízovom riadení v zmysle nariadenia č. 247/2016 Z.z. na základe schváleného materiálu „Návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce“ a uznesenia č. 411/2019 vládou SR dňa 27.08.2019 sú aktuálne vedené 4 programy a to: IROP, OP RH, Interreg V-A SK-CZ a Interreg V-A SK-AT.

K 31.12.2020 bolo vyhodnotené ročné plnenie záväzných plánov (ďalej len „ZP“) jednotlivých OP za rok 2020, ktoré je uvedené v tabuľke č. 11.

Najvyššiu hodnotu plnenia ZP dosiahol OP TP (100,00 %), nasleduje OP LZ (97,94 %) a ďalej PRV (96,82 %). Viac ako 90 %-nú úroveň plnenia dosiahli aj OP KŽP (96,20 %), OP EVS (94,16 %), OP II (91,53 %) a IROP (90,41 %). Plnenie plánu nad 80 % dosiahol ešte Interreg V-A SK-CZ (87,83 %). Najnižšie dosiahnuté plnenie, **pod úroveň 80 %**, majú programy **Interreg V-A SK-AT (77,83 %) a OP RH (32,53 %).**

Plnenie ročného záväzného plánu na úrovni EŠIF k 31.12.2020 dosiahlo hodnotu 89,18 %.

Tabuľka č. 11 Vyhodnotenia plnenia záväzných plánov 2017 až 2020

Operačný program/plnenie ZP	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
OP Technická pomoc	99,97%	95,05%	97,62%	100,00%
OP Integrovaná infraštruktúra	95,21%	86,81%	84,17%	91,53%
Program rozvoja vidieka	89,52%	85,99%	96,38%	96,82%
OP Kvalita životného prostredia	87,96%	94,82%	96,52%	96,20%
OP Efektívna verejná správa	80,48%	93,01%	91,89%	94,16%
OP Ľudské zdroje	79,54%	93,00%	96,41%	97,94%
Integrovaný regionálny OP	72,19%	79,52%	92,50%	90,41%
OP Výskum a inovácie	64,49%	59,55%	76,88%	-
Interreg V-A SK-CZ	0,00%	52,44%	87,10%	87,83%
Interreg V-A SK-AT	0,00%	56,84%	79,97%	77,83%
OP Rybné hospodárstvo	0,40%	32,12%	52,66%	32,53%
Priemer EŠIF	62,43%	77,33%	86,55%	89,18%

Zdroj: CKO/MIRRI SR

Záväzné plány na rok 2021 a výhľadové plány na r. 2022 a 2023 boli predložené riadiacimi orgánmi v termíne do 01.03.2021 a posúdené MIRRI SR. Závazný plán predstavuje plánovanie zo strany riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za daný OP.

V tabuľke č.12 sú uvedené informácie týkajúce sa jednotlivých OP a ich **záväzných plánov kontrahovania do 31.12.2021 a výhľadového plánu kontrahovania do 31.12.2023**. Vzhľadom k tomu, že **MIRRI SR** nepovažuje plánované hodnoty kontrahovania dva roky pred ukončením programového obdobia za dostatočné, **dôrazne odporúča a žiada všetky OP, aby kontrahovanie k 31.12.2021 bolo u všetkých OP minimálne na úrovni 90 % alokácie**, vrátane 1. časti dodatočnej alokácie na REACT-EU, pričom na konci roka 2022 je potrebné, aby všetky OP dosiahli 100 % úroveň kontrahovania.

Odporúčanie MIRRI SR na navýšenie plánov kontrahovania k 31.12.2021 sa týka OP KŽP a PRV.

Zvýšený plán kontrahovania bol priamo uplatnený aj v rámci IROP, ktorého riadiaci orgán je súčasťou MIRRI SR.

Tab. č. 12 Závazný plán kontrahovania do 31.12.2021 a výhľad na rok 2022 a 2023 v zmysle záväzných plánov a v porovnaní s odporúčaním MIRRI SR

Program	Alokácia (EÚ zdroj)	Skutočné kontrahovanie ¹ k 31.12.2020	Podiel kontrahovania na alokácii %	Plánovaná hodnota kontrahovania k 31.12.2021	Podiel plánu kontrahovania k 31.12.2021 na alokácii %	Plán kontrahovania v roku 2021 zo ZP na rok 2021	MIRRI SR odporúča kontrahovať v roku 2021	Plánovaná hodnota kontrahovania k 31.12.2022 zo ZP na rok 2021	Plánovaná hodnota kontrahovania k 31.12.2023 zo ZP na rok 2021
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
	A	B	C=B/A	D	E=D/A	F=D-B	G	H	I
OP LZ	2 929 999 089	2 626 813 375	89,65%	2 874 917 098	98,12%	248 103 723	248 103 723	2 929 999 089	2 929 999 089
OP II	6 009 937 611	4 771 899 304	79,40%	5 962 762 409	99,22%	1 190 863 105	1 190 863 105	6 063 328 105	6 221 459 879
OP KŽP	2 832 531 290	1 933 375 471	68,26%	2 295 451 131	81,04%	362 075 660	615 902 690	2 799 181 732	2 832 403 209
IROP	1 894 842 772	1 277 371 856	67,41%	1 705 358 495	90,00%	427 986 639	427 986 639	1 881 061 289	1 894 842 772
OP EVS	336 765 425	206 942 784	61,45%	321 644 656	95,51%	114 701 872	114 701 872	332 252 052	336 765 425
OP TP	159 071 912	136 323 968	85,70%	154 358 134	97,04%	18 034 166	18 034 166	158 993 202	159 071 912
OP RH	11 812 818	3 607 141	30,54%	6 640 361	56,21%	3 033 220	3 033 220	9 206 583	9 577 231
SK-CZ	90 139 463	67 490 556	74,87%	94 390 803	104,72%	26 900 247	26 900 247	94 390 803	94 390 803
SK-AT	75 892 681	54 140 174	71,34%	76 491 652	100,79%	22 351 478	22 351 478	77 045 212	77 834 987
INTERACT III	39 392 594	39 392 594	100,00%		0,00%				
EŠIF (bez PRV)	14 380 385 655	11 117 357 223	77,31%	13 492 014 739	93,82%	2 374 657 516	2 667 877 139	14 345 458 067	14 556 345 308
PRV	1 559 691 844	1 270 546 118	81,46%	1 359 000 664	87,13%	88 454 545	133 176 541	1 539 000 966	1 559 691 844
EŠIF (s PRV)	15 940 077 499	12 387 903 342	77,72%	14 851 015 403	93,17%	2 463 112 061	2 801 053 681	15 884 459 032	16 116 037 152

Zdroj: ITMS2014+, RO PRV;

1-ide o čisté kontrahovanie očistené o nečerpanú sumu ukončených projektov

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú už s navýšením v rámci 1. fázy REACT-EU

V tabuľke č.13 sa nachádzajú informácie o záväznom pláne čerpania do 31.12.2021 v porovnaní s objemom výdavkov, ktoré je potrebné predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej legislatívy. Zároveň sú uvedené odporúčania MIRRI SR na čerpanie, a to vzhľadom na zabránenie rizika dekomitmentu a zabezpečenia rovnomerného čerpania výdavkov v zostávajúcich rokoch.

Z predložených záväzných plánov čerpania k 31.12.2021 evidujeme plánovaný nárast objemu čerpania v rámci EŠIF v roku 2021 o 2,49 mld. EUR, čo predstavuje nárast zo 40,37 % na 55,86 % z celkovej alokácie. Pre porovnanie, uvedené záväzné plány čerpania presahujú objemy výdavkov, ktoré je potrebné predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej legislatívy o 1,29 mld. EUR.

Vzhľadom k tomu, že za 7 rokov implementácie programového obdobia bolo vyčerpaných 6,43 mld. EUR, pričom v posledných 3 rokoch ostáva ešte vyčerpať 9,22 mld. EUR, MIRRI SR s cieľom zabránenia dekomitmentu na konci programového obdobia odporúča zabezpečiť rovnomerné rozloženie čerpania na roky 2021 až 2023, v nadväznosti na čo odporúča navýšiť plánované čerpanie v roku 2021 z 2,49 mld. EUR až na úroveň 2,86 mld. EUR za celý EŠIF. Tým sa vytvoria podmienky pre rovnomerné rozloženie plánov čerpania v roku 2022, kedy sa odporúča čerpať 3,40 mld. EUR a v roku 2023, kedy sa odporúča čerpať zvyšok alokácie vo výške 3,24 mld. EUR. Pri plánovaní je potrebné zohľadniť skutočnosť, že od roku 2022 bude prebiehať súbežná implementácia už aj s novým programovým obdobím 2021 – 2027 (Operačný program Slovensko).

Odporúčanie MIRRI SR na navýšenie plánov čerpania k 31.12.2021 a následne plánov čerpania na roky 2022 a 2023 sa týka OP II a OP KŽP.

Zvýšený plán čerpania bol priamo uplatnený aj v rámci IROP a programov cezhraničnej spolupráce, ktorých riadiace orgány sú súčasťou MIRRI SR.

Tab. č. 13 Závazný plán čerpania do 31.12.2021 v porovnaní s N+3 v zmysle novej legislatívy a v porovnaní s odporúčaním MIRRI SR na čerpanie v roku 2021

Program	Alokácia (EÚ zdroj)	Skutočné čerpanie EŠIF ¹ k 31.12.2020	Podiel čerpania na alokácii %	Plánovaná hodnota čerpania k 31.12.2021 zo ZP na rok 2021	Podiel plánu čerpania k 31.12.2021 na alokácii %	Zostatok nevyčerpanej alokácie k 31.12.2021 zo ZP na rok 2021	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej legislatívy (stav k 31.12.2020)	plánované čerpanie v roku 2021 zo ZP na rok 2021	MIRRI SR odporúča čerpať v roku 2021
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
	A	B	C=B/A	D	E=D/A	F=A-D	G	H=D-B	I
OP IZ	2 929 999 089	1 335 787 804	45,59%	2 006 800 174	68,49%	923 198 915	0	671 012 370	671 012 370
OP II	6 009 937 611	2 160 907 842	35,96%	2 975 332 383	49,51%	3 034 605 228	502 269 107	814 424 541	1 114 000 000
OP KŽP	2 832 531 290	1 135 995 748	40,11%	1 464 218 846	51,69%	1 368 312 444	321 589 523	328 223 098	400 000 000
IROP	1 894 842 772	555 997 210	29,34%	905 997 210	47,81%	988 845 562	171 265 610	350 000 000	350 000 000
OP EVS	336 765 425	105 758 107	31,40%	188 604 817	56,00%	148 160 608	19 039 823	82 846 709	82 846 709
OP TP	159 071 912	106 109 802	66,71%	136 109 802	85,56%	22 962 110	0	30 000 000	30 000 000
OP RH	11 812 818	1 107 219	9,37%	3 794 457	32,12%	8 018 361	1 925 228	2 687 237	2 687 237
SK-CZ	90 139 463	27 026 981	29,98%	45 026 981	49,95%	45 112 482	11 889 997	18 000 000	18 000 000
SK-AT	75 892 681	17 816 414	23,48%	34 816 414	45,88%	41 076 267	11 765 831	17 000 000	17 000 000
INTERACT III	39 392 594	21 680 711	55,04%		0,00%		0		
EŠIF (bez PRV)	14 380 385 655	5 468 187 838	38,03%	7 760 701 083	53,97%	6 619 684 572	1 039 745 117	2 314 193 956	2 685 546 317
PRV	1 559 691 844	966 257 427	61,95%	1 144 159 489	73,36%	415 532 355	163 065 271	177 902 063	177 902 063
EŠIF (s PRV)	15 940 077 499	6 434 445 265	40,37%	8 904 860 572	55,86%	7 035 216 926	1 202 810 388	2 492 096 019	2 863 448 379

Zdroj: MF SR čerpanie k 31.12.2020, RO PRV;

1-ide o čisté čerpanie schválené na úrovni certifikačného orgánu, za PRV schválené uhradené platby prijímateľom očistené o nezrovnalosti
Alokácie OP IZ, IROP a OP EVS sú už s navýšením v rámci 1. fázy REACT-EU

Tab. č. 14 Výhľadový plán čerpania na roky 2022 a 2023 predložený operačnými programami ako súčasť záväzných plánov v porovnaní s odporúčaniami MIRRI SR na čerpanie

Program	Alokácia (EÚ zdroj)	Skutočné čerpanie EŠIF ¹ k 31.12.2020	Podiel čerpania na alokácii %	Zostatok nevyčerpanej alokácie k 31.12.2021 zo ZP na rok 2021	Plánované čerpanie za rok 2022 zo ZP na rok 2021	MIRRI SR odporúča čerpať v roku 2022	Plánované čerpanie za rok 2023 zo ZP na rok 2021	MIRRI SR odporúča čerpať v roku 2023
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
	A	B	C=B/A	D=E+G	E	F	G	H
OP IZ	2 929 999 089	1 335 787 804	45,59%	923 198 915	560 867 106	560 867 106	362 331 809	362 331 809
OP II	6 009 937 611	2 160 907 842	35,96%	3 034 605 228	1 695 578 285	1 370 000 000	1 339 026 943	1 365 029 769
OP KŽP	2 832 531 290	1 135 995 748	40,11%	1 368 312 444	369 097 285	648 267 771	555 112 000	648 267 771
IROP	1 894 842 772	555 997 210	29,34%	988 845 562	494 422 781	494 422 781	494 422 781	494 422 781
OP EVS	336 765 425	105 758 107	31,40%	148 160 608	69 693 079	69 693 079	78 467 529	78 467 529
OP TP	159 071 912	106 109 802	66,71%	22 962 110	10 883 400	10 883 400	12 078 710	12 078 710
OP RH	11 812 818	1 107 219	9,37%	8 018 361	3 361 038	3 361 038	2 421 737	2 421 737
SK-CZ	90 139 463	27 026 981	29,98%	45 112 482	22 556 241	22 556 241	22 556 241	22 556 241
SK-AT	75 892 681	17 816 414	23,48%	41 076 267	20 538 133	20 538 133	20 538 133	20 538 133
INTERACT III	39 392 594	21 680 711	55,04%	17 711 883	1 878 933	1 878 933	15 832 950	15 832 950
EŠIF (bez PRV)	14 380 385 655	5 468 187 838	38,03%	6 619 684 572	3 248 876 281	3 202 468 482	2 902 788 834	3 021 947 431
PRV	1 559 691 844	966 257 427	61,95%	415 532 355	137 504 530	200 000 000	278 027 825	215 532 354
EŠIF (s PRV)	15 940 077 499	6 434 445 265	40,37%	7 035 216 926	3 386 380 810	3 402 468 482	3 180 816 659	3 237 479 786

Zdroj: MF SR čerpanie k 31.12.2020, RO PRV;

1-ide o čisté čerpanie schválené na úrovni certifikačného orgánu, za PRV schválené uhradené platby prijímateľom očistené o nezrovnalosti
Alokácie OP IZ, IROP a OP EVS sú už s navýšením v rámci 1. fázy REACT-EU

OP KŽP plánuje ešte začiatkom roku 2024 dočerpanie vo výške 444 103 159 EUR

Zjednodušovanie procesov implementácie

Jednou z hlavných priorít Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aj redukcia administratívnej záťaže a komplikovanosti nastavených implementačných procesov. CKO neustále analyzuje možnosti zjednodušovania procesov a priebežne ich zavádza do praxe.

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF

Prvou legislatívnou iniciatívou ministerstva v súvislosti s pandémiou bolo prijatie novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF - tzv. „lex corona“. Novela nadobudla účinnosť 21.05.2020 a umožnila zjednodušenie procesov pri poskytovaní príspevkov z EŠIF pre poskytovateľov (riadiace orgány) ako aj pre žiadateľov a prijímateľov. Zmeny, ktoré predmetná novela priniesla, sú rozdelené na zmeny časovo neobmedzené a zmeny časovo obmedzené na obdobie krízovej situácie, ktorá je definovaná ako čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na obdobie šesť mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní.

Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré predmetná lex corona priniesla v reakcii na COVID - 19:

- zasadnutie a hlasovanie vybraných kolektívnych orgánov prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie (týka sa napr. Monitorovacieho výboru a osobitných komisií),
- odpustenie zmeškania vybraných zákonných lehôt, ku ktorému došlo v období od 12.03.2020 do účinnosti zákona, t. j. do 21.05.2020 (napr. lehota na doplnenie žiadosti o NFP na výzvu poskytovateľa, preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve pred aplikáciou zásobníka projektov, podanie odvolania, vydanie rozhodnutia v odvolacom konaní, vydanie rozhodnutia v preskúmvacom konaní a pod.),
- možnosť flexibilnejšie zmeniť vyhlásenú výzvu (z dôvodu zmien formálnych náležitostí, podmienok poskytnutia príspevku aj príloh výzvy; zrušenie obmedzenia možnosti zmeniť výzvu len ak sa podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku),
- možnosť flexibilnejšie zrušiť vyhlásenú výzvu (ak z objektívnych aj iných skutočností, ktoré nastali po vyhlásení výzvy, nie je možné financovať projekty na základe výzvy),
- možnosť zastaviť konanie o žiadosti o NFP (oproti pôvodnej povinnosti zastaviť takéto konanie),
- možnosť zmeny už uzavretého vyzvania (napr. pri národných projektoch) v reakcii na COVID – 19 (s výnimkou podmienky oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti partnera),
- hromadná zmena zmluvy (nový zjednodušený inštitút novej zmeny zmluvy bez potreby uzatvorenia množstva dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP), pričom iniciátorom zmeny môže byť CKO alebo CO pri zachovaní zásady, že tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na prijímateľa,
- predĺženie lehôt v súvislosti s dohodami o splátkach a dohodami o odklade plnenia v čase krízovej situácie (napr. predĺženie lehoty na splátky z pôvodných maximálnych troch rokov na päť rokov a predĺženie odkladu plnenia z pôvodného maximálneho jedného roka na tri roky).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe **d'alsiu novelu zákona o príspevku z EŠIF**, ktorú schválila vláda SR na rokovaní dňa 13.01.2021. Predpokladaná účinnosť novely je od 01.06.2021. Cieľom novely je zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť. V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie, konkrétne:

- zjednodušená zmena a rušenie výziev v prípade, ak je to nevyhnutné z dôvodu potreby poskytnutia finančných prostriedkov z fondov EÚ na iné aktivity (projekty), pri dodržaní podmienok zachovania transparentnosti a rovnakého prístupu žiadateľov k týmto finančným prostriedkom,
- možnosť úpravy metodiky zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa potrieb vyplývajúcich z implementačnej praxe,

Ďalšími zavádzanými opatreniami sú:

- zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov vykonávaných orgánom auditu – opatrenie zvýši nielen informovanosť verejnosti o najvážnejších zisteniach v implementácii fondov EÚ, ale tiež umožní ostatným riadiacim orgánom neopakovať tieto pochybenia v budúcnosti,
- zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR v prípadoch, kedy je potrebné v krátkej dobe poskytnúť prostriedky veľkému množstvu subjektov (napr. zdravotníckym ambulanciám). Predmetný mechanizmus spočíva v možnosti poskytnutia finančných prostriedkov užívateľom prostredníctvom rozhodnutí, výmerov alebo iných opatrení (nie na základe zmluvy),
- možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania, ktoré doteraz žiadatelia nemali. Navrhovaná zmena kvalitatívne vylepšuje postavenie žiadateľov v procese schvaľovania ich žiadostí a dáva širšie možnosti na nápravu nesprávneho rozhodnutia riadiaceho orgánu,

- možnosť, aby jedno vyzvanie bolo základom pre podanie viacerých národných projektov alebo projektov technickej pomoci toho istého žiadateľa alebo rôznych žiadateľov. To znamená, že sa na úrovni všeobecne záväzného právneho predpisu potvrdzuje už skôr zavedená aplikačná prax, ktorá však nebola jednotná. Zvyšuje sa tým právna istota, a to aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov generovaných v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci,
- vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ novela zjednodušuje úlohy subjektov zapojených do implementácie (pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, orgán auditu, platobné jednotky aj certifikačný orgán) v súvislosti s vypracovaním správy o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa po novom bude vypracovávať a zasielať prijímateľovi a ďalším relevantným subjektom iba prostredníctvom ITMS2014+. Ďalej sa upresňujú niektoré postupy pri ukladaní finančných opráv pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania – upresňuje sa odkedy sa počítajú úroky z omeškania a zároveň sa s cieľom zrýchlenia implementácie a vysporiadania finančných vzťahov ustanovuje 6-mesačná lehota, v ktorej musí poskytovateľ vydať rozhodnutie v správnom konaní, ktorým uloží danú korekciu,
- poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať v rámci zoznamu schválených aj neschválených projektov aj fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu (okrem osôb v pracovnom alebo služobnom pomere k žiadateľovi). Predmetný návrh **zvyšuje transparentnosť** v procese implementácie fondov EÚ a zároveň znižuje riziko vzniku potenciálneho konfliktu záujmov.

Systém riadenia EŠIF

Medzi najdôležitejšie **opatrenia zavedené v novembri 2020 na úrovni Systému riadenia EŠIF** patria **zjednodušenia v oblasti verejného obstarávania**, ktoré vstúpili do praxe v decembri.

- zavedenie pravidla, podľa ktorého RO bude vykonávať kontrolu iba v tých fázach, ktoré určuje Systém riadenia EŠIF,
- prvá ex ante kontrola bude na dobrovoľnom rozhodnutí prijímateľa a môže sa okrem nadlimitných zákaziek týkať aj podlimitných zákaziek na stavebné práce,
- zvýšenie finančného limitu pre zákazky s nízkou hodnotou, spolufinancované z EŠIF z 30 000 EUR na 50 000 EUR,
- vypustená možnosť pre RO vykonávať druhú ex ante kontrolu v prípade zákaziek, ktoré povinne kontroluje ÚVO a v týchto prípadoch určenie pravidla, podľa ktorého zmluva, uzavretá ako výsledok VO, nadobudne účinnosť až po ukončení ex post kontroly zo strany RO,
- vypustenie povinnosti oslovovať minimálne troch záujemcov v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR, nakoľko tieto zákazky sú transparentne zverejnené.

Za kľúčové MIRRI SR považuje pripravované vydanie jednotnej príručky pre verejné obstarávanie pre všetky RO. Aktuálne je príručka predmetom interného pripomienkového konania.

Okrem týchto opatrení sa MIRRI SR na jeseň prioritne zameralo na zavádzanie zjednodušení a skvalitnenie procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Zmeny v Systéme riadenia EŠIF obsahujú **zmeny vyplývajúce z implementačnej praxe** ako napríklad:

- návrh na uzavretie zmluvy nemusí zaniknúť uplynutím lehoty na jej prijatie (zosúladenie Systému riadenia EŠIF so zákonom o príspevku z EŠIF);
- žiadosti sa vrátia do zásobníka projektov, ak sa počas konania o nich zníži alokácia;
- v rámci jedného vyzvania je možné podporiť viacero žiadateľov a projektov;
- RO môže konzultovať so žiadateľom dožiadanie;
- dokumenty k projektu (najmä k žiadostiam o platbu) sa vkladajú do ITMS2014+ (nie je ich potrebné zasielať listinne);
- o overení možného konfliktu záujmov odborného hodnotiteľa sa zachováva auditná stopa (print screen);

Ďalšie zmeny v Systéme riadenia EŠIF obsahujú ďalšie zjednodušenia ako napr.

- podmienku mať vysporiadané majetkové vzťahy a povolenia na realizáciu projektu je odporúčané overovať až pred uzavretím zmluvy o NFP;
- žiadosť o NFP sa môže schváliť, aj keď sú identifikované neoprávnené výdavky, zníži sa počet bodov hodnotenia;
- RO nevyžaduje k žiadosti o NFP čestné vyhlásenia nad rámec toho, ktoré podpisuje ako súčasť žiadosti o NFP;
- možnosť využívania interných hodnotiteľov (za interných hodnotiteľov sa považujú zamestnanci RO aj zamestnanci inštitúcie, vecne zodpovednej podľa kompetenčného zákona za hodnotenú problematiku;
- hodnotitelia hodnotia štandardne mimo priestorov RO, RO im môže umožniť hodnotenie v jeho priestoroch, ak tomu nebráni napr. karanténna situácia;
- hodnotiace hárky stačí hodnotiteľom podpísať, naskenovať a zaslať mailom na RO.

Následnú sériu zjednodušení plánuje MIRRI zaviesť v pripravovanom Systéme riadenia EŠIF. Plánované zmeny možno rámcovo zhrnúť do nasledovných oblastí:

- **Výzvy:**
 - zjednodušenie vzoru výzvy
 - zrušenie kontrolného zoznamu k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania (povinnosť skontrolovať výzvu na úrovni RO pred jej vyhlásením zostane zachovaná);
 - zrušenie vzoru CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (postupovať sa bude podľa vzoru implementovaného v ITMS2014+ s minimalizáciou údajov);
 - zrušenie vzoru CKO č. 24 Záverečná správa výzvy (pričom povinnosť vypracovať záverečnú správu výzvy zostane zachovaná v štruktúre podľa funkcionality v ITMS2014+);
 - subjekty verejnej správy na strane žiadateľov (ako aj nových prijímateľov) budú povinní komunikovať elektronicky, ak osobitný predpis alebo technické možnosti komunikáciu umožňujú;
 - projektový zámer môže obsahovať orientačný rozpočet a prípadne aj opis projektu, iné prílohy by nemal RO zadefinovať ako prílohu;
 - prílohou výzvy je modelovo vyplnená žiadosť o NFP v častiach, ktoré je možné vzorovo vyplniť (nie formulár, ako tomu bolo doteraz).
- **Schvaľovací proces**
 - RO sa odporúči zverejňovať príručku pre odborných hodnotiteľov a hodnotiace hárky (žiadateľ bude mať možnosť sebahodnotenia kvality projektu, môže otestovať, či má jeho žiadosť potenciál na schválenie).
 - predloženie žiadosti o NFP bude možné výhradne elektronicky
 - odborní hodnotitelia budú hodnotiť žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS
- **Kontrola VO**
 - zjednodušovanie zadávania zákaziek s nízkou hodnotou:
 - zjednodušovanie zákaziek zadávaných osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej z NFP (pravidlá uvedené v kapitole 7 MP CKO č. 12)

- **Kontrola**
 - zrušenie vzorov ku kontrole, t. j. vypustenie zo Systému riadenia a zo vzorov CKO, nakoľko odporúčanú formu definuje MF SR v osobitnom usmernení k z. č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (vypustenie zo Systému riadenia a zo vzorov CKO),
 - vytváranie vzorov ku kontrole priamo v ITMS2014+
 - úprava a zjednodušenie kontrolných vzorov mimo vzorov ku kontrole VO
- **Oprávnenosť výdavkov**
 - zriadenie pracovnej skupiny, určenej na výmenu skúseností medzi jednotlivými riadiacimi orgánmi, ako aj na transfer poznatkov zo zahraničia
- **Zazmluvňovanie, zmluva o poskytnutí NFP, zmenové konanie**
 - hromadná zmena zmluvy z podnetu CKO – nový inštitút účinný od poslednej novely zákona č. 292/2014 Z.z. (jednoduchšia forma zmeny pre jednotlivé riadiace orgány, ktoré sa môžu rozhodnúť, či túto zmenu využijú a v akom rozsahu),
 - úprava ustanovenia týkajúceho sa záväznosti právnych dokumentov vydávaných CKO vo vzťahu k prijímateľovi (bod 6.15 vzoru zmluvy, ktorý hovorí o tom, že Systém riadenia je pre prijímateľa záväzný momentom zverejnenia),
- **Elektronická komunikácia**
 - výhradne elektronická komunikácia pre všetkých (ktorým bola aktivovaná el. schránka), pri nových prijímateľoch aj počas realizácie projektu, ak to umožňujú technické možnosti a osobitné predpisy
- **Monitorovanie**
 - vypustenie povinnosti predkladania mimoriadnych monitorovacích správ
 - zrušenie povinnosti predkladania monitorovacej správy, ak sa nezačali realizovať hlavné aktivity projektu v danom roku

Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 (v kompetencii MF SR)

Medzi najdôležitejšie **opatrenia zavedené v roku 2020 na úrovni Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020** patria nasledovné zjednodušenia:

- zjednodušenia podmienok pri poskytovaní zálohových platieb, rozšírenia okruhu prijímateľov oprávnených využívať systém zálohových platieb a predĺženia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby na 12 mesiacov najmä z dôvodu eliminácie negatívnych dôsledkov šíriacej sa pandémie COVID – 19;
- umožnenie prijímateľovi uhrádzať z poskytnutej zálohovej platby aj výdavky, ktoré uhradil pred dátumom jej pripísania na svojom účte z iných účtov otvorených prijímateľom;
- zrušenie sankcie zníženia NFP v prípade nedodržania podmienok pre zúčtovanie zálohovej platby.

MF SR v roku 2021 pokračuje v ďalšom zjednodušovaní finančného riadenia, pričom pripravuje **na úrovni Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020** s platnosťou od 1. mája 2021 umožniť:

- predĺženie lehoty na vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby a predfinancovania na 10 pracovných dní;
- predkladanie žiadostí o platbu len elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ bez povinnosti predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe;
- ďalšie zjednodušenie výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby.

Zjednodušovanie vybraných procesov IROP

Osobitnou oblasťou zjednodušovania bolo **zjednodušovanie vybraných procesov IROP**, a to vzhľadom na skutočnosť, že v čase keď nastúpila nová vláda, bol stav čerpania v rámci IROP kritický, nakoľko do konca roka 2020 ostávalo vyčerpať viac ako 177 mil. EUR. S cieľom minimalizovať riziko trvalej straty finančných prostriedkov v rámci IROP, ešte pred prechodom kompetencií na MIRR, pristúpili sme k spracovaniu analýzy zjednodušenia vybraných procesov, ktorá identifikuje 40 návrhov opatrení na zjednodušenie implementácie tohto programu v 3 hlavných okruhoch:

- 4 systémové návrhy,
- 32 procesných návrhov,
- 4 manažérske návrhy.

Všetky opatrenia sú už implementované pričom v súčasnej dobe sa finalizuje aj nové web sídlo. Zjednodušenia sa týkali oblastí verejného obstarávania kde napr. išlo o redukciu počtu povinných kontrol VO pri podlimitných zákazkách. Pred zavedením opatrenia bolo kontrola VO vykonávaná až 3x a po zavedení opatrenia sa vykonáva kontrola VO len 1x a dosiahli sme úsporu času až do 6 mesiacov. Ďalšie zjednodušovania sa týkali napr. zjednodušenia v rámci overovania hospodárnosti výdavkov, odborného hodnotenia alebo zjednodušenie pracovného výkazu, pri ktorom sa dosiahla časová úspora až 30 %.

Zámer vykonanej analýzy, ako aj celkový dopad implementácie 40 návrhov opatrení, sa odzrkadlil aj vo výsledku aktuálneho čerpania IROP, ktorým je nulový dekomitment v roku 2020. V závere možno konštatovať, že opatrenia prispeli k zabráneniu dekomitmentu t.j. k trvalej strate finančných prostriedkov pre Slovenskú republiku.


II. Stav implementácie jednotlivých programov, riziká a návrh opatrení na ich elimináciu

Aktuálnu kondíciu jednotlivých programov v porovnaní s ostatnými je možné stanoviť na základe vyhodnotenia nasledovných základných kritérií rizikovosti s tým, že najvyššiu váhu má riziko neplnenia N+3, výsledkom ktorých je zaradenie programu medzi **vysoke rizikové**, **menej rizikové** a **nerizikové** z pohľadu plynulej implementácie.

Tabuľka č. 15 Priradenie kritérií rizikovosti jednotlivým OP s dôrazom na pravidlo N+3 v roku 2021

Program	Riziko neplnenia N+3 v roku 2021	Upozorňujúce listy z EK	Podiel uplatnených korekcií z čerpania (> 2 %)	Prerušené platby/poza stavené výdavky na EK	Nevýkonné prioritné osi (PO)
OP Ľudské zdroje	-	✓	-	✓	✓
OP Integrovaná infraštruktúra	✓	✓	✓	✓	✓
OP Kvalita životného prostredia	✓	✓	-	✓	✓
Integrovaný regionálny OP	✓	-	-	✓	✓
OP Efektívna verejná správa	✓	-	-	-	-
OP Technická pomoc	-	-	✓	-	-
OP Rybné hospodárstvo	✓	✓	✓	✓	✓
Interreg V-A SK-CZ	✓	-	-	✓	✓
Interreg V-A SK-AT	✓	-	-	-	✓
PS INTERACT III	-	-	-	-	-
Program rozvoja vidieka	✓	-	-	-	✓

Pozn.: ✓ = výskyt kritéria rizikovosti

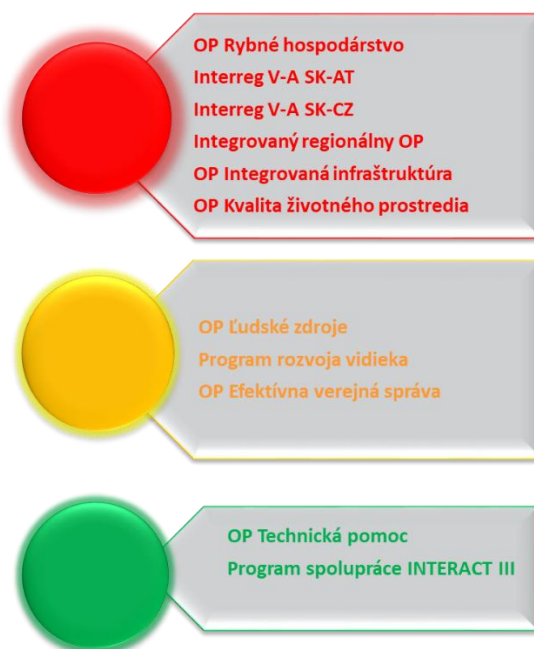

Oproti stavu k 31.12.2020 nenastali zmeny v priradení rizikovosti. Naďalej ostávajú rizikové OP, u ktorých je potrebné zohľadniť značné navýšenie sumy finančného záväzku v roku 2021 v kombinácii s ostatnými rizikovými faktormi, ktoré ovplyvňujú úspešnosť a plynulosť implementácie. Vysoko rizikovými zostávajú aj OP, ktoré pravidelne naplňujú pravidlo N+3 až v poslednom kvartáli príslušného roka.

Hlavným cieľom predkladaného materiálu je zdôraznenie potreby dôsledného monitorovania implementácie operačných programov na úrovni jednotlivých ministerstiev a prijatie takých zásadných opatrení, ktoré zabezpečia eliminovanie rizík, vyplývajúcich z možného nedočerpania časti alokácii v programovom období 2014 – 2020.


Zvýšený dohľad nad implementáciou EŠIF prostredníctvom:

1. optimálneho rozdelenia čerpania v rokoch 2021 – 2023 s cieľom zabránenia dekomitmentu
2. vypracovania akčných plánov pri vybraných rizikových operačných programoch, prípadne prioritných osiach s termínom do 31.05.2021
3. vykonania vnútorných realokácií, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít v rámci OP v zmysle výsledkov analýz s termínom do 30.09.2021
4. definovania strategických projektov z pohľadu čerpania a ich pravidelné monitorovanie
 - projekty v zozname tvoria min. 50 % sumy potenciálneho čerpania všetkých neukončených projektov s výnimkou OP ĽZ PO 1 a PO 6, PO 7 OP II a IROP (min. 43 % a to vzhľadom na veľký počet veľmi malých projektov)
 - zoznam strategických projektov je dynamická zostava, v ktorej môžu RO a SO doplniť, upraviť, nahradiť projekty s patričným odôvodnením spolu s doplnením plánov čerpania pri prvom odpočte úloh do 31.05.2021. Táto zostava sa bude v roku 2022 aktualizovať a dopĺňať o nové projekty v zmysle pokračujúceho kontrahovania
5. stanovenia a monitorovania plnenia úloh jednotlivých riadiacich a sprostredkovateľských orgánov
6. zaviazania riadiacich a sprostredkovateľských orgánov k plneniu úloh v rámci implementácie EŠIF prostredníctvom uznesení vlády SR
7. stanovením hraničných termínov kontrahovania
 - min.90 % alokácie nakontrahovať do konca roka 2021
 - 100 % alokácie vrátane REACT-EU do konca roka 2022.
8. vytvorenia a dopĺňania zásobníkov projektov najmä v rizikových OP a PO (OP RH, IROP, PO 6 OP ĽZ, PO 7 OP II), s termínom do 30.09.2021.

Je potrebné zdôrazniť, že v zmysle európskej a slovenskej legislatívy je za implementáciu celého operačného programu zodpovedný riadiaci orgán.

Riadiace orgány operačných programov

Operačný program Ľudské zdroje:	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program Integrovaná infraštruktúra:	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Operačný program Kvalita Životného prostredia:	Ministerstvo životného prostredia SR
Integrovaný regionálny operačný program:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Program spolupráce V-A SK-CZ:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Program spolupráce V-A SK-AT:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program Technická pomoc:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program Efektívna verejná správa:	Ministerstvo vnútra SR
Program spolupráce INTERACTIII:	Bratislavský samosprávny kraj
Operačný program Rybné hospodárstvo:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Program rozvoja vidieka:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



a) Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 6,01 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** k 31.03.2021 je na úrovni **5,00 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **83,27 %** z celkovej alokácie;
- **čerpanie** je k 31.03.2021 na úrovni **2,26 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **37,60 %** z celkovej alokácie;
- **dňa 13.12.2019 došlo k zlúčeniu dvoch operačných programov, a to OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie;**
- **dekomitment** za rok 2017 bol vo výške **26,97 mil. EUR**, za rok 2018 bol vo výške **81,45 mil. EUR** (za pôvodný OP Val);
- **OP II (pôvodné) - čerpanie FN / Poskytnuté tranže FN (SIH)** k 31.03.2021 bolo vo výške 57 248 122 EUR, t.j. 3,4 % z celkového čerpania OP, z toho zúčtované tranže boli vo výške 26 874 611 EUR, t.j. 1,6 %;
- **OP II (pôvodné OP Val) - čerpanie FN / Poskytnuté tranže FN (SIH)** k 31.03.2021 bolo vo výške 132 811 250 EUR, t.j. 22,6 % z celkového čerpania OP, z toho zúčtované tranže voči EK boli vo výške 0 EUR.

Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020			Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)		Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidiel N+3 v zmysle novej leg.
			EÚ zdroj	Začlenený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	EÚ zdroj	
PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	625 565 417	86,19%	100 273 749	386 321 010	53,22%	339 518 156			
PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 120 038 905	1 271 326 186	113,51%	-151 287 281	756 119 687	67,51%	363 919 218			
PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	329 337 000	216 555 137	65,75%	112 781 863	186 807 255	56,72%	142 529 745			
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	91 924 095	1 296 939	1,41%	90 627 156	797 916	0,87%	91 126 179			
PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	223 951 749	186 461 762	83,26%	37 489 987	14 613 479	6,53%	209 338 270			
PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	779 886 032	332 766 627	42,67%	447 119 405	143 819 894	18,44%	636 066 138			
PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MIRRI SR	EFRR	676 940 302	601 435 605	88,85%	75 504 697	135 583 104	20,03%	541 357 198			
PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR SO: MIRRI SR	EFRR	87 000 000	77 023 621	88,53%	9 976 379	47 468 513	54,56%	39 531 487			
PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	1 026 183 946	829 429 364	80,83%	196 754 582	295 829 077	28,83%	730 354 869			
PO 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	117 225 015	110 209 455	94,02%	7 015 560	13 151 288	11,22%	104 073 727			
PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	663 734 672	600 645 105	90,49%	63 089 567	201 152 450	30,31%	462 582 222			
PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	97 876 729	84 264 368	86,09%	13 612 361	24 249 419	24,78%	73 627 310			
PO 13 - Technická pomoc Val	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	70 000 000	67 332 356	96,19%	2 667 644	54 003 534	77,15%	15 996 466			
CELKOM OP II			6 009 937 611	5 004 311 943	83,27%	1 005 625 668	2 259 916 626	37,60%	3 750 020 985	0	383 450 167	

Zdroj údajov: ITMS 2014+ (export dát 01.04.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

RIZIKÁ

- × komplexný OP s najväčšou alokáciou;
- × **zostáva nakontrahovať ešte 1,01 mld. EUR;**
- × **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo vyčerpaných 99,01 mil. EUR;**
- × **pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 383,45 mil. EUR (čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 440,66 mil. EUR, so 100% financovaním EÚ v 7. účt. roku bolo čerpanie vo výške 582,09 mil. EUR);**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 3,75 mld. EUR, t. j. 62,40 % z celkovej alokácie;**
- × **nedostatočný pokrok k 31.03.2021 v implementácii v rámci PO 4 (Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)) – čerpanie na úrovni 0,87 %, PO 5 (Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov) – čerpanie na úrovni 6,53 %, PO 6 (Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)) – čerpanie na úrovni 18,44 %, PO 7 (Informačná spoločnosť) – čerpanie na úrovni 20,03 %, PO 9 (Podpora výskumu, vývoja a inovácií) – čerpanie na úrovni 28,83 %, PO 10 (Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji) – čerpanie na úrovni 11,22 %, PO 11**

- (Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP) – čerpanie na úrovni **30,31 %**, **PO 12** (Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji) – čerpanie na úrovni **24,78 %**;
- × **Warning Letter Ares(2019)2836041 z 26.04.2019** – reakcia na zaslanú VKS a auditorské stanovisko zaslané EK vo februári 2019 vo vzťahu k 4. účtovnému roku – **časť implementovaná MŠVVŠ SR a MH SR**;
 - × **Warning Letter Ares (2020)1053480 z 19.2.2020** - reakcia na výsledok systémového auditu **č. A920** - z dôvodu nedostatočnej kontroly VO bol zo strany OA, RO MDaV SR určená kategória **uistenia 3** a zároveň **finančná korekcia 5%** (1,09 mil. Eur za zdroje EÚ). Dňa **15.12.2020** na základe Správy z VLA **č. A1027** bol formulovaný stupeň uistenia **Kategória 2: Systém funguje, sú však potrebné určité zlepšenia**, zároveň bola vykonaná aj validácia spätného overenia VO v rámci projektov PO 1 – 8. Overením boli identifikované 2 nedostatky, pričom nedostatočný výkon spätného overenia s vplyvom na výsledok VO bol identifikovaný v 1 prípade. Výsledkom validácie je pozitívne stanovisko k spätnému overeniu VO, finančná oprava bola navrhnutá orgánom auditu **vzhľadom na veľkosť chyby, ktorú identifikoval RO pri spätnom overení** a bola navrhnutá **na výdavky na zvyšnú časť populácie 6. účtovného roku v rámci projektov PO 1 – 8, ktoré neboli predmetom spätného overenia vo výške 4,34 %** (aj vzhľadom na stanovisko EK k výpočtu finančnej opravy) na výdavky 6. účtovného roku v rámci projektov implementovaných vo vzťahu k OP II (PO 1 – 8) a ich zohľadnenie v Účtoch za 6. účtovný rok v sume 225 351,79 EUR (trvalým stiahnutím);
 - × **Warning Letter Ares (2020)3498592 z 03.07.2020** – EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi **kartelovej dohody – stavebné firmy** v dištančnej dobe. Po tom, čo SR vzniesla požiadavku na zníženie výšky finančnej opravy a doplnila podpornú dokumentáciu sa čaká na doručenie finálneho stanoviska EK. Zároveň nie je možné deklarovať na EK žiadne výdavky za zmluvy dotknuté uvedeným zistením.
 - × **Audit EK č. REGC414SK0190** - EK vykonala audit postupov VO, EK identifikovala systémové aj projektové zistenia, pričom niektoré z nich majú finančný vplyv. Stupeň uistenia za OP Val bol klasifikovaný Kategóriou 2 – systém funguje, ale sú potrebné zlepšenia a **za OP II bol klasifikovaný Kategóriou 3** – systém funguje čiastočne, sú potrebné značné zlepšenia.



ÚLOHY PRE MINISTRA DOPRAVY A VÝSTAVBY NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 814,42 mil. EUR (EU zdroj zo schválených záväzných plánov), avšak vzhľadom na elimináciu rizika dekomitmentu na konci programového obdobia, je odporúčané v roku 2021 predložiť výdavky na CO minimálne v objeme 1,11 mld. EUR za EU zdroj. T: do 30.11.2021.
2. Odporúčame rozdeliť objem čerpania 1,11 mld. EUR pre RO a aj pre všetky SO. T: 30.04.2021.
3. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
4. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
5. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
6. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
7. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
8. Analyzovať, v spolupráci so SO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
9. Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
10. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
11. Zabezpečiť dohľad nad zrýchlením implementácie COVID projektov v gescii SO s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.
12. Pokračovať v kontrole VO v rámci novo nastavených procesov v nadväznosti na odstránenie nedostatkov z vládneho auditu A1027 (týkajúce sa finančnej nezrovnalosti v zmysle plošnej finančnej korekcie pre PO 1-8). T: priebežne.

13. Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany EK, bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby deklarovania kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku (100 % spolufinancovanie). T: bezodkladne po schválení EK.
14. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

ÚLOHY PRE PODPRESEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE (PO 7) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie prioritnej osi na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
3. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
4. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
5. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.
6. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
8. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
9. Vypracovať Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO 7 v roku 2021, v zmysle stanovených úloh, s výhľadom na roky 2022 a 2023. T: 31.05.2021.

ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 9, PO 10, PO 13) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.

10. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.
11. Zabezpečiť čerpanie veľkého projektu ACCORD na úrovni 22,9 mil. EUR, v zmysle plánu čerpania SO. T: 30.11.2021.




ÚLOHY PRE PODPRESEDU VLÁDY SR A MINISTRA HOSPODÁRSTVA (PO 9 - PO 13) NA ROK 2021


1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi (ak relevantné) a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
10. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.
11. Vykonať zúčtovanie 1.tranže FN „SIH antikorona záruky“. T: 31.05.2021.
12. Predložiť certifikačnému orgánu žiadosť o druhú tranžu na základe preukázaného zúčtovania u prijímateľov v minimálnej výške 60 % (114 mil. EUR). T: 06.06.2021.
13. Zabezpečiť súčinnosť RO pri opätovnom overení verejných obstarávaní, ktoré RO vykoná v zmysle záverov z validácie, t.j. v nadväznosti na Warning Letter Ares(2019)2836041 z 26.04.2019. T: 30.04.2021.
14. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.


ÚLOHY PRE RO NA ROKY 2022 a 2023

1. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP II a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie. T: do 31.12.2022.
2. Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý OP II minimálne v objeme 1,37 mld. EUR za EU zdroj. T: 30.11.2022.
3. Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý OP II, t.j. v objeme 1,37 mld. EUR za EU zdroj. T: 31.12.2023.

Grafické znázornenie implementácie OP II

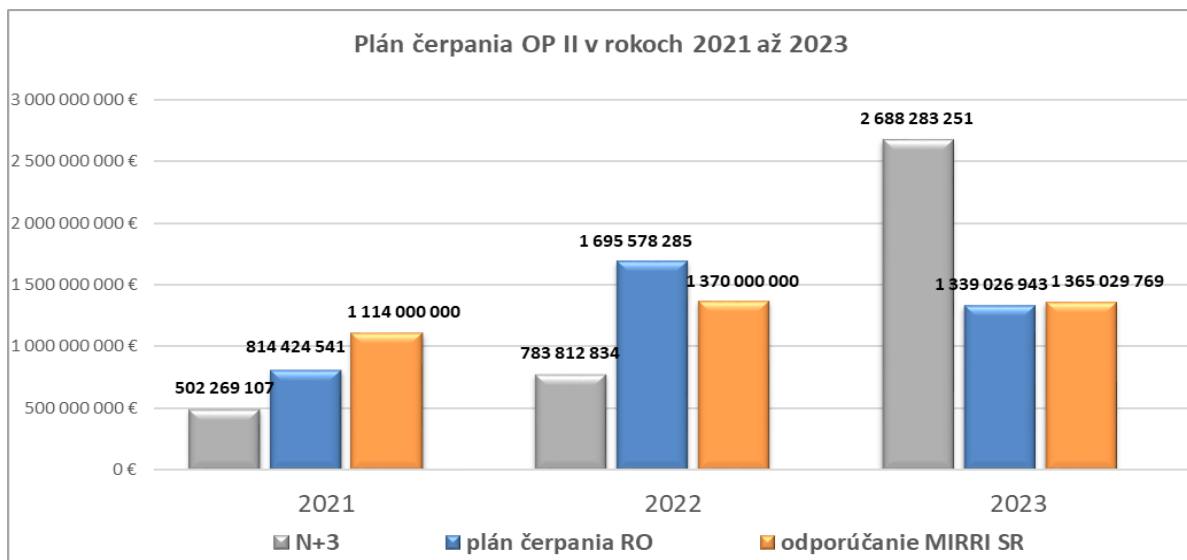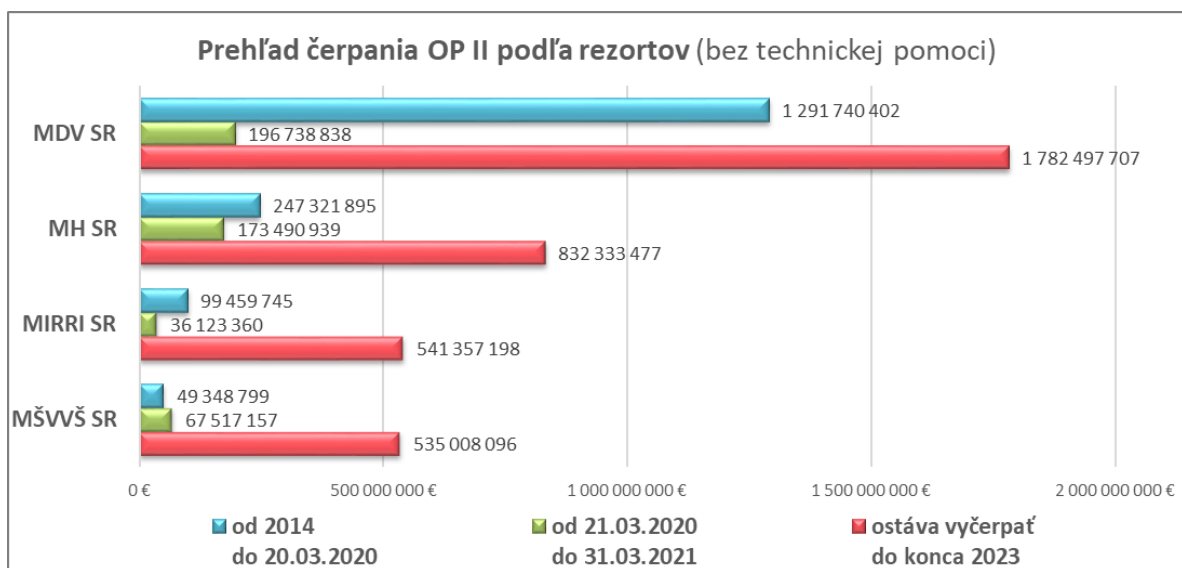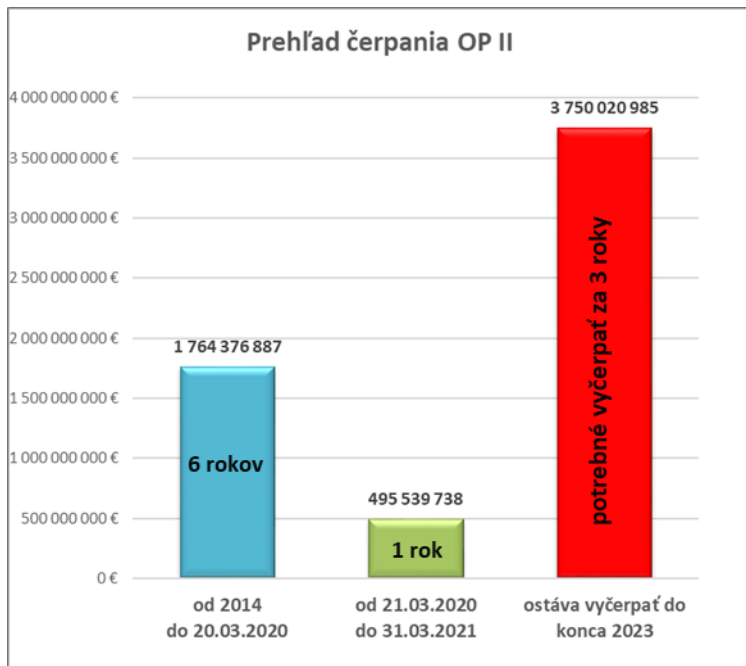

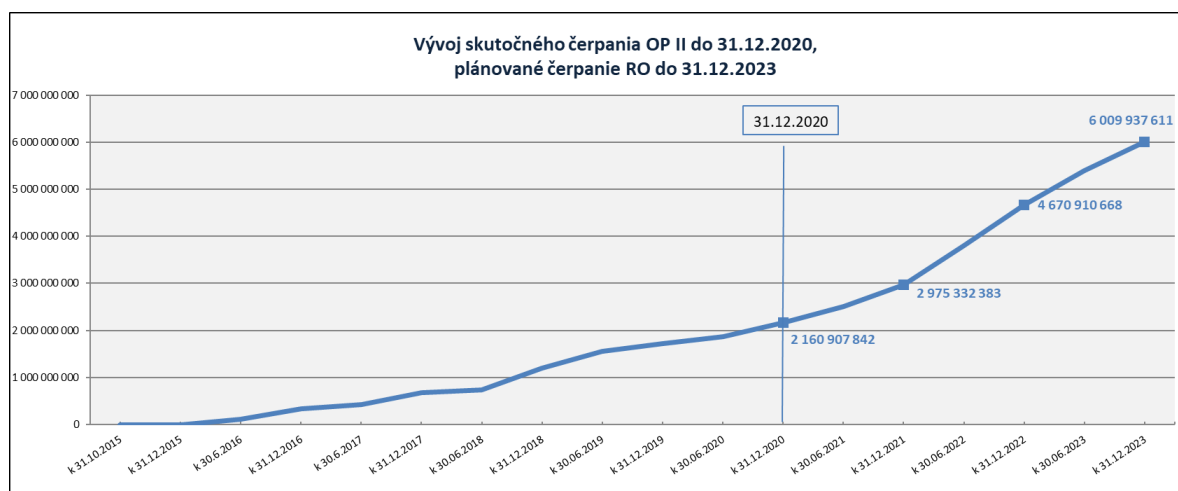



b) Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Ministerstvo kultúry SR (MK SR), 7 samosprávnych krajov a 8 krajských miest

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 1,89 mld. EUR vrátane 1. tranže REACT-EU

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.03.2021 na úrovni **1,34 mld. EUR**, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **79,07 %**;
- k 31.03.2021 je **vyčerpaných 558,44 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **32,85 %** z celkovej alokácie;
- **dekomitment** za rok 2018 bol vo výške **38,89 mil. EUR**;
- vytvorený nový špecifický cieľ 2.1.4 **Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémie COVID-19** s dodatočnou alokáciou **117,30 mil. EUR**;
- **čerpanie FN / Poskytnuté tranže (SIH)** k 31.03.2021 bolo vo výške 60 534 638,50 EUR, t.j. 10,84 % z celkového čerpania OP, z toho zúčtované tranže boli vo výške 0 EUR;
- **čerpanie FN / Poskytnuté tranže (ŠFRB)** k 31.03.2021 bolo vo výške 137 535 862,20 EUR, t.j. 24,63 % z celkového čerpania OP, z toho zúčtované tranže boli vo výške 69 582 300,73 EUR, t.j. 12,46 %.

Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej
			EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	384 029 978	288 637 208	75,16%	95 392 770	130 495 889	33,98%	253 534 089		
PO 2 - Lhší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	725 160 664	509 163 447	70,21%	215 997 217	179 744 356	24,79%	545 416 308		
PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	122 127 561	110 825 335	90,75%	11 302 226	14 508 033	11,88%	107 619 528		
PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	317 508 751	304 952 722	96,05%	12 556 029	183 465 772	57,78%	134 042 979		
PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MIRRI SR	EFRR	89 114 824	83 567 750	93,78%	5 547 074	12 112 397	13,59%	77 002 427		
PO 6 - Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	47 053 315	75,89%	14 946 685	38 115 756	61,48%	23 884 244		
CELKOM IROP:			1 699 941 778	1 344 199 776	79,07%	355 742 002	558 442 202	32,85%	1 141 499 576	194 900 000	164 234 086

RIZIKÁ

- × **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo vyčerpaných 2,44 mil. EUR;**
- × **pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do 31.12.2021 predložiť a schváliť na CO ešte 164,23 mil. EUR (čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 181,32 mil. EUR, so zohľadnením 100% financovaním z EÚ zdroja v 7. účtovnom roku bolo čerpanie vo výške 259,50 mil. EUR);**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,14 mld. EUR, t. j. 67,15 % z celkovej alokácie;**
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 2 (SO – MZ SR, VÚC), kde je čerpanie na úrovni 24,79 %;**
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 3 (SO - MK SR), kde je čerpanie na úrovni 11,88 %;**
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 5 (Miestne akčné skupiny), kde je čerpanie 13,59 %;**
- × **Warning Letter Ares (2020)3498592 a (2020)3498579 z 03.07.2020 – EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi kartelovej dohody – stavebné firmy v dištančnej dobe. Po tom, čo SR vznesla požiadavku na zníženie výšky finančnej opravy a doplnila podpornú dokumentáciu sa čaká na doručenie finálneho stanoviska EK. Zároveň nie je možné deklarovať na EK žiadne výdavky za zmluvy dotknuté „kartel issue“;**
- × **riziko zaslania ďalšieho warning listu zo strany EK v nadväznosti na zaslanú Výročnú kontrolnú správu za 6. účtovný rok zo strany OA na EK (problém - nedostatočné overovanie VO zo strany MK SR).**

ÚLOHY PRE PODPREDSEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 350,00 mil. EUR (EÚ zdroj). T: do 30.11.2021.

2. Stanoviť rozdelenie objemu čerpania 350,00 mil. EUR pre RO a aj pre všetky SO. T: 30.04.2021.
3. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU). T: do 31.12.2021.
4. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých PO), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
5. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
6. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
7. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
8. Analyzovať v spolupráci so SO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, najmä v rámci kritických prioritných osí (PO 3 a PO 5), vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
9. Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
10. Vytvoriť a priebežne doplňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
11. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR a bezodkladne zabezpečiť refundáciu týchto výdavkov pôvodne čerpaných zo štátneho rozpočtu na zdroji 111. T: priebežne.
12. Predložiť na EK revíziu IROP v súvislosti s iniciatívou REACT-EU. T: do 14.05.2021.
13. Vyhlásiť výzvy/vyzvania v rámci REACT-EU v minimálnom objeme 129 mil. EUR. T: do 15.06.2021.
14. Vyhlásiť výzvy/vyzvania v rámci REACT-EU v celom objeme zdrojov pridelenom na rok 2021 (194,90 mil. EUR). T: 31.10.2021.
15. Zabezpečiť v roku 2021 čerpanie z prioritnej osi REACT-EU minimálne v objeme 50 mil. EUR. T: do 30.11.2021.
16. Vypracovať a predložiť harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci IROP za rok 2021, rozdelený po mesiacoch. T: do 30.4.2021.
17. Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany EK, bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby deklarovania kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku (100 % spolufinancovanie). T: bezodkladne po schválení EK.
18. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH a ŠFRB. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za FN, ktoré budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov z FN ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

ÚLOHY PRE MINISTERKU KULTÚRY (PO 3) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie prioritnej osi na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
3. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
4. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
5. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
6. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.

8. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
9. Zabezpečiť plánované čerpanie strategických projektov z centralizovanej výzvy v objeme min. 11 mil. EUR. T: do 30.11. 2021.
10. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

ÚLOHY PRE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA (PO 2) NA ROK 2021




1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
10. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR a bezodkladne zabezpečiť refundáciu týchto výdavkov pôvodne čerpaných zo štátneho rozpočtu na zdroji 111. T: priebežne.
11. Zabezpečiť vyhlásenie výziev a vyzvaní na zostávajúcu finančnú alokáciu určenú na COVID projekty. T: do 30.04.2021.
12. Zabezpečiť čerpanie COVID projektov v zmysle plánu čerpania SO, minimálne vo výške 25 mil. EUR. T: do 30.11.2021.
13. Zabezpečiť medializáciu a komunikáciu v zmysle požiadavky EK v súvislosti s pripravovanými COVID výzvami/vyzvaniami. T: priebežne.
14. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako v prípade potreby prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.


ÚLOHY PRE RO NA ROKY 2022 a 2023


1. Zabezpečiť kontrahovanie celého IROP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU). T: do 31.12.2022.
2. Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý IROP minimálne v objeme 494,42 mil. EUR za EU zdroj. T: 30.11.2022.

3. Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý IROP, t.j. v objeme 494,42 mil. EUR za EU zdroj.
T: 31.12.2023.

Grafické znázornenie implementácie IROP

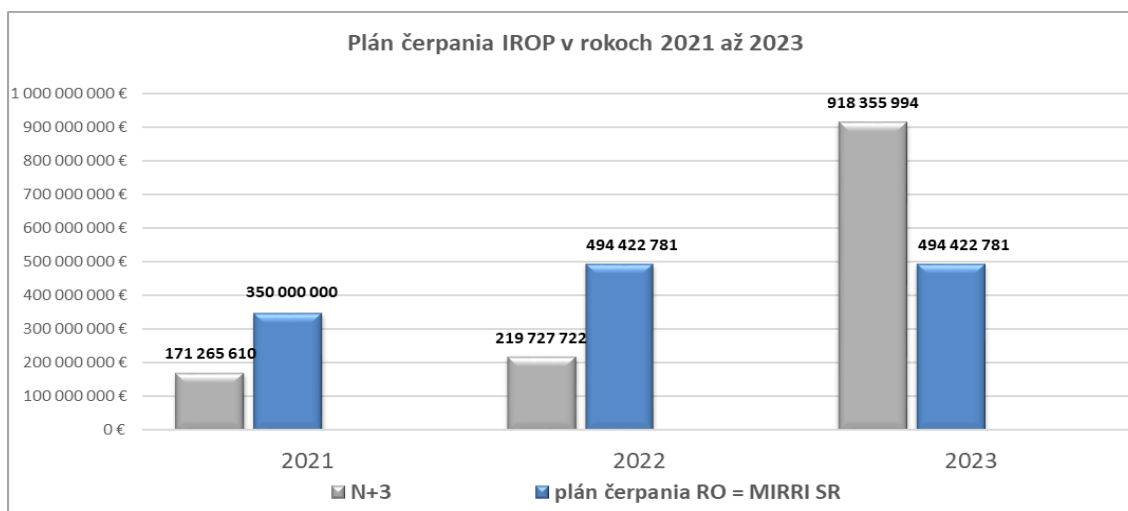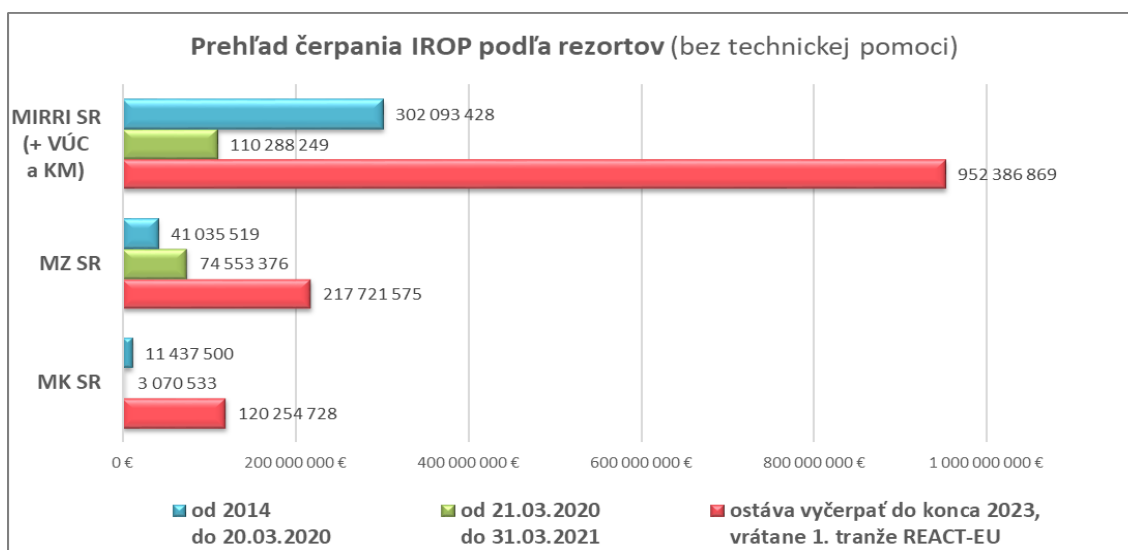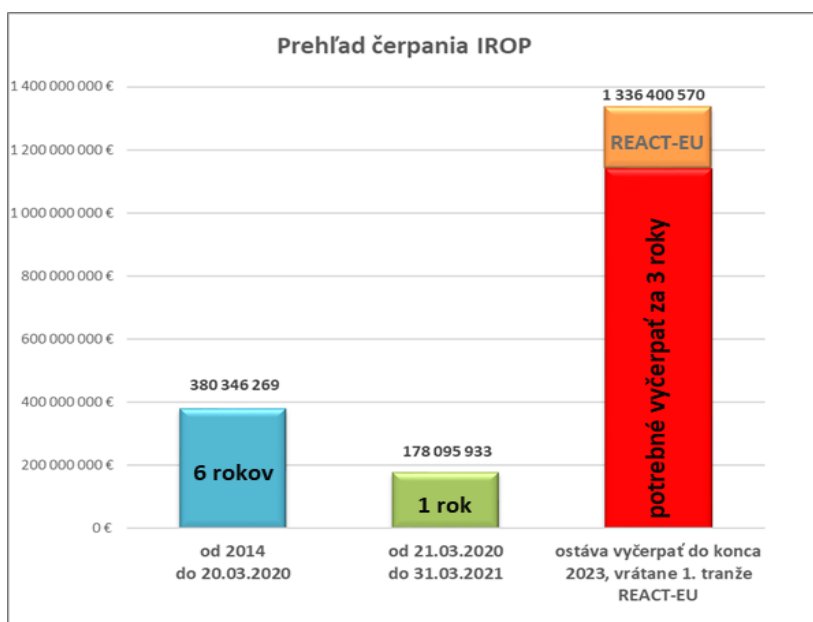

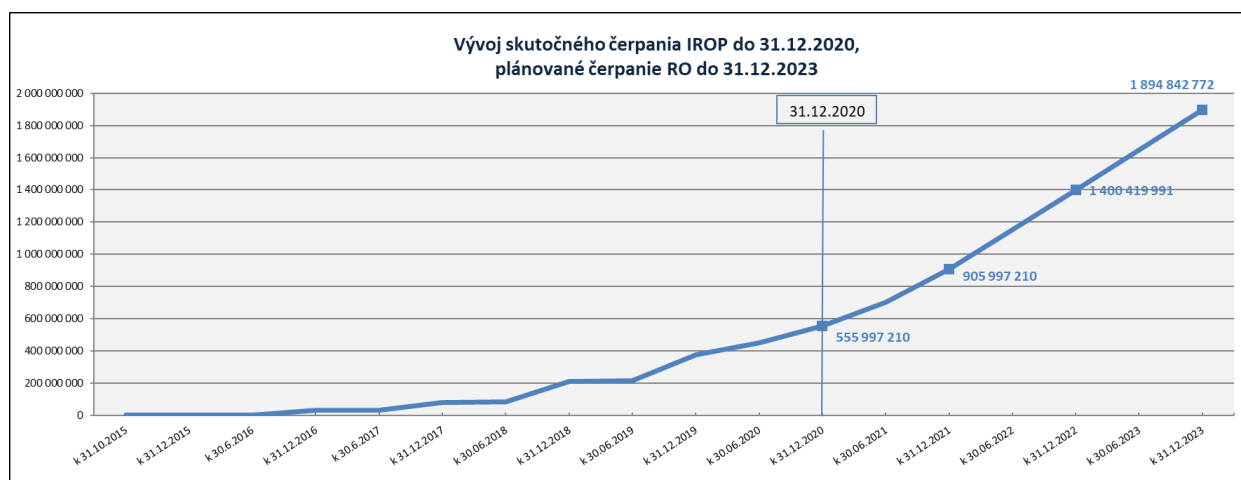



c) Operačný program Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Slovenská agentúra ŽP (SAŽP), Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Ministerstvo hospodárstva SR (Slovenská inovačná a energetická agentúra - SIEA)

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 2,83 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.03.2021 na úrovni **2,02 mld. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **71,20 % (OP s druhým najnižším kontrahovaním)** ;
- **čerpanie** je k 31.03.2021 na úrovni **1,20 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **42,34 %** z celkovej alokácie;
- **čerpanie FN / Poskytnuté tranže (SIH)** k 31.03.2021 bolo vo výške 30 034 251 EUR, t.j. 2,5 % z celkového čerpania OP, z toho zúčtované tranže boli vo výške 0 EUR.

Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidiel N+3 v zmysle novej
			EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
PO 1 - Udržiavateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 498 481 123	1 008 767 959	67,32%	489 713 164	670 305 419	44,73%	828 175 704		
PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	225 381 138	122 808 038	54,49%	102 573 100	33 919 488	15,05%	191 461 650		
PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	171 530 740	70,33%	72 365 476	62 509 965	25,63%	181 386 251		
PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	651 898 624	82,75%	135 874 189	378 239 864	48,01%	409 532 949		
PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	61 677 855	80,10%	15 322 145	54 431 717	70,69%	22 568 283		
CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	2 016 683 217	71,20%	815 848 073	1 199 406 453	42,34%	1 633 124 837	0	246 630 226

RIZIKÁ

- × **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo vyčerpaných 63,31 mil. EUR;**
- × **pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 246,63 mil. EUR (čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 278,62 mil. EUR, so zohľadnením 100% financovania z EÚ zdroja v 7. účtovnom roku bolo čerpanie vo výške 289,94 mil. EUR);**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,63 mld. EUR, t. j. 57,66 % z celkovej alokácie;**
- × **druhé najnižšie percento kontrahovania v porovnaní s ostatnými OP (71,20 % z celkovej alokácie), ostáva zakontrahovať ešte 815,85 mil. EUR cez národné alebo dopytovo-orientované projekty;**
- × **nerovnomerný plán čerpania na roky 2021, 2022 a 2023, kumulovanie vysokého objemu čerpania výdavkov až v poslednom roku 2023 (2021 – 313,79 mil. EUR, 2022 - 383,53 mil. EUR, 2023 – 999,22 mil. EUR);**
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 2 (SO-SAŽP - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami) – čerpanie na úrovni 15,05 %;**
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 3 (SO-MV SR a SO-SAŽP - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy) – čerpanie na úrovni 25,63 %;**
- × **nedostatočný pokrok v implementácii finančných nástrojov prostredníctvom SIH v PO 1 a PO 4, aktuálne čerpanie je na úrovni 25 % zo zazmluvnenej sumy za prvú tranžu;**
- × **v nadväznosti na uzavretie zistenia z follow up auditu EK na KŽP č. REGC414SK0114 týkajúceho sa kartelu – stavebných firiem, EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi kartelovej dohody v dištančnej dobe, a zároveň v nadväznosti na Warning Letter Ares (2020)3498579 z 03.07.2020 nie je možné deklarovať na EK žiadne výdavky za zmluvy dotknuté uvedeným zistením. Po tom, čo SR vznesla požiadavku na zníženie výšky finančnej opravy a doplnila podpornú dokumentáciu sa čaká na doručenie finálneho stanoviska EK.**



ÚLOHY PRE MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 328,22 mil. EUR (zo schválených záväzných plánov), avšak vzhľadom na elimináciu rizika dekomitmentu na konci programového obdobia, je odporúčané v roku 2021 predložiť výdavky na CO minimálne v objeme 400,00 mil. EUR za EU zdroj. T: do 30.11.2021.
2. Odporúčame rozdeliť objem čerpania 400,00 mil. EUR pre RO a aj pre všetky SO. T: 30.04.2021.
3. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
4. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
5. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
6. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
7. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
8. Analyzovať, v spolupráci so SO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
9. Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
10. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
11. Zabezpečiť zrýchlenie implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.
12. Prijatť opatrenia na zrýchlenie implementácie a čerpania v rámci nevykonných PO 2 a PO 3. T: 31.05.2021.
13. Vypracovať Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania celého OP KŽP v roku 2021, v zmysle stanovených úloh, s výhľadom na roky 2022 a 2023. T: 31.05.2021.
14. Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany EK, bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby deklarovania kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku (100 % spolufinancovanie). T: bezodkladne po schválení EK.
15. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA (PO 3) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.

9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
10. Zabezpečiť zrýchlenie implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne
11. Prijíť opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii MV SR v rámci PO 3. T: priebežne.
12. Dôsledne monitorovať pokrok v implementácii rizikového COVID projektu „Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandemiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR“. Do 05/2021 predložiť výdavky za projekt „Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandemiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR“.



ÚLOHY PRE PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA HOSPODÁRSTVA (PO 4) NA ROK 2021


1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
10. Zabezpečiť zrýchlenie implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne
11. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.


ÚLOHY PRE RO NA ROKY 2022 a 2023

1. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP KŽP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie. T: do 31.12.2022.
2. Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý OP KŽP minimálne v objeme 648,27 mil. EUR za EU zdroj. T: 30.11.2022.
3. Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý OP KŽP, t.j. v objeme 648,27 mil. EUR za EU zdroj. T: 31.12.2023.

Grafické znázornenie implementácie OP KŽP

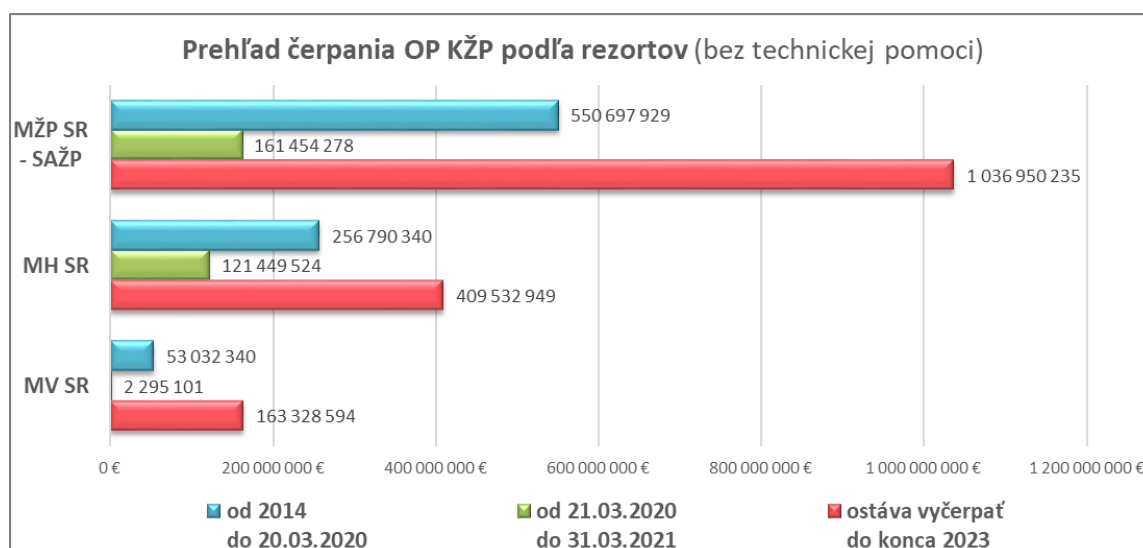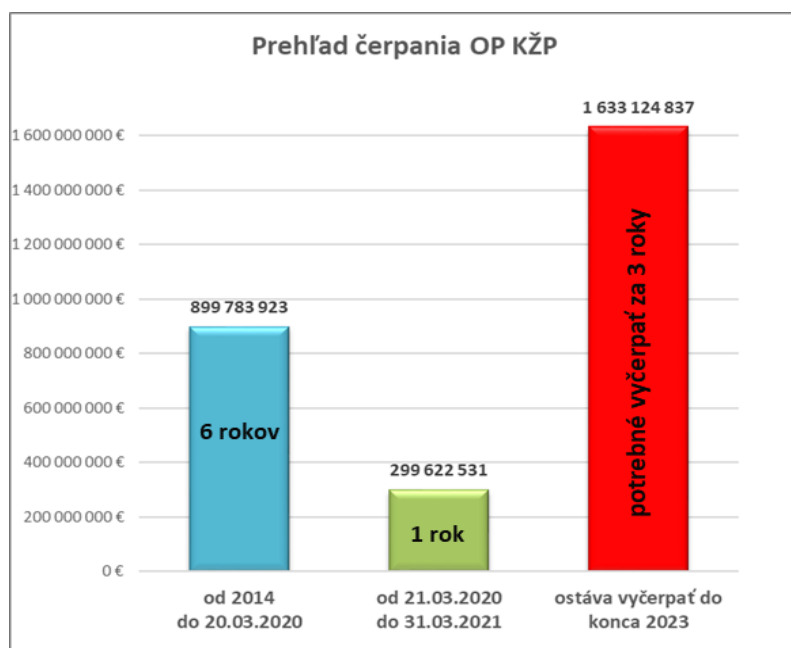

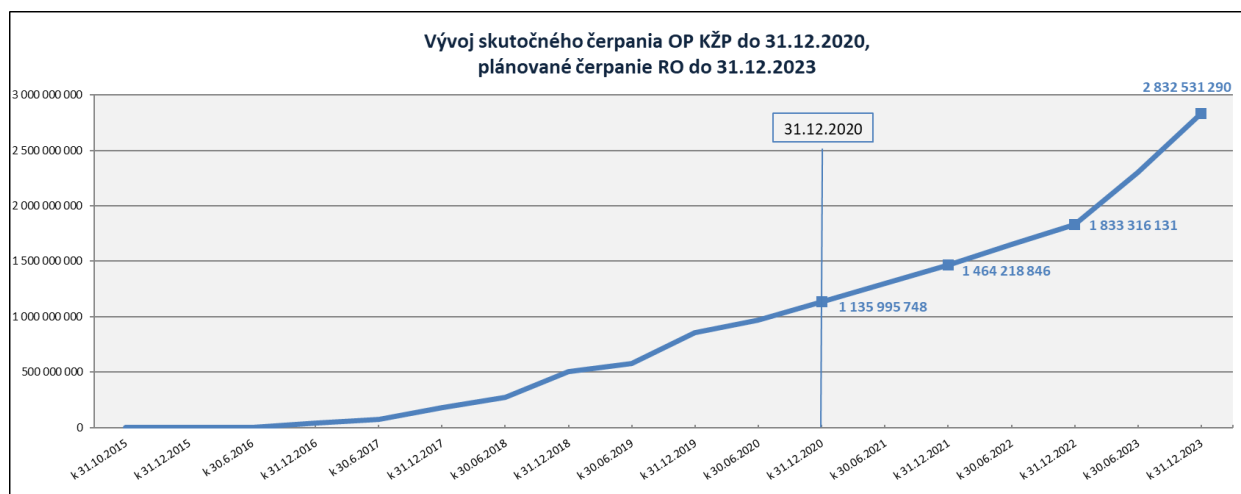



d) Program Interreg V-A SK-AT

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR); Alokácia: 75,89 mil. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.03.2021 na úrovni **60,81 mil. EUR** podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **80,13 %**;
- **čerpanie** je k 31.03.2021 na úrovni **18,06 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **23,79 %** z celkovej alokácie;

Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva na kontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
			EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	
1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	15 712 689	79,83%	3 970 453	5 091 128	25,87%	14 592 014		
2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	27 820 000	25 632 403	92,14%	2 187 597	6 866 597	24,68%	20 953 403		
3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	9 655 000	5 025 880	52,05%	4 629 120	0	0,00%	9 655 000		
4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	10 016 045	70,63%	4 164 934	3 982 108	28,08%	10 198 871		
5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	4 425 793	97,19%	127 767	2 118 688	46,53%	2 434 872		
CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	60 812 810	80,13%	15 079 871	18 058 521	23,79%	57 834 160	0	11 403 511

RIZIKÁ

- × **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo vyčerpaných 242 107 EUR;**
- × pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 11,40 mil. EUR (čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 10,21 mil. EUR, so 100% financovaním EÚ v 7. účt. roku bolo čerpanie vo výške 12,70 mil. EUR);
- × do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 57,83 mil. EUR, t. j. 76,21 % z celkovej alokácie;
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 3 (Podpora udržateľných dopravných riešení) – kontrahovanie na úrovni 52,05 % a čerpanie na úrovni 0,00% .
- × rizikový program, ktorý pravidelne napĺňa pravidlo N+3 v poslednom kvartáli roka,
- × **špecifický charakter projektov**, tzn. za účasti cezhraničného partnera a pri malých alokáciách na projekty.

ÚLOHY PRE PODPREDSEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE NA ROK 2021



1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 17,00 mil. EUR (EU zdroj). T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie celého programu a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
7. Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, najmä v rámci kritickej prioritnej osi 3, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.


10. Vypracovať a predložiť harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci programu za rok 2021, rozdelený po mesiacoch. T: do 30.4.2021.
11. Vypracovať a predložiť plán vyhlasovania výziev na nezazmluvnené prostriedky v rámci programu. T: do 30.04.2021.
12. Zabezpečiť skrátenie procesu výkonu prvostupňovej kontroly predložených výdavkov zo strany prijímateľov (first level control). T: priebežne.


ÚLOHY PRE RO NA ROKY 2022 a 2023

1. Zabezpečiť kontrahovanie celého programu a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie. T: do 31.12.2022.
2. Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý program minimálne v objeme 20,54 mil. EUR za EU zdroj. T: 30.11.2022.
3. Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý program, t.j. v objeme 20,54 mil. EUR za EU zdroj. T: 31.12.2023.

Grafické znázornenie implementácie Interreg SK-AT

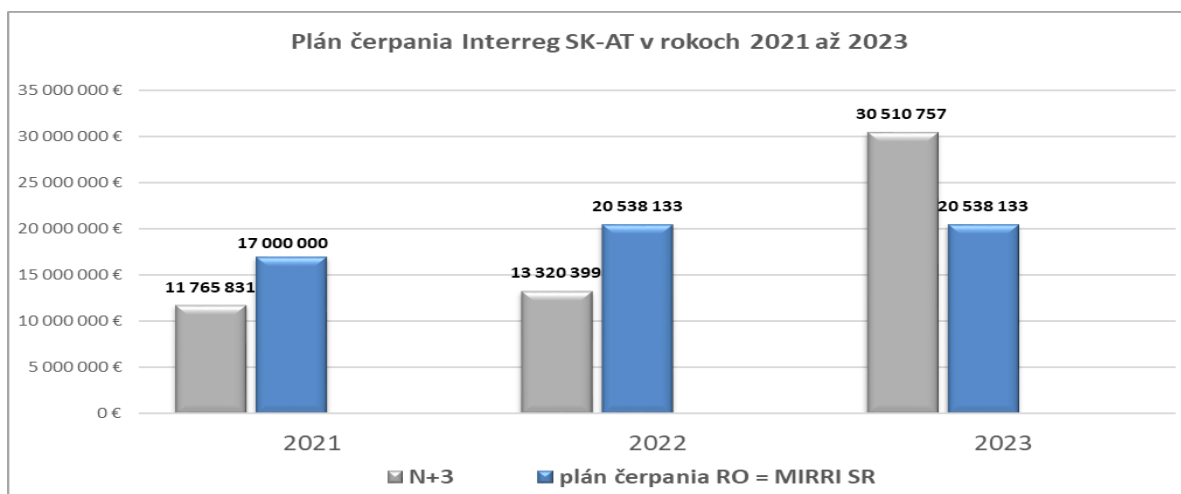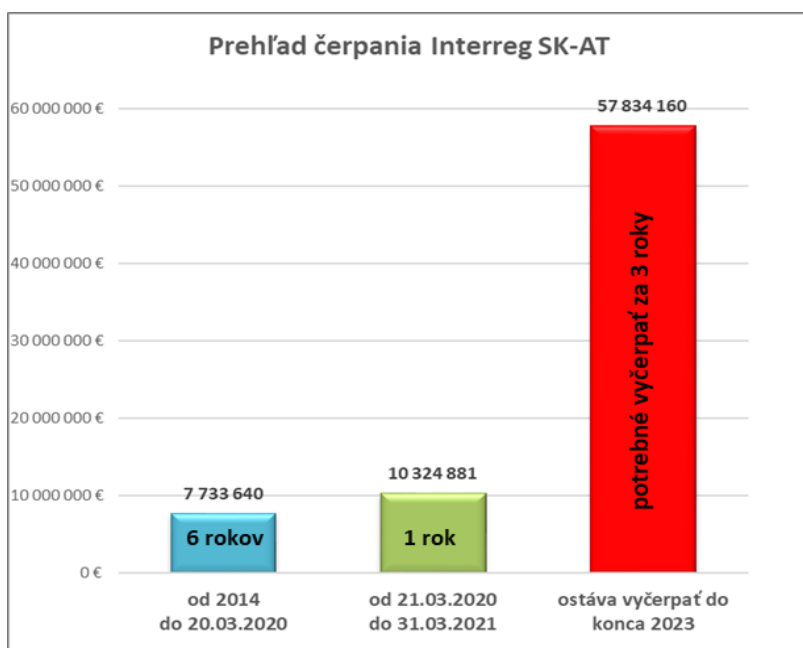

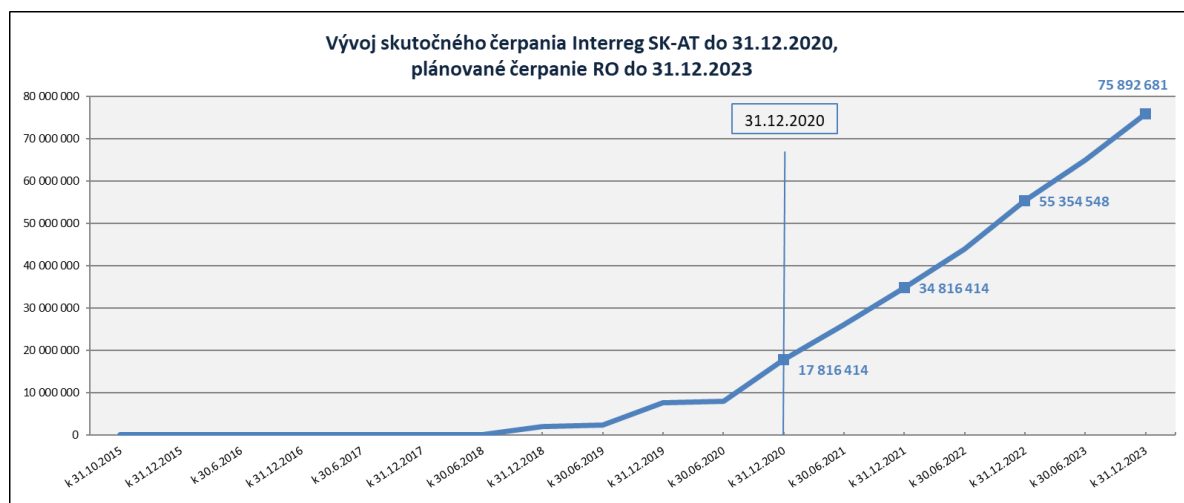



e) Program Interreg V-A SK-CZ

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR); **Alokácia: 90,14 mil. EUR**

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.03.2021 na úrovni **72,42 mil. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **80,34 %**;
- **čerpanie** je k 31.03.2021 na úrovni **31,70 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **35,17 %** z celkovej alokácie.

Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
			EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	
1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	10 239 428	77,17%	3 029 101	2 750 472	20,73%	10 518 057		
2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	48 798 095	78,28%	13 542 357	23 494 739	37,69%	38 845 713		
3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	8 455 609	92,69%	666 506	2 763 709	30,30%	6 358 406		
4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	4 921 868	91,00%	486 499	2 689 313	49,73%	2 719 054		
CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	72 415 001	80,34%	17 724 462	31 698 233	35,17%	58 441 230	0	6 614 106

RIZIKÁ

- × **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo vyčerpaných 4,67 mil. EUR;**
- × **pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 6,61 mil. EUR (čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 15,76 mil. EUR, so 100% financovaním EÚ v 7. účt. roku bolo čerpanie vo výške 14,94 mil. EUR);**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 58,44 mil. EUR, t. j. 64,83 % z celkovej alokácie;**
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 1 (Využívanie inovač. potenciálu) - čerpanie na úrovni 20,73 %;**
- × **rizikový program, ktorý pravidelne napĺňa pravidlo N+3 v poslednom kvartáli roka;**
- × **špecifický charakter projektov, tzn. za účasti cezhraničného partnera a pri malých alokáciách na projekty.**



ÚLOHY PRE PODPRESEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE NA ROK 2021



1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 18,00 mil. EUR (EÚ zdroj). T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie celého programu a jednotlivých prioritných osí na konci roka 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roka 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplňiť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
7. Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, najmä v rámci kritickej prioritnej osi 1, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
10. Vypracovať a predložiť plán vyhlasovania výziev na nezazmluvnené prostriedky v rámci programu. T: do 30.04.2021.
11. Zabezpečiť skrátenie procesu výkonu prvostupňovej kontroly predložených výdavkov zo strany prijímateľov (first level control). T: priebežne.


12. Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany EK, bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby deklarovania kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku (100 % spolufinancovanie). T: bezodkladne po schválení EK.


ÚLOHY PRE RO NA ROKY 2022 a 2023

1. Zabezpečiť kontrahovanie celého programu a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie. T: do 31.12.2022.
2. Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý program minimálne v objeme 22,56 mil. EUR za EU zdroj. T: 30.11.2022.
3. Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý program, t.j. v objeme 22,56 mil. EUR za EU zdroj. T: 31.12.2023.

Grafické znázornenie implementácie Interreg SK-CZ

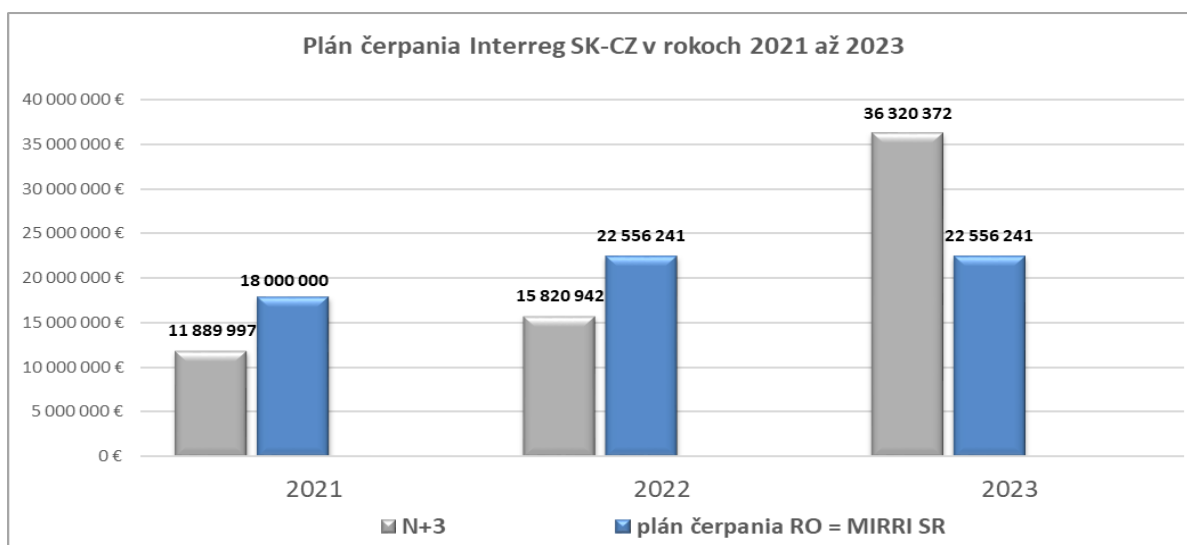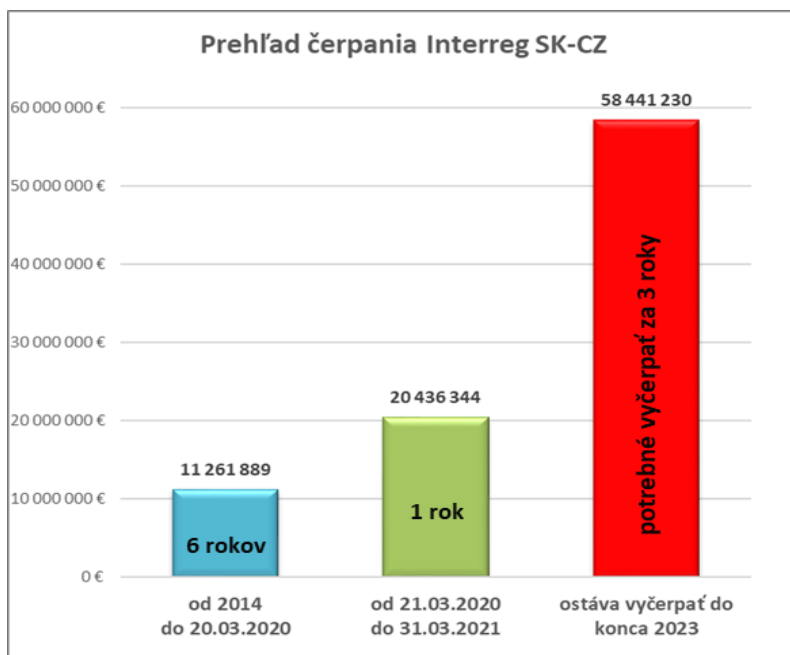

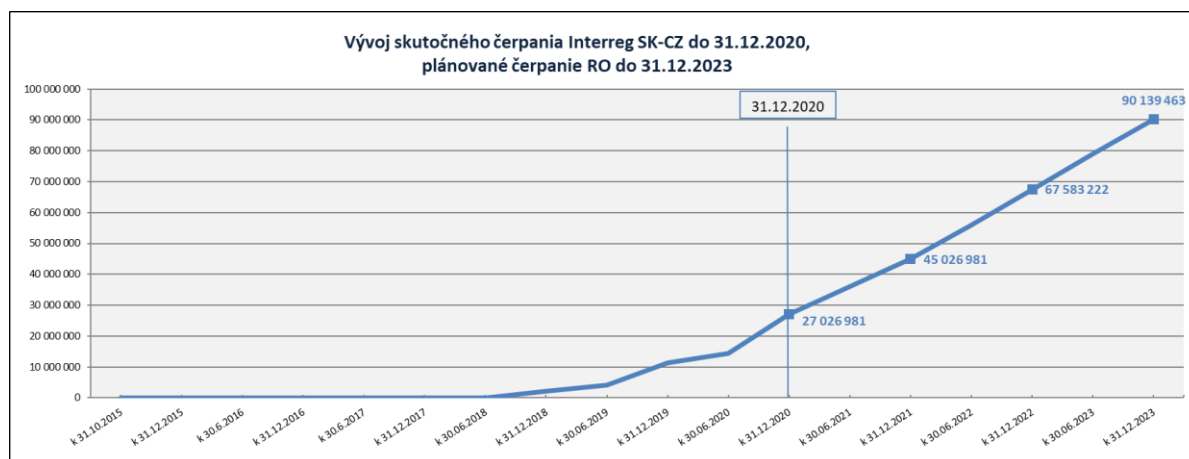



f) Operačný program Rybné hospodárstvo

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)

Financované EÚ z: Európsky národný a rybársky fond (ENRF)

Alokácia: 11,81 mil. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.03.2021 na úrovni **3,61 mil. EUR** z EÚ zdrojov, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **30,54 %**;
- **čerpanie** je k 31.03.2021 na úrovni **1,11 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **9,37 %** z celkovej alokácie;
- trvá prerušenie lehoty na úhradu žiadostí o platbu v zmysle čl. 83 nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 1303/2013;
- **dekompitment za rok 2018 bol vo výške 1,88 mil. EUR a za rok 2019 vo výške 1,14 mil. EUR;**
- **strata výkonnostnej rezervy vo výške 0,95 mil. EUR;**
- **dekompitment za rok 2020 sa očakáva vo výške 1,50 - 2,24 mil. EUR** (v závislosti od stanoviska EK ohľadom udelenia výnimky podľa čl. 87 všeob. nar. týkajúcej sa zrušenia viazanosti časti záväzku z dôvodu vyššej moci);

Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.	
			EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	6 863 860	2 383 436	34,72%	4 480 424	313 999	4,57%	6 549 861			
PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	965 998	114 405	11,84%	851 593	0	0,00%	965 998			
PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	3 045 860	663 987	21,80%	2 381 873	586 608	19,26%	2 459 252			
PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	937 100	445 313	47,52%	491 787	206 612	22,05%	730 488			
CELKOM OP RH:			11 812 818	3 607 141	30,54%	8 205 677	1 107 219	9,37%	10 705 599	0	1 925 227	

RIZIKÁ



- × **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo čerpanie nulové;**
- × pre naplnenie pravidla N+3 je **potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO** finančné prostriedky vo výške **1,93 mil. EUR**, čo predstavuje dvojnásobok toho, čo bolo vyčerpané za OP RH počas šiestich rokov implementácie (čerpanie v roku 2020 bolo vo výške len 20 036 EUR (EÚ zdroj));
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 10,71 mil. EUR**, t. j. **90,63 %** z celkovej alokácie;
- × nízky záujem potencionálnych žiadateľov o NFP;
- × EK listom Ref.Ares (2020)142428 z 10.01.2020 **prerušila lehoty na úhradu platieb**. RO dňa 27.11.2020 zaslal list č. 47958/2020 v ktorom informuje EK o prijatých preventívnych a nápravných opatreniach. Následne orgán auditu listom č. MF/019699/2020-1473 zo dňa 14.12.2020 zaslal EK vyjadrenia k nápravným opatreniam RO k zisteniam, ktoré identifikoval v rámci vládneho auditu za 5. ÚR (VLA A953). OA v rámci **vládneho auditu č. A 1017** za 6. ÚR identifikoval opakujúce sa a nové nedostatky (hlavne z oblasti overovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku), vypočítal **mieru chybovosti na úrovni 41,89 %**, a s ohľadom na závery z hodnotenia riadneho fungovania systému riadenia a kontroly a overovaných kľúčových požiadaviek **stanovil kategóriu 4, t. j. systém v podstate nefunguje, čo bude mať vplyv na ŽoP na EK;**
- × **neprijatie adekvátnych nápravných opatrení vyplývajúcich z auditov na odblokovanie platieb z EK;**
- × Dňa 22.12.2020 bol zo strany EK zaslaný list Ref.Ares(2020)7838253 z 21.12.2020, v ktorom EK informovala o príprave nového programového obdobia v rámci ENRF. Vzhľadom na súčasnú celosvetovú situáciu je potrebné začať čo najskôr so schvaľovaním potrebných dokumentov a následne so samotnou implementáciou nového OP, keďže už od 01.01.2021 plynie obdobie oprávnenosti výdavkov.


ÚLOHY PRE MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA NA ROK 2021


1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 vo výške minimálne 2,69 mil. EUR za EU v zmysle schváleného záväzného plánu T: do 30.11.2021.
2. Vypracovať a predložiť harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci OP za rok 2021 rozdelený po mesiacoch, T: do 31.05.2021

3. Splniť opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov z vládneho auditu A1017 a predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení na OA. T: do 30.04.2021
4. Zabezpečiť konsolidáciu implementácie OP RH, stabilizovať a posilniť administratívne kapacity na RO a prijať všetky nápravné opatrenia na naštartovanie celého operačného programu. T: 30.04.2021.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
7. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.

Grafické znázornenie implementácie OP RH

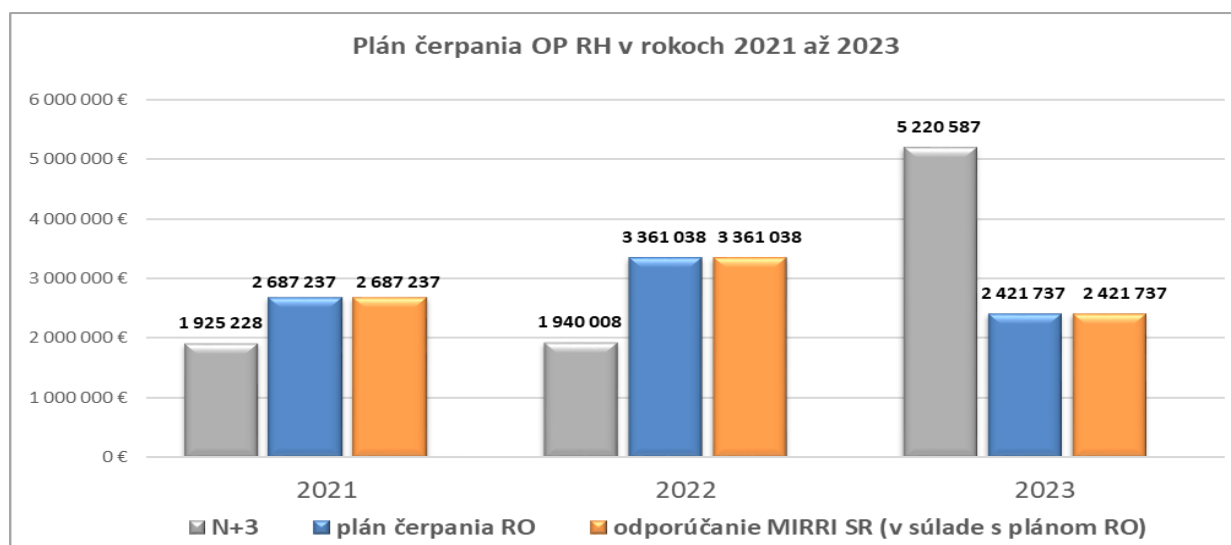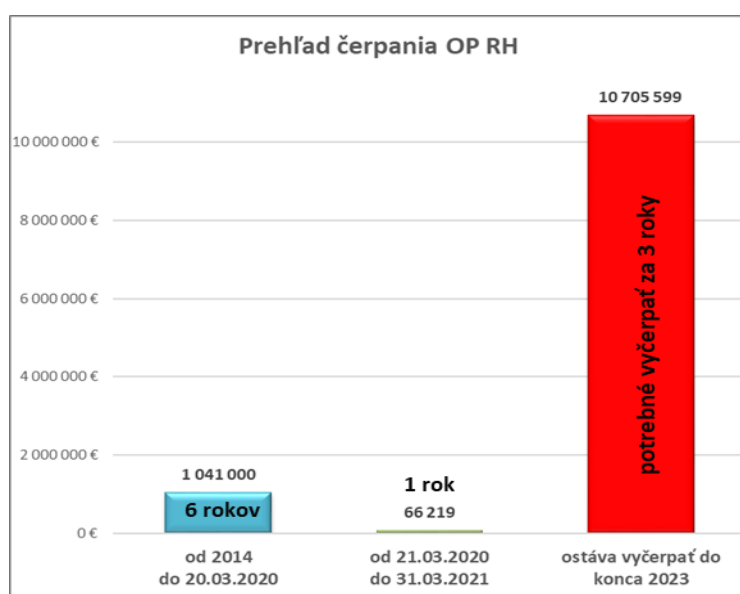

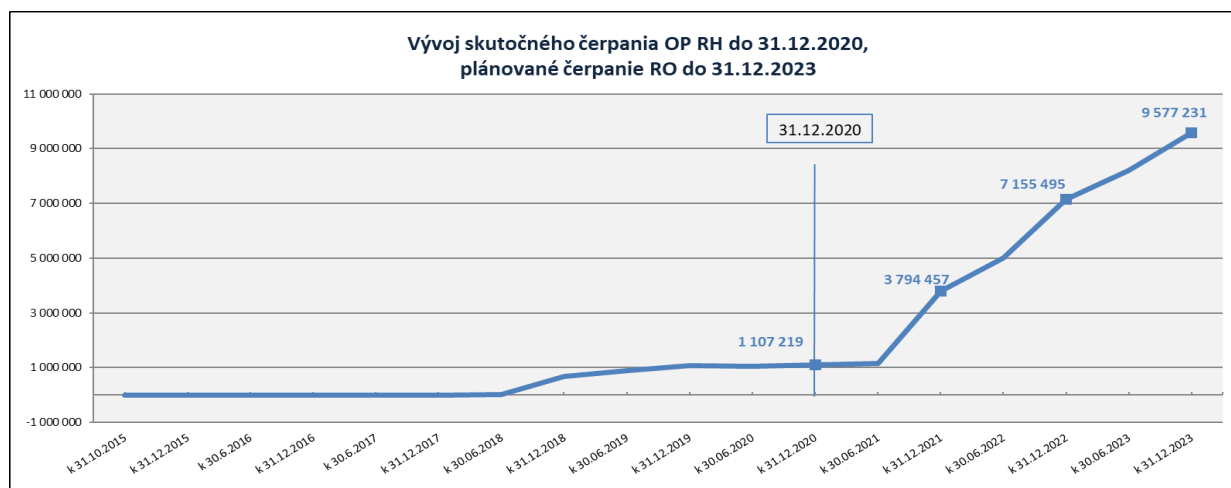



g) Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Implementačná agentúra MPSVaR SR (IA MPSVaR SR)

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)

Alokácia: 2,93 mld. EUR vrátane 1. tranže z REACT-EU

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** k 31.03.2021 je na úrovni **2,65 mld. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **101,25 %**;
- **čerpanie** k 31.03.2021 je na úrovni **1,55 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **59,42 %** z celkovej alokácie;
- pravidlo N+3 je pre roky 2021 a 2022 splnené;
- **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo vyčerpaných 216,95 mil. EUR (EÚ zdroj)**;
- v rámci boja proti pandémie **COVID-19** a zmierňovania jej dopadov boli realokované dodatočné zdroje pre PO 3 vo výške 410,26 mil. EUR;
- **čerpanie FN / Poskytnuté tranže (SIH)** k 31.03.2021 bolo vo výške 15 315 129 EUR, t.j. 1,0 % z celkového čerpania OP, z toho zúčtované tranže boli vo výške 0 EUR.

Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT-EU (1. tranža)	Ostáva predpísať a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej lea
			EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	
PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	348 741 004	326 414 601	93,60%	22 326 403	108 080 474	30,99%	240 660 530		
PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF+IZM	172 270 942	206 429 305	119,83%	-34 158 363	152 136 741	88,31%	20 134 201		
PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	1 390 174 951	104,43%	-58 952 155	967 765 066	72,70%	363 457 730		
PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	328 142 689	109,50%	-28 473 377	156 015 195	52,06%	143 654 117		
PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunit	SO: MV SR	ESF	161 954 885	152 905 444	94,41%	9 049 441	70 164 299	43,32%	91 790 586		
PO 6 - Technická vybavenosť v oblastiach s prítomnosťou MFRK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	166 044 449	75,23%	54 663 128	43 164 557	19,56%	177 543 020		
PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	75 739 338	96,36%	2 860 662	55 406 813	70,49%	23 193 187		
CELKOM OP IZ			2 613 166 516	2 645 850 776	101,25%	-32 684 260	1 552 733 145	59,42%	1 060 433 371	316 830 000	0

RIZIKÁ

- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,06 mld. EUR, t.j. 40,58 % z celkovej alokácie;**
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 1 (SO-MŠVVaŠ SR)** - čerpanie na úrovni **30,99 %**;
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 6 (SO-MV SR)** – čerpanie na úrovni **19,56 %**;
- × **Warning Letter Ares (2020)2544197 zo 14.5.2020** - reakcia na vyhlásenie auditorskej skupiny k VKS a na výsledok auditu operácií č. **A1010**. EK upozorňuje hlavne na závažné nedostatky v postupoch overovania VO a vo fungovaní SO MV SR (PO 6), schvaľovanie súhrnných ŽoP na národnej úrovni nie je prerušené, je možné na CO predkladať výdavky, pri ktorých RO nemá pochybnosti o ich zákonnosti, oprávnenosti a správnosti. OA na základe vykonanej auditorskej práce konštatoval vo VKS, že identifikácia príčin vzniku nedostatkov v súvislosti s vykonaným spätným overením nebola zo strany SO MV SR dostatočne zanalyzovaná. Populácia pre spätné overenie bola vybraná najmä na základe identifikovania konkrétnych zamestnancov, ktorí nedostatočne vykonali kontrolu VO, pričom v rámci vládnych auditov č. A1020 a č. A1040 boli identifikované nedostatky aj u iných zamestnancov vykonávajúcich kontrolu VO. Vysoký počet identifikovaných nedostatkov má vplyv na účinnosť nastaveného systému riadenia a kontroly a hrozí riziko vzniku ďalších neoprávnených výdavkov. RO/SO na základe výsledkov auditu č. A1020 a č. A1040 prijal nápravné opatrenia na odstránenie dodatočných zistení. Ich posúdenie bude predmetom overenia v rámci aktuálne prebiehajúceho vládneho auditu;
- × dňa 01.03.2021 bol doručený návrh správy z auditu EK č. EMPG314SK0738, pričom existuje vysoká pravdepodobnosť vzniku značného objemu neoprávnených výdavkov.



ÚLOHY PRE MINISTRA PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 671,01 mil. EUR (EU zo schválených záväzných plánov). T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU). T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.
7. Analyzovať, v spolupráci so SO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi (najmä PO 6) a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
10. Zabezpečiť zrýchlenie implementácie COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR a bezodkladne zabezpečiť refundáciu týchto výdavkov pôvodne čerpaných zo štátneho rozpočtu na zdroji 111. T: priebežne
11. Predložiť na EK revíziu OP LZ v súvislosti s iniciatívou REACT-EU. T: 20.04.2021.
12. Vyhlásiť výzvy/vyzvania na REACT-EU 1. etapa do 15.06.2021 a 2. etapa do 30.11.2021.
13. Vytvoriť pracovnú skupinu pre podporu kontroly VO v rámci SO PO6 a zabezpečiť jej chod a činnosť. T: 15.05.2021.
14. Pripraviť v spolupráci s SO MV SR, CKO a ÚVO vzorové súťažné podmienky pre podlimitné stavebné práce pre konečných prijímateľov. T: 30.04.2021.
15. Vykonať školenia pre používateľov vzorových súťažných podmienok. T: do 31.05.2021.
16. Prijíť adekvátne opatrenia na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z vládneho auditu č. A1010, na základe ktorého bol zo strany EK zaslaný WL (2020)2544197 zo dňa 14.05.2020. Poskytnúť relevantné informácie, ako RO zlepšil dohľad nad úlohami delegovanými na MV SR, ako MV SR zlepšilo postupy overovania VO. Ako SO zabezpečil identifikáciu nezrovnalostí v rámci rizikovej populácie a zabezpečil vymáhanie dlžnej sumy od prijímateľov. Aj vzhľadom na výsledky auditu č. A1020, ktorým sa overovali opatrenia na odstránenie nedostatkov z auditu č. A1010. T: 30.04.2021.
17. V spolupráci s SO MŠVVŠ SR a MV SR monitorovať prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie PO 1 a PO 6. T: štvrťročne.
18. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 1) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme minimálne 105 mil. EUR. T: 30.11.2021.
2. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
3. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
4. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.

- 5 Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.
- 6 Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
- 7 Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
- 8 Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
- 9 Zabezpečiť zrýchlenie implementácie COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR T: priebežne.



ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA (PO 5 a PO 6) NA ROK 2021



1. V rámci PO 6 zabezpečiť čerpanie v roku 2021 vo výške minimálne 36 mil. EUR. T: 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie prioritnej osi 6 na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
10. Zabezpečiť zrýchlenie implementácie COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.
11. Pripraviť v spolupráci s RO, CKO a ÚVO vzorové súťažné podmienky pre podlimitné stavebné práce pre konečných prijímateľov. T: 30.04.2021.
12. Vykonať školenia v spolupráci s RO a ÚVO školenie pre používateľov vzorových súťažných podmienok. T: do 31.05.2021.
13. SO vytvorí podmienky a aktívnu podporu pre pracovnú skupinu pre podporu kontroly VO, ktorú vytvorí RO OP LZ. T: 15.05.2021 a priebežne.
14. Vypracovať Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO 6 v roku 2021, v zmysle stanovených úloh, s výhľadom na roky 2022 a 2023. T: 31.05.2021.
15. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne v prípade potreby prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako v prípade potreby prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

ÚLOHY PRE RO NA ROKY 2022 a 2023

1. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP ĽZ a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU). T: do 31.12.2022.
2. Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý OP ĽZ minimálne v objeme 560,87 mil. EUR za EU zdroj. T: 30.11.2022.
3. Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý OP ĽZ, t.j. v objeme 362,33 mil. EUR za EU zdroj. T: 31.12.2023.

Grafické znázornenie implementácie OP ĽZ

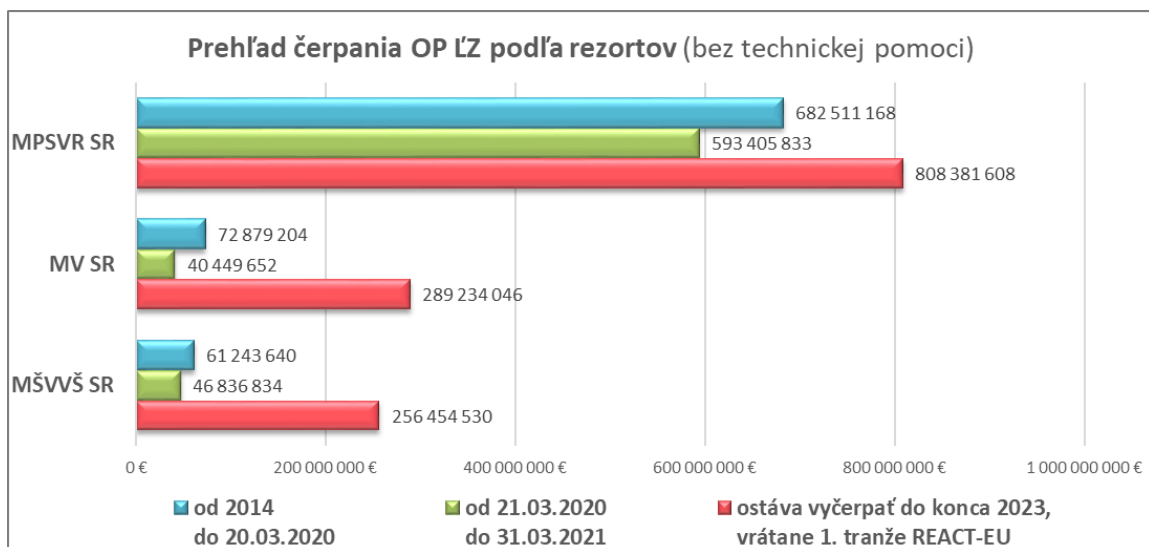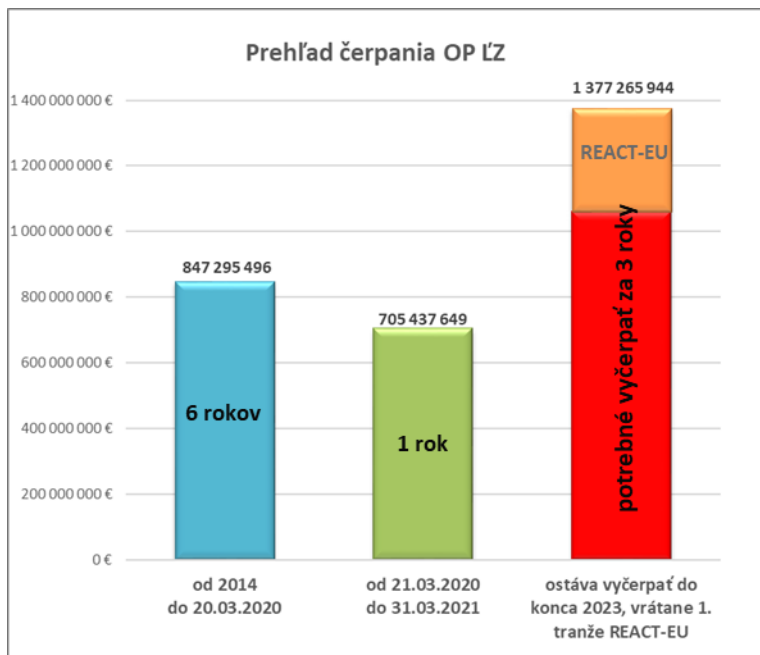

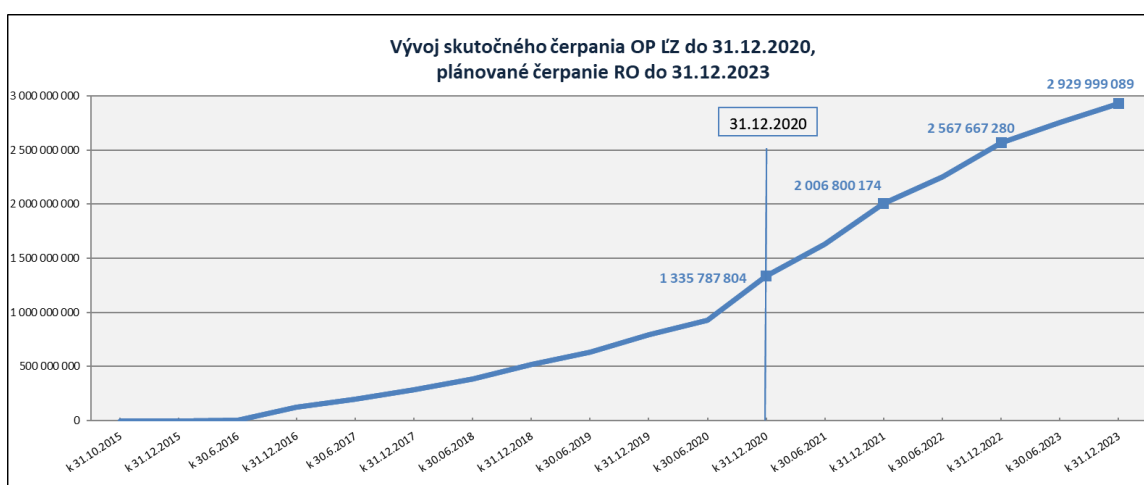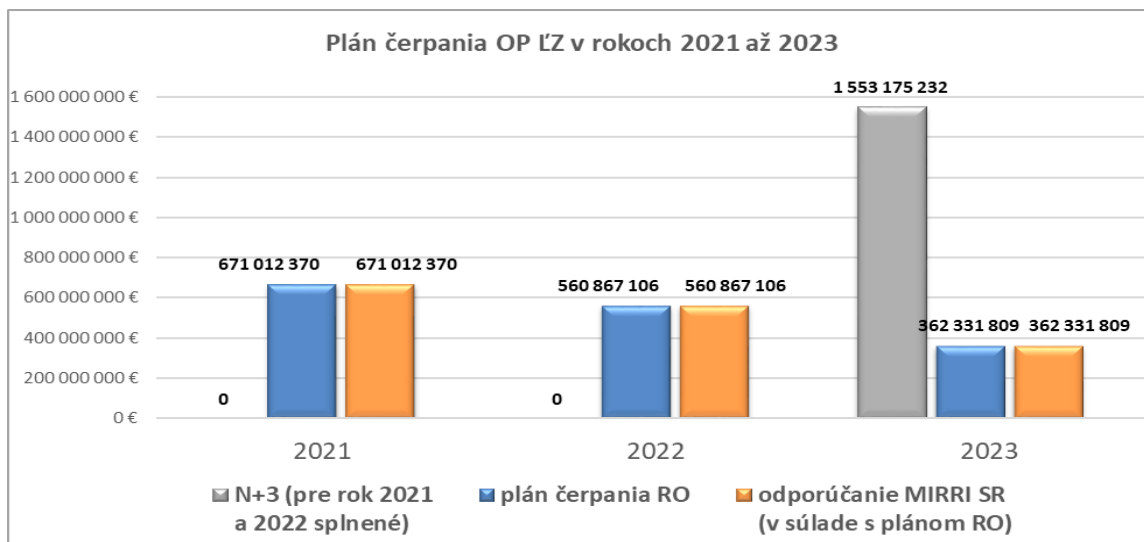



h) Program rozvoja vidieka

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)

Sprostredkovateľský orgán (SO): Pôdohospodárska platobná agentúra

Financované EÚ z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Alokácia: 1,56 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.03.2021 na úrovni **1,29 mld. EUR** z EÚ zdrojov, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **82,82 %**;
- **čerpanie** je k 31.03.2021 na úrovni **1,03 mld. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **65,94 %** z celkovej alokácie;
- **predĺženie programového obdobia do 2025** a navýšenie zdrojov o 740,48 mil. (EÚ zdroj), čo sú záväzky na roky 2021 a 2022, pričom SR oznámila EK presun časti zdrojov z II., (z PRV) do I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Plánované navýšenie alokácie PRV, ktoré bude potrebné vyčerpať do 2025	Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3
			EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	809 803 147	657 677 367	81,21%	152 125 780	437 483 802	54,02%	372 319 345		
Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	67 334 152	0	0,00%	67 334 152	0	0,00%	67 334 152		
Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	623 262 755	586 621 186	94,12%	36 641 569	565 323 946	90,70%	57 938 809		
Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	59 291 790	47 406 415	79,95%	11 885 375	25 718 111	43,38%	33 573 679		
CELKOM PRV:			1 559 691 844	1 291 704 968	82,82%	267 986 876	1 028 525 859	65,94%	531 165 985	740 484 978	101 796 838

RIZIKÁ




- × **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo vyčerpaných 62,27 mil. EUR;**
- × **pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť ešte 101,80 mil. EUR (čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 190,85 mil. EUR);**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 531,17 mil. EUR, t.j. 34,06 % z celkovej alokácie;**
- × **neuspokojivá implementácia CLLD - kontrahovanie aj čerpanie projektov v Miestnych akčných skupinách (MAS) je na úrovni 0,00 %.**




ÚLOHY PRE MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 177, 90 mil. EUR (EU zdroj zo schválených záväzných plánov) T: do 30.11.2021.
2. Vyhlásiť výzvy a zakontrahovať projekty, ktoré budú implementované aj v predĺženom programovom období T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.
4. Urýchliť kontrahovania a čerpanie projektov realizovaných v rámci jednotlivých MAS. T: bezodkladne.

Grafické znázornenie implementácie PRV

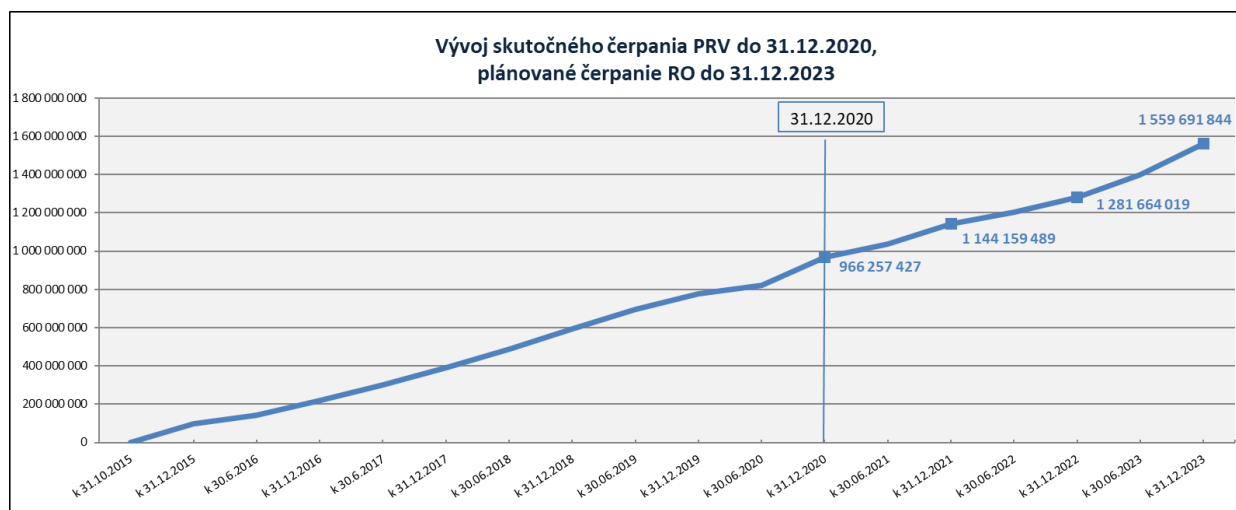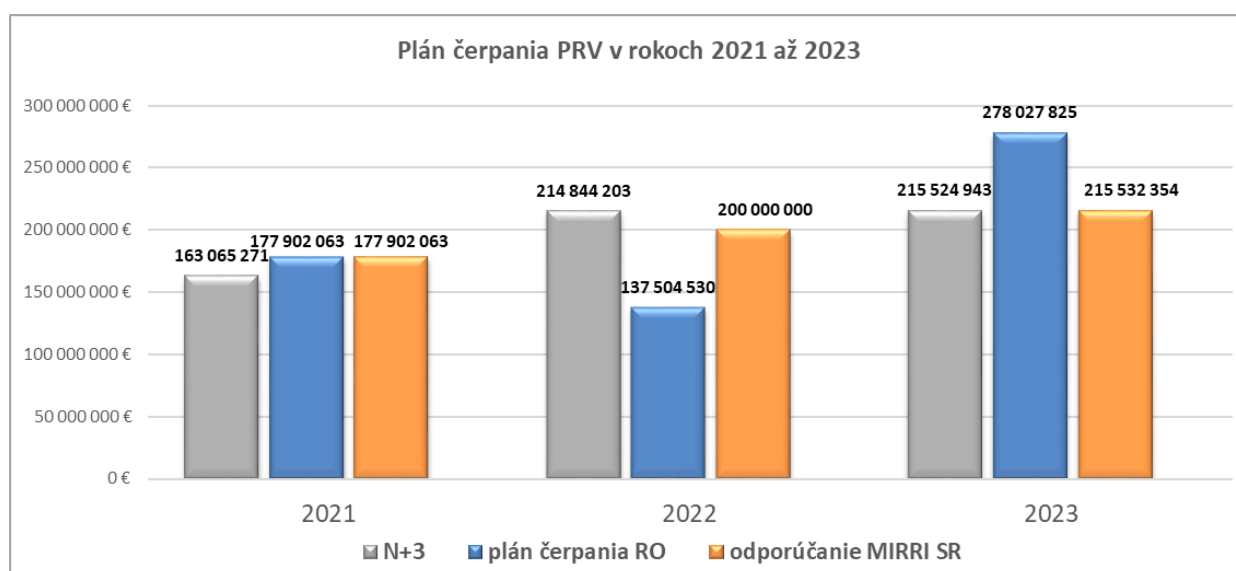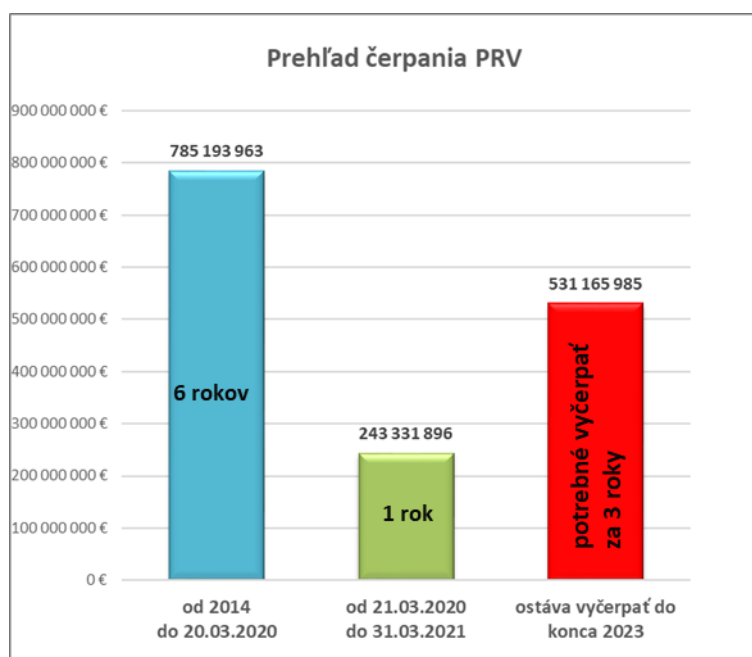



i) Operačný program Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR (MV SR)

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)

Alokácia: 336,76 mil. EUR vrátane 1. tranže na REACT-EU

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** bolo k 31.03.2021 na úrovni **205,52 mil. EUR**, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **81,72 %**;
- **čerpanie** bolo k 31.03.2021 na úrovni **111,34 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **44,28 %** celkovej alokácie;

Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
			EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	168 036 852	83,65%	32 855 332	88 433 926	44,02%	112 458 258		
PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	24 919 173	66,55%	12 527 168	15 247 644	40,72%	22 198 697		
PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	12 559 636	95,60%	578 336	7 663 151	58,33%	5 474 821		
CELKOM OP EVS:			251 476 497	205 515 661	81,72%	45 960 836	111 344 721	44,28%	140 131 776	85 287 600	12 219 143

RIZIKÁ

- × **od 1.1.2021 do 31.03.2021 bolo vyčerpaných 5,59 mil. EUR**
- × **pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO 12,22 mil. EUR (čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 33,48 mil. EUR);**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať 140,13 mil. EUR, t. j. 55,72 % z celkovej alokácie;**
- × **zo 151 uzavretých zmlúv je zatiaľ iba 35 ukončených projektov.**






ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 82,85 mil. EUR (EU zdroj zo schválených záväzných plánov). T: do 30.11.2021.
2. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU). T: do 31.12.2021.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne.
7. Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.
8. Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“). T: 30.09.2021.
10. Predložiť na EK revíziu OP EVS v súvislosti s iniciatívou REACT-EU. T: 14.05.2021.
11. Vyhlásiť vyzvanie na REACT-EU do 15.09.2021.
12. Zabezpečiť monitorovanie dodržiavania plnenia harmonogramu implementácie národných projektov pre rok 2021. T: priebežne.
13. Prijatť opatrenia na zrýchlenie implementácie 14 „problémových“ NP identifikovaných v rámci analýzy MV SR. T: do 30.06.2021.

ÚLOHY PRE RO NA ROKY 2022 a 2023

1. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP EVS a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU). T: do 31.12.2022.
2. Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý OP EVS minimálne v objeme 69,69 mil. EUR za EU zdroj. T: 30.11.2022.
3. Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý OP EVS, t.j. v objeme 78,48 mil. EUR za EU zdroj. T: 31.12.2023.

Grafické znázornenie implementácie OP EVS

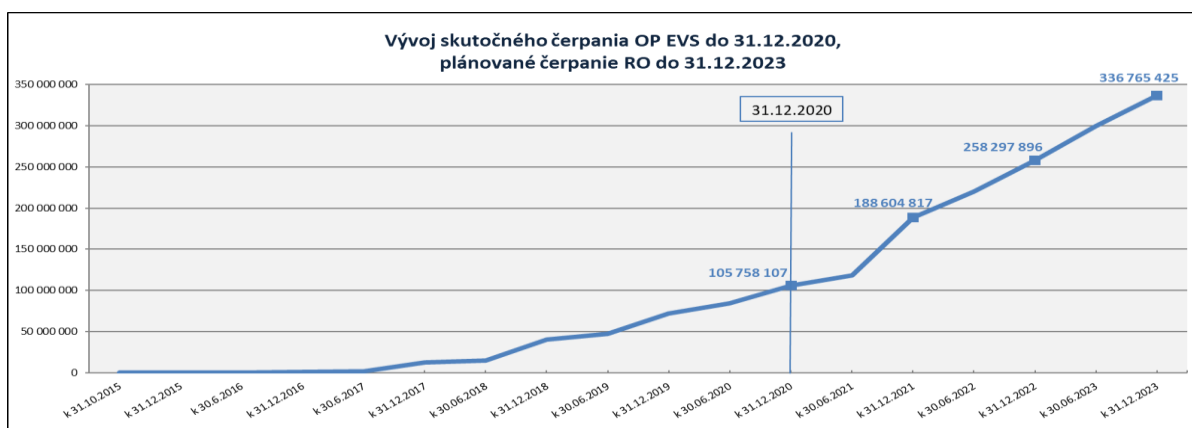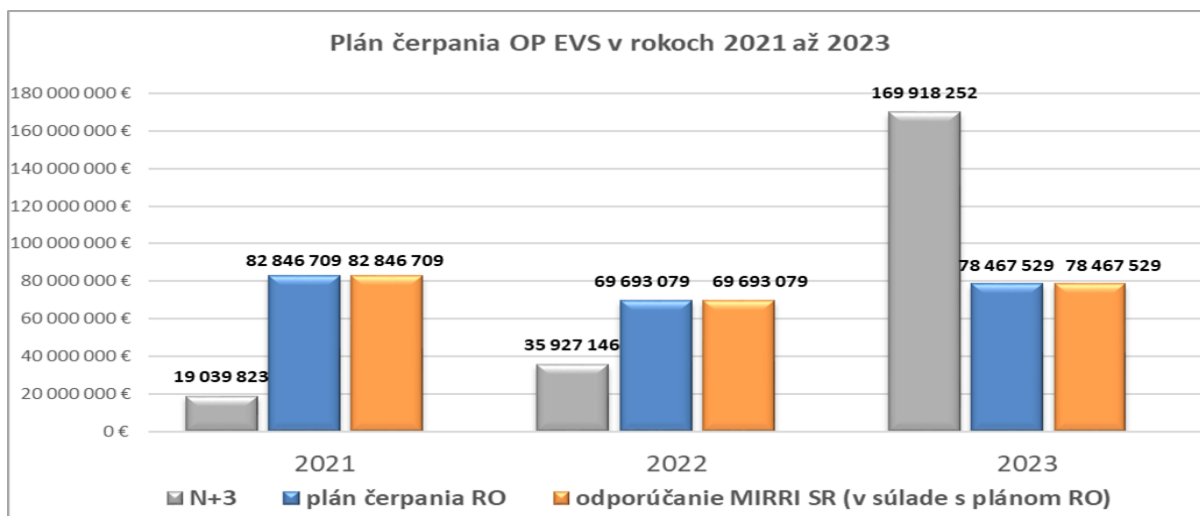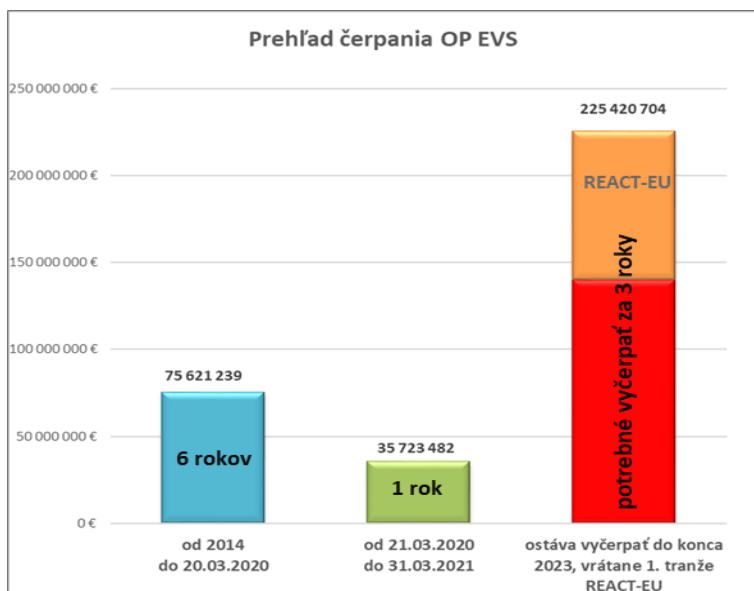

III. Opatrenia na eliminovanie dopadov pandémie COVID – 19

Schválené realokácie a stav implementácie opatrení

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandemiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandemiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov** a v tejto súvislosti **plánovalo realokáciu 1,25 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF. Na základe negociácií s EK bol objem finančných prostriedkov znížený na **1,105 mld. EUR**.

Uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 bol schválený materiál *“Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandemiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov”*, ktorý má vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP ĽZ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP ĽZ)**

K 31.03.2021 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,14 mld. EUR (103,53 %), zazmluvnených 1,04 mld. EUR (94,39 %) a vyčerpaných 501,34 mil. EUR (45,37 %).

1. Podpora udržania zamestnanosti tzv. Kurzarbeit

➤ Implementované v rámci **PO 3 OP Ľudské zdroje**

- ❖ Schválená realokácia vo výške **410,26 mil. EUR**
- ❖ **2 národné projekty s alokáciou 460,26 mil. EUR:**

1. **NP Prvá pomoc** (alokácia **390,26 mil. EUR**) - vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, ŽoNFP predložená 22.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 11.08.2020, **celá suma 390,26 mil. EUR (EU zdroj) už bola vyčerpaná.**
2. **NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách** (alokácia 70 mil. EUR) - vyzvanie vyhlásené 16.07.2020, ŽoNFP predložená 21.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.08.2020, **čerpanie predstavuje 17,48 mil. EUR (EU zdroj).**

2. Podpora zdravotníckeho systému

➤ Implementované v rámci **PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra** (dlhodobý strategický výskum)

- ❖ Schválená podpora vo výške **7 mil. EUR**
- ❖ **1 už vyhlásená výzva** (OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na **podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie** - alokácia na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, **1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 07.11.2020 vo výške 6,11 mil. EUR za EU zdroj**

➤ Implementované v rámci **PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra** (výskumné inštitúcie)

- ❖ Schválená podpora vo výške **80 mil. EUR**
- ❖ **2 dopytovo orientované výzvy:**

1. **Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie** (pôvodná alokácia 60 mil. EUR bola navýšená na **80 mil. EUR**) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej sume 138,95 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho **15 už zazmluvnených projektov** vo výške **55,72 mil. EUR** za EU zdroj.
2. **Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch** zameraných na boj proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia **20 mil. EUR**) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 16,95 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho evidujeme už **8 zazmluvnených projektov** vo výške **13,65 mil. EUR** za EÚ zdroj.

➤ Implementované v rámci **PO 2 Integrovaný regionálny OP**

- ❖ Schválená realokácia vo výške **117,30 mil. EUR**
- ❖ **4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP:**

1. **Výzva** - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie - **nemocnice** (alokácia **48 mil. EUR**) – vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,24 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho evidujeme už **15 zazmluvnených projektov** vo výške **7,05 mil. EUR** (EÚ zdroj).
2. **Výzva** určená pre subjekty mimo trvalej hospodárskej mobilizácie (**menšie nemocnice**) (indikatívna alokácia **5 mil. EUR**) – **v príprave** (plánované vyhlásenie po revízii IROP).
3. **Výzva** na podporu prevencie a diagnostiky ochorenia COVID-19 pre oprávneného žiadateľa **MZ SR, MO SR, určená hlavne pre refundáciu nákladov pre ambulancie, prevenciu a mediálnu kampaň** (indikatívna alokácia **25 mil. EUR**) – **v príprave**
4. **Výzva** na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR **Bratislava, krajské mestá** Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a Prešov **a VÚC** (pôvodná alokácia 8 mil. EUR bola navýšená na **16 mil. EUR**) – vyhlásená 10.12.2020, **doručená 1 ŽoNFP** vo výške **380 921 EUR** (EÚ+ŠR).
5. **NP** Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandemiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 - I pre prijímateľa MZ SR - **refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR** (alokácia **12,59 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.11.2020 vo výške 8,77 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy bolo už **vyčerpaných 8,14 mil. EUR**.
6. **NP** prijímateľa MZ SR so zameraním na **IT systém a sanitky** – **v príprave**

3. **Podpora MSP - „SIH antikorona záruky“**

➤ Implementované v rámci **PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra**

- ❖ Schválená realokácia vo výške **330,20 mil. EUR**
- ❖ **4 už zazmluvnené projekty na finančné nástroje** – alokácia projektov navýšená o **359,88 mil. EUR** (celková suma je vyššia ako bola stanovená v zmysle uznesenia), **z toho čerpanie zatiaľ vo výške 25 % navýšenej alokácie v sume 82,59 mil. EUR**

4. **Podpora zložiek integrovaného záchranného systému**

➤ Implementované v rámci **PO 3 OP Kvalita životného prostredia**

- ❖ Schválená podpora vo výške **51 mil. EUR** (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR)

- ❖ **1 už vyhlásená výzva** (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na **optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí** na lokálnej a regionálnej úrovni - v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 16 ŽoNFP v celkovej výške 90,81 mil. EUR (EÚ+ŠR), účinnosť nadobudli **3 zmluvy o poskytnutí NFP**, čo predstavuje **kontrahovanie** vo výške **43,15 mil. EUR** za EU zdroj, z tejto sumy sa **vyčerpalo 142 187 EUR**.

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19

➤ Implementované v rámci **PO 1 OP Ľudské zdroje**

- ❖ Schválená podpora vo výške **73,30 mil. EUR**
- ❖ **3 vyzvania na NP:**
 1. **NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov** v rámci PO1 (indikatívna alokácia 6 mil. EUR)⁴
 2. **NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.** (alokácia **63,31 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 10.08.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 63,31 mil. EUR za EU zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 2,27 mil. EUR**.
 3. **NP Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie** – Usmerňovať pre prax (alokácia **4,36 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 24.09.2020 vo výške 4,31 mil. EUR za EU zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 258 162,99 EUR**.

➤ Implementované v rámci **PO 5 OP Ľudské zdroje**

- ❖ Schválená podpora vo výške **28 mil. EUR**
- ❖ **3 vyzvania na NP:**
 1. **NP Korona te merel** - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít - domácností (indikatívna alokácia 1,20 mil. EUR) – vyhlásené 30.06.2020, ŽoNFP predložená 04.08.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 31.10.2020** vo výške **1,06 mil. EUR** za EU zdroj.
 2. **NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK** (alokácia **5,50 mil. EUR**) – vyhlásené 29.06.2020, ŽoNFP predložená 28.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 4,84 mil. EUR za EU zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 23 142 EUR**.
 3. **NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.** (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia **15 mil. EUR**) – vyhlásené 29.06.2020, ŽoNFP predložená 24.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 14,99 mil. EUR za EU zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 179 351 EUR**.

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie

➤ Implementované v rámci **PRV**

1. Výzva - **Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP**, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia **14,78 mil. EUR**) – vyhlásená 24.08.2020, prijatých 317 ŽoNFP v sume NFP 7 405 375,77 EUR, z toho bolo uzatvorených **165 zmlúv vo výške 2,69 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa už **vyčerpalo 1,13 mil. EUR**.

⁴ V nadväznosti na potrebu alokovať zdroje na znižovanie dopadov pandémie COVID-19 v školách MŠVVaŠ SR nebude pokračovať v príprave projektu a vyzvania pre túto tému a požiada o zrušenie príslušnej úlohy z uznesenia vlády SR č. 257/2020.

1. NP Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - (alokácia 5,08 mil. EUR) – vyhlásené 03.09.2020 (do pôvodného vyzvania bol doplnený partner a COVID aktivity), zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 5,08 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 230 915 EUR.

Tabuľka č. 16 Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 31.03.2021

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)		Vyplatené z kapitoly štátneho rozpočtu MPSVR SR
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	
Podpora udržania zamestnanosti	OP ĽZ	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	460 262 576	112,19%	407 740 011	99,39%	1 265 660 764
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	117 300 000	3	76 585 750	65,29%	16	15 821 381	13,49%	8 144 357	6,94%	
	OPII	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	24	75 476 602	86,75%	0	0,00%	
	Celkom:	204 300 000	6	183 525 750	89,83%	40	91 297 983	44,69%	8 144 357	3,99%	
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	330 200 000	1	359 881 070	108,99%	4	359 881 070	108,99%	82 585 000	25,01%	
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	51 000 000	1	51 000 000	100,00%	3	43 150 916	84,61%	142 187	0,28%	
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP ĽZ	109 300 000	5	89 370 834	81,77%	5	88 514 250	80,98%	2 733 005	2,50%	
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)		1 105 062 575	15	1 144 040 230	103,53%	54	1 043 106 796	94,39%	501 344 559	45,37%	1 265 660 764
Ostatné opatrenia	PRV		1	14 780 000		165	2 698 523		1 126 923		
	OP ĽZ		1	5 084 538		1	5 075 108		230 915		
	Celkom:		2	19 864 538		166	7 773 631		1 357 838		
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)		1 105 062 575	17	1 163 904 769	105,32%	220	1 050 880 427	95,10%	502 702 398	45,49%	1 265 660 764

Zdroj: ITMS2014+, RO OP ĽZ, RO PRV

REACT-EU

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je 3. balíček podpory EK - REACT-EU v predpokladanom objeme približne 780 mil. EUR, o ktorú sa navýši finančná obálka programového obdobia 2014 – 2020.

Zdroje sa členským krajinám pridelujú v dvoch fázach. EK prijala dňa 12.02.2021 Vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa stanovuje rozdelenie zdrojov REACT-EU na rok 2021 podľa členských štátov, na základe ktorého sa Slovenskej republike na rok 2021 prideluje suma 615 975 590 EUR v bežných cenách. Presnú sumu v predpokladanom objeme 164 mil. EUR na rok 2022 oznámi EK v ďalšom vykonávacom akte, ktorým stanoví rozdelenie zdrojov REACT-EU na rok 2022 na základe štatistických údajov dostupných k 19.10.2021.

V zmysle materiálu č. UV-20294/2020V, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, má byť podpora z REACT-EU zameraná najmä na:

- podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest, zvyšovanie odolnosti zdravotníckeho systému, podporu dištančného vzdelávania ako aj pokračovanie poskytovania sociálnych služieb občanom. Pomoc má byť poskytnutá aj regiónom vo forme financovania zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora bude smerovať aj na zatepľovanie bytových domov a zvýšenie kapacít základných škôl vrátane modernizácie učební. V rámci boja s pandemiou budú finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú zdravotníci alebo policajti. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu najodkázanejších osôb, pomoc z REACT-EU bude smerovať aj na pokračovanie distribúcie potravinových a hygienických balíčkov pre tieto osoby.

Tieto aktivity bude možné realizovať navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ (401,2 mil. EUR), IROP (246,8 mil. EUR), OP EVS (108 mil. EUR) a OP FEAD (24 mil. EUR),.

Po dohode na národnej úrovni a náročných negotiaciach s EK, Európska komisia dňa 22.02.2021, po spoločnej konzultácii medzi DG REGIO a DG EMPL, potvrdila, že otázku alokácií pre jednotlivé OP považuje za objasnenú a vyzvala nás k revíziám OP týkajúcich sa prvej fázy revízií vo vzťahu k alokáciám prideleným na rok 2021.

Schválenie revízií⁵ všetkých operačných programov zo strany EK sa očakáva v priebehu mája 2021 a riadiace orgány jednotlivých operačných programov sa v súčasnosti pripravujú na vyhlasovanie výziev zameraných na riešenie negatívnych dôsledkov pandémie. Prvé platby na realizáciu projektov z REACT-EU, v prípade existencie výdavkov, by EK mala uhrádzať od mája 2021.

⁵ V prípade využitia alokácie REACT-EU na tematický cieľ, ktorý nie je v súlade s ods. 12 čl. 92 b všeobecného nariadenia (technická pomoc), kde nie je možné uplatniť zvýšenú mieru spolufinancovania zo zdroja REACT-EU, je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie ŠR.

IV. Zoznam použitých skratiek

Skratka	Celý názov
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
COV	celkové oprávnené výdavky
DG EMPL	Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
DG REGIO	Generálne riaditeľstvo regionálnej a mestskej politiky EÚ
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FN	finančný nástroj
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce V-A SK-AT
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce V-A SK-CZ
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS	Informačný systém
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MP	metodický pokyn
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MSP	malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NFP	nenávratný finančný príspevok
NP	národný projekt
OA	Orgán auditu
OP	operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie
PO	prioritná os

PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
PS INTERACT III	Program spolupráce INTERACT III
REACT-EU	Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti
RO	riadiaci orgán
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SIH	Slovenský investičný holding
SO	sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SŽoP	súhrnná žiadosť o platbu
ŠF	štrukturálne fondy
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠR	štátny rozpočet
TP	technická pomoc
ÚR	účtovný rok
ÚVO	Úrad verejného obstarávania
VKS	výročná kontrolná správa
VLA	vládny audit
VO	verejné obstarávanie
VÚC	vyšší územný celok
WL	varovný list Európskej komisie
ZP	záväzný plán
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	žiadosť o platbu

V. Prílohy

Príloha 1 Stav implementácie EŠIF k 31.03.2021

Program	Alokácia 2014-2020		Platné výzvy/vyzvania			Kontrahovanie ¹		Čerpanie EŠIF ²		Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidiel N+3 v zmysle novej legislatívy (stav k 31.03.2021)	Čerpanie v roku 2021
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro-rata pre niektoré OP	EÚ zdroj
	A	B	C	D	E=D/A	F	G = F/A	H	I=H/A	J	K
OP Ľudské zdroje	2 613 166 516	492 163 705	155	3 325 918 293	127,28%	2 645 850 776	101,25%	1 552 733 145	59,42%	0	216 945 341
OP Integrovaná infraštruktúra	6 009 937 611	1 023 408 243	241	8 465 521 807	140,86%	5 004 311 943	83,27%	2 259 916 626	37,60%	383 450 167	99 008 784
OP Kvalita životného prostredia	2 832 531 290	329 249 335	82	3 231 511 160	114,09%	2 016 683 217	71,20%	1 199 406 453	42,34%	246 630 226	63 410 705
Integrovaný regionálny OP	1 699 941 778	310 981 158	64	2 214 596 095	130,27%	1 344 199 776	79,07%	558 442 202	32,85%	164 234 086	2 444 992
OP Efektívna verejná správa	251 476 497	47 955 668	57	269 647 986	107,23%	205 515 661	81,72%	111 344 721	44,28%	12 219 143	5 586 613
OP Technická pomoc	159 071 912	28 034 015	18	170 747 660	107,34%	133 200 693	83,74%	115 104 786	72,36%	0	8 994 984
OP Rybné hospodárstvo	11 812 818	3 788 423	7	7 288 881	61,70%	3 607 141	30,54%	1 107 219	9,37%	1 925 227	0
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	6 228 064	15	86 909 450	96,42%	72 415 001	80,34%	31 698 233	35,17%	6 614 106	4 671 252
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	3 651 172	5	75 892 678	100,00%	60 812 810	80,13%	18 058 521	23,79%	11 403 511	242 107
PS INTERACT III	39 392 594	-	-	-	-	39 392 594	100,00%	23 055 114	58,53%	0	1 374 403
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	2 245 459 783	644	17 848 034 010	129,86%	11 525 989 611	83,62%	5 870 867 020	42,59%	826 476 466	402 679 182
Program rozvoja vidieka	1 559 691 844	539 507 852	52	1 670 283 782	107,09%	1 291 704 968	82,82%	1 028 525 859	65,94%	101 796 838	62 268 433
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	2 784 967 635	696	19 518 317 792	127,54%	12 817 694 579	83,54%	6 899 392 880	44,97%	928 273 304	464 947 615

Zdroj údajov: ITMS 2014+ (export dát 01.04.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

1 - ide o čisté kontrahovanie očistené o nečerpanú sumu ukončených projektov so zohľadnením vrátiok

2 - ide o čisté čerpanie schválené na úrovni certifikačného orgánu, za PRV schválené uhradené platby prijímateľom očistené o nezrovnalosti

Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (623 262 755€).

PRV nepredkladá žiadosti o platbu na schválenie na CO, ale taktiež plní pravidlo N+3 (za PRV sa uvádza suma potrebná predložiť na EK pre splnenie pravidla N+3)
