

**INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE IMPLEMENTÁCIE
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
A OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE
V GESCII MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR**

Stav k 31. 05. 2021

Obsah

1	Úvod.....	3
2	Aktuálny stav implementácie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 05. 2021	3
2.1	Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania	3
2.2	Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR.....	4
3	Pokrok v implementácii PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie	5
3.1	Vyhlásené výzvy/vyzvania	5
3.2	Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá.....	5
3.3	Pokrok v kontrahovaní a čerpaní za mesiac sledované obdobie	5
4	Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia	6
5	Kritické problémy OPII v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie	7
6	Aktuálny stav implementácie OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 05. 2021	9
6.1	Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania	9
6.2	Stav kontrahovania a čerpania PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR	10
7	Pokrok v implementácii PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie	10
7.1	Vyhlásené výzvy/vyzvania	10
7.2	Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá.....	11
7.3	Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 OPLZ za sledované obdobie (apríl - máj 2021)	11
8	Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia	12
9	Kritické problémy OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie	13

1 Úvod

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) vypracovalo v zmysle úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 218/2021 informatívny materiál o aktuálnom stave implementácie operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) a operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj „PO 1 OPLZ“) v gescii MŠVVaŠ SR s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu „Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. 03. 2021“.

Cieľom tohto materiálu je najmä:

- informovať o aktuálnom stave implementácie OPII a OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR (prehľad alokovaných finančných prostriedkov vo vyhlásených výzvach, prehľad žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci jednotlivých prioritných osí (ďalej aj „PO“), stav kontrahovania a čerpania);
- informovať o pokroku v implementácii (vyhlásené/ukončené výzvy/vyzvania, pokrok v kontrahovaní v sledovanom období;
- vyhodnotiť plnenie úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia;
- informovať o kritických problémoch a návrhoch na ich riešenie.

Údaje v uvedenej informácii boli spracované k 31. 05. 2021 a pokrok za sledované obdobie, t. j. apríl, máj 2021.

2 Aktuálny stav implementácie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 05. 2021

2.1 Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania

Prehľad výšky alokácie a sumy a počtu vyhlásených výziev a vyzvaní v rámci prioritných osí 9, 10 operačného programu Integrovaná infraštruktúra k **31. 05. 2021** obsahuje tabuľka č. 1, a to v členení podľa prioritných osí a typu výziev/vyzvaní (resp. počet výziev na dopytovo orientované projekty, vyzvaní na národné projekty).

Tabuľka č.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR


Prehľad výziev/vyzvaní k 31.05.2021				Počet výziev/vyzvaní*					
Prioritná os	Alokácia	Vyhlásené výzvy/vyzvania		Spolu	DOP	NP	FN	TP	VP
	EUR (EÚ Zdroj)	EUR (EÚ Zdroj)	% z alokácie						
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	494 820 162,31	105,92%	20	15	5	0	0	0
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	85 704 847	98 050 000,00	114,40%	5	4	0	0	0	1
SPOLU	552 874 051	592 870 162,31	107,23%	25	19	5	0	0	1

* - výzvy/vyzvania pre viaceré PO sú započítané 2 krát (zvlášť pre každú os)

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Počet výziev a suma vyhlásených výziev v PO 9 MŠVVaŠ a VA bola znížená o výzvu s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC). Prerušená bola implementácia zakontrahovaných projektov v rámci predmetnej výzvy a došlo k zaevidovaniu systémovej nezrovnalosti na programovej úrovni do ITMS2014+, ktorá nedovoľuje zrealizovať čerpanie prostriedkov z výzvy. Keďže na EK nebudú deklarované výdavky z tejto výzvy, boli údaje vo vykazovaní formálne upravené.

Graf č. 1 Prehľad voľných a alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 05. 2021

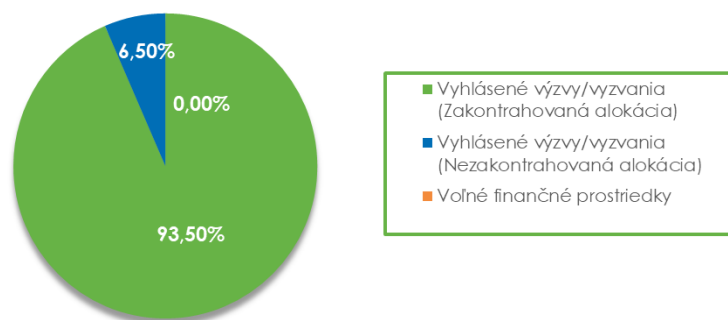

Podiel celkových voľných a alokovaných finančných prostriedkov v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 05. 2021 znázorňuje graf č. 1, ktorý zohľadňuje, či sú alokované finančné prostriedky zakontrahované alebo zatiaľ nezakontrahované a premietnuté len do vyhlásených výziev/vyzvaní, t. j. v rámci ktorých aktuálne stále prebieha proces konania o ŽoNFP.

2.2 Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR

Tabuľka č. 2 Kontrahovanie a čerpanie PO 9, 10 OPII k 31. 05. 2021 (EÚ zdroj)

Prioritná os	Alokácia	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)		Čerpanie na úrovni CO	
	EUR	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	431 473 997	92,36%	116 539 893	24,95%
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	85 704 847	81 706 619	95,33%	8 340 683	9,73%
SPOLU	552 874 051	513 180 615	92,82%	124 880 576	22,59%

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII k 31. 05. 2021 obsahuje tabuľka č. 2 (len projekty v stave riadne ukončené a zmluva uzatvorená), ktorá poskytuje podrobný prehľad výšky a podielu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PO 9, 10 OPII v členení podľa prioritných osí. Číselné údaje v tabuľke sú za EÚ zdroj.

Suma kontrahovania v PO 9 (MŠVVaŠ a VA) bola znížená o sumu projektov zakontrahovaných v rámci výzvy s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).

Tabuľka č. 3 Kontrahovanie PO 9, 10 OPII v roku 2021 (EÚ zdroj)

OPII/ Prioritná os	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahova nie k 31.5.2021 (od zač. PO)	% kontrahova nia k 31.5.2021	MIRRI SR odporúča kontrahova nie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovani a od 1.1. 2021 do 31.5.2021 v EUR	% plnenia odporúčaná ého ročné ho plánu kontrahova nia	Zostáva nakontrahov ať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	431 473 997	92,36%	97 375 019	67 227 907	69,04%	30 147 112
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	85 704 847	81 706 619	95,33%	1 567 584	983 807	62,76%	583 777

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Tabuľka č. 4 Čerpanie PO 9, 10 OPII v roku 2021 (EÚ zdroj)

OPII/ Prioritná os	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.5.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.5.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.5.2021 v EUR	% plnenia odporúčané ho ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	116 539 893	24,95%	103 867 534	17 178 300	16,54%	86 689 234
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	85 704 847	8 340 683	9,73%	27 690 625	1 636 502	5,91%	26 054 123

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

3 Pokrok v implementácii PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

3.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania

V mesiaci apríl, máj 2021 nebola vyhlásená žiadna výzva.


3.2 Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá

V mesiaci apríl, máj 2021 neboli ukončené hodnotiace kolá.

3.3 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní za sledované obdobie


Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) znázorňuje graf č. 2 spolu s príslušajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Prírastok kontrahovania za príslušné mesiace je v tabuľke údajov vyjadrený v EUR a v percentách v pomere k alokácii jednotlivých prioritných osí OPII v gescii MŠVVaŠ SR.

Graf č. 2 Pokrok v kontrahovaní PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

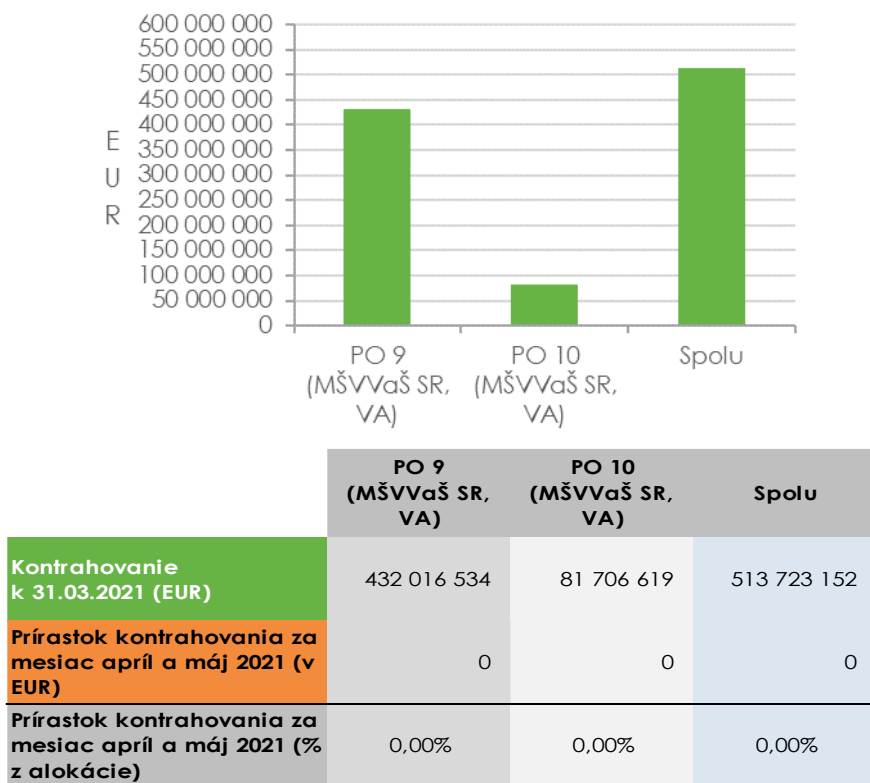

Pokrok v čerpaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) na úrovni certifikačného orgánu znázorňuje graf č. 3 spolu s príslušajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Prírastok čerpania za príslušné mesiace je v tabuľke údajov vyjadrený v EUR a v percentách v pomere k alokácii jednotlivých prioritných osí OPII v gescii MŠVVaŠ SR.

Graf č. 3 Pokrok v čerpaní PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

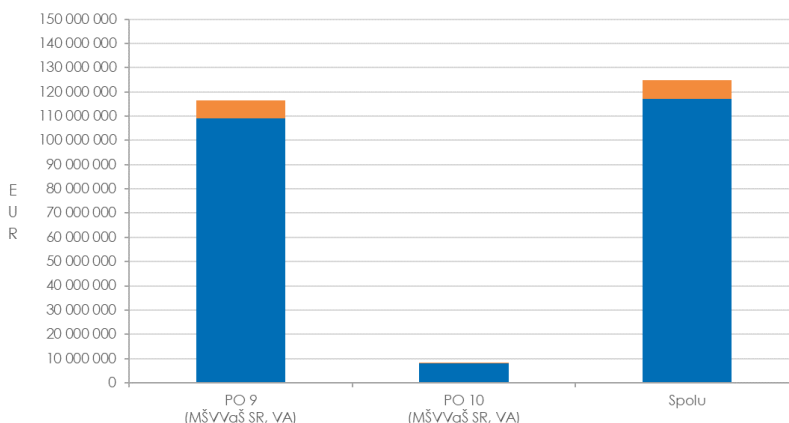

	PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	Spolu
Čerpanie k 31.03.2021 (EUR)	109 144 351	7 992 562	117 136 913
Prírastok čerpania za mesiac apríl a máj 2021 (v EUR)	7 395 542	348 121	7 743 663
Prírastok čerpania za mesiac apríl a máj 2021 (% z alokácie)	1,58%	0,06%	0,40%

4 Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia

ÚLOHY / ODPOČTY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 9, PO 10, PO 13) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO.
T: do 30.11.2021
Plní sa. Úroveň čerpania je **19 519 716,88 EUR** z objemu 132 348 483 EUR.
2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie.
T: do 31.12.2021
Splnené. Úroveň kontrahovania je **93,50 %**.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach
T: 31.12.2021
Plní sa. Úroveň viazanej alokácie vo **výzvach je 96,91 %**.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.
T: v závislosti od termínu MF SR
Plní sa.

5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov.
T: do 31.05.2021
Splnené. Údaje v aktuálnom zozname strategických projektov za MŠVVaŠ SR sú aktualizované.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.
T: štvrtročne
Plní sa. 2-krát mesačne sa realizujú bilaterálne stretnutia s RO, CKO a CO, kde sa diskutuje o aktuálnom stave implementácie OP.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.
T: 30.09.2021
V procese. MŠVVaŠ SR analyzuje možné riziká implementácie.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.
T: 30.09.2021
Splnené. Revíziou OPII boli ukazovatele upravené tak, aby reflektovali na aktuálny stav implementácie OP v gescii MŠVVaŠ SR.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.
T: 30.09.2021
V procese. MŠVVaŠ SR plánuje vyhlásenie zásobníkovej výzvy zameranej výhradne na personálne výdavky výskumných aktivít, ktorej projekty by sa po neplánovanom uvoľnení alokácie dostali do implementácie s vysokým potenciálom riadneho ukončenia do konca programového obdobia.
Plánovanie fázovania projektov v súčasnom stave nie je možné z dôvodu neexistencie legislatívy pre nové programové obdobie. Zároveň by prijímatelia pri uvedenej možnosti znížili pokrok pri realizácii zazmluvnených projektov s negatívnym dopadom na úroveň čerpania v aktuálnom programovom období.
10. Zabezpečiť zrýchlenie implementácie COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR.
T: priebežne
Plní sa. MŠVVaŠ SR umožnilo vo výzve využívanie predfinancovania resp. zálohových platieb pre všetky subjekty za účelom urýchlenia dostupnosti finančných prostriedkov na samotnú realizáciu výskumných aktivít. Zároveň intenzívne komunikuje s prijímateľmi s cieľom zrýchlenia a zefektívnenia implementácie projektov.
11. Zabezpečiť čerpanie veľkého projektu ACCORD na úrovni 22,9 mil. EUR, v zmysle plánu čerpania SO.
T: 30.11.2021
Plní sa. MŠVVaŠ SR poskytuje maximálnu možnú podporu v oblasti verejného obstarávania, ktoré má najväčší vplyv na dosiahnutie stanovenej úrovne čerpania v roku 2021.

5 Kritické problémy OPII v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie

1. Kritickým problémom OPII v gescii MŠVVaŠ SR je čerpanie. Hlavnou príčinou tohto problému bolo omeškanie implementácie, a to z dôvodu netransparentného procesu hodnotenia a výberu operácií, na ktoré poukázal varovný list EK z roku 2017, ktorý spôsobil pozastavenie a následne vylúčenie z financovania dvoch výziev v objeme 600 mil. EUR. Následne bolo nevyhnutné nastaviť nové metodiky, manuály a riadiace a kontrolné mechanizmy, čo malo za následok 2-ročné meškanie a pozastavenie aktivít bývalého SO – VA. Proces bol zavŕšený zlúčením OP Val s OPII v decembri 2019.
Zároveň značným problémom je verejné obstarávanie. Takmer každý projekt má minimálne dve VO v nadlimitnej zákazke, čo spôsobuje, že objem čerpaných prostriedkov nastupuje neskôr avšak skokovým tempom.

Návrh na riešenie: Návrhom na riešenie nedostatočného čerpania je navýšenie administratívnych kapacít na kontrolu VO a aktívna komunikácia s prijímateľmi.

6 Aktuálny stav implementácie OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 05. 2021

6.1 Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania

Prehľad výšky alokácie a sumy a počtu vyhlásených výziev a vyzvaní v rámci prioritnej osi 1 operačného programu Ľudské zdroje k **31. 05. 2021** obsahuje tabuľka č. 5, a to v členení podľa typu výziev/vyzvaní (resp. počet výziev na dopytovo orientované projekty a vyzvaní na národné projekty).


Tabuľka č. 5 Vyhlásené výzvy/vyzvania PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR

Prehľad výziev/vyzvaní k 31. 05. 2021				Počet výziev/vyzvaní		
Prioritná os	Alokácia EUR (EÚ Zdroj)	Vyhlásené výzvy/vyzvania		Spolu	DOP	NP
		EUR (EÚ Zdroj)	% z alokácie			
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	396 668 724,74	113,70 %	20	9	11

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Výzvy a vyzvania boli vyhlásené vo vyššej alokácii ako je alokácia PO 1 OPLZ, avšak v priebehu implementácie boli zrušené 1 výzva a 1 vyzvanie a zároveň výška kontrahovaných prostriedkov zo všetkých vyhlásených výziev/vyzvaní nedosiahla výšku alokácie PO 1 OPLZ.

Graf č. 4 Prehľad voľných a kontrahovaných finančných prostriedkov PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 05. 2021

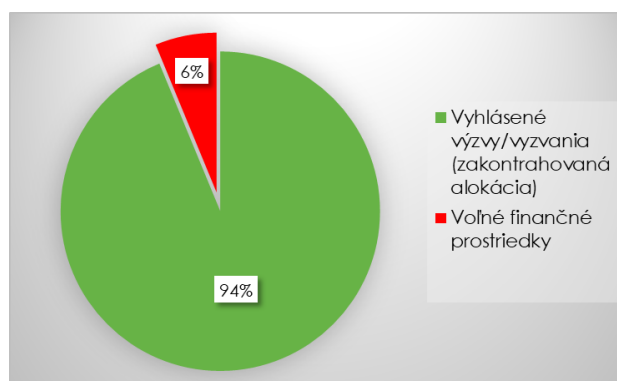

Graf č. 4 znázorňuje podiel celkových voľných a alokovaných finančných prostriedkov v rámci PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 05. 2021, t. j. zakontrahované prostriedky v objeme **327 010 038 EUR**, čo tvorí **94 %** z objemu alokácie PO 1 OPLZ. Výška kontrahovania predstavuje kontrahovanie očistené o nevyčerpané prostriedky z riadne ukončených projektov.

SO na základe priebežnej analýzy odhaduje pri jednotlivých výzvach a národných projektoch výšku nedočerpania zohľadňujúc skúsenosti z implementácie, charakter projektov či ich dĺžku realizácie a k 31. 05. 2021 identifikoval voľné nezakontrahované prostriedky v objeme **21 730 966 EUR**, čo tvorí **6 %** z alokácie PO 1 OPLZ. Zároveň SO odhaduje pri aktuálnom a plánovanom stave kontrahovania a čerpania výšku úspor z nedočerpania v objeme 14,1 mil. EUR k 12/2023. Na základe uvedeného SO zároveň plánuje kontrahovať finančné prostriedky aj nad rámec alokácie PO 1 OPLZ za účelom zabezpečenia efektívneho vyčerpania alokácie PO 1 OPLZ. V 3. – 4. kvartáli 2021 bude objem kontrahovania navýšený o prostriedky z vyhlásenej výzvy „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“ v alokácii 7 mil. EUR a z pripravovaného vyzvania pre NP „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v alokácii 16,1 mil. EUR).

6.2 Stav kontrahovania a čerpania PO 1 OPLŽ v gescii MŠVVaŠ SR

Tabuľka č. 6 Kontrahovanie a čerpanie PO 1 OPLŽ k 31. 05. 2021 (EÚ zdroj)

Prioritná os	Alokácia	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)		Čerpanie na úrovni CO	
	EUR	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	327 010 038	93,8 %	114 983 199	33 %

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Stav kontrahovania a čerpania PO 1 OPLŽ k 31. 05. 2021 obsahuje tabuľka č. 6, ktorá zahŕňa projekty v stavoch riadne ukončené, zmluva uzavretá, zmluva uzavretá – pozastavenie realizácie projektu a poskytuje podrobný prehľad výšky a podielu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PO 1 OPLŽ. Číselné údaje v tabuľke sú za EÚ zdroj.

Tabuľka č. 7 Kontrahovanie PO 1 OPLŽ k 31. 05. 2021 (EÚ zdroj)

OPLŽ/PO 1/ SO MŠVVaŠ SR	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahova nie k 31.5.2021 (od zač. PO)	% kontrahov ania k 31.5.202 1	MIRRI SR odporúča kontrahova nie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovani a od 1.1. 2021 do 31.5.2021 v EUR	% plnenia odporúčan ého ročné ho plánu kontrahova nia	Zostáva nakontraho vať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	327 010 038	93,8 %	20 693 045	839 155	4,1 %	19 853 890

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Tabuľka č. 8 Čerpanie PO 1 OPLŽ k 31. 05. 2021 (EÚ zdroj)

OPLŽ/PO 1/ SO MŠVVaŠ SR	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.5.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.5.202 1	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.5.2021 v EUR	% plnenia odporúčané ho ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	114 983 199	33 %	105 017 832	20 299 252	19,3 %	84 718 580

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

7 Pokrok v implementácii PO 1 OPLŽ v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

7.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania

V sledovanom období v mesiacoch apríl až máj 2021 bola dňa 31. 05. 2021 vyhlásená 1 výzva OPLŽ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“ v alokácii 7 mil. EUR.

Zároveň prebieha príprava vyzvania pre NP „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ s alokáciou 16,1 mil. EUR, vyhlásenie vyzvania sa predpokladá do konca júna 2021.

Zároveň uvádzame informáciu o aktuálnej príprave vyzvania pre NP „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ s alokáciou 20 mil. EUR a vyzvania pre NP „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ s alokáciou 6,2 mil. EUR, ktoré budú implementované z prioritnej osi č. 8 (React-EU) OPLŽ.

7.2 Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá


K 31. 05. 2021 sú uzavreté všetky hodnotiace kolá v rámci doposiaľ vyhlásených výziev pre DOP.

7.3 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 OPLZ za sledované obdobie (apríl - máj 2021)

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) na úrovni certifikačného orgánu znázorňuje graf č. 5 spolu s prislúchajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Prírastok kontrahovania a čerpania za príslušné mesiace je v tabuľke údajov vyjadrený v EUR a v percentách v pomere k alokácii PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR.

Prírastok v kontrahovaní je v súlade so stavom vyhlasovania výziev a vyzvaní uvedených v indikatívnom harmonograme výziev, t. j. v mesiacoch apríl a máj 2021 dobiehalo len kontrahovanie zo skôr vyhlásených výziev. Výraznejší nárast kontrahovania sa očakáva v 3. - 4. kvartáli 2021, kedy sa budú kontrahovať projekty z výziev a vyzvaní vyhlásených v 2. kvartáli 2021.

Graf č. 5 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie (apríl - máj 2021)

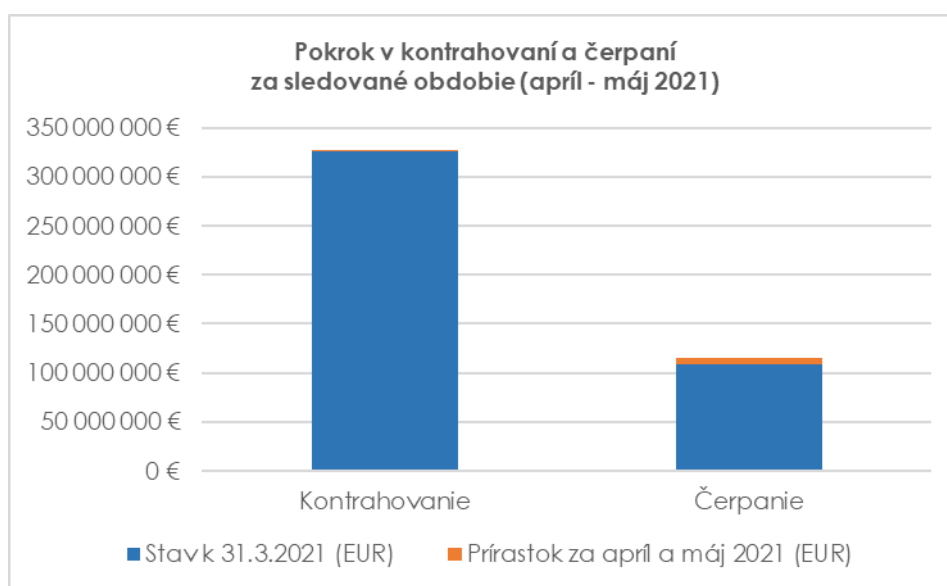

	Kontrahovanie	Čerpanie
Stav k 31.3.2021 (EUR)	326 137 200,63	108 089 966,12
Prírastok za apríl a máj 2021 (EUR)	872 837,57	6 893 233,05
Prírastok kontrahovani za apríl a máj 2021 (% z alokácie)	0,03 %	2,00 %

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

8 Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia

ÚLOHY / ODPOČTY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 1 OPLZ) NA ROK 2021	
1.	<p>Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme minimálne 105 mil. EUR. T: 30. 11. 2021 Plní sa. Aktuálne čerpanie od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021 je v objeme 20 299 252 EUR (zdroje EÚ).</p>
2.	<p>Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31. 12. 2021. Plní sa. MŠVVaŠ vyhlásilo dňa 31. 05. 2021 výzvu OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“ v alokácii 7 mil. EUR (zdroje EÚ). Príprava vyzvania pre NP „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v alokácii 16,1 mil. EUR (zdroje EÚ).</p>
3.	<p>Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR. Plní sa.</p>
4.	<p>Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31. 05. 2021 Splnené. Plán čerpania strategických projektov (NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II) bol zaslaný emailom na CKO dňa 7. mája 2021.</p>
5.	<p>Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne. Plní sa. Čerpanie strategického projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ je k 31. 05. 2020 v objeme 8 651 129,68 EUR, čo predstavuje 83,2 % hodnoty objemu čerpania 10 402 708,47 EUR uvedenej v kumulatívnom pláne čerpania k 30. 06. 2021. Čerpanie strategického projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ je k 31. 05. 2020 v objeme 4 654 114,36 EUR, čím presahuje hodnotu objemu čerpania 4 228 151,00 EUR uvedenú v kumulatívnom pláne čerpania k 30. 06. 2021. Zároveň identifikujeme riziko nedočerpania finančných prostriedkov z dôvodu neobsadenia pracovných pozícií asistentov učiteľa, pedagogických asistentov a členov inkluzívneho tímu v jednotlivých školách a školských zariadeniach.</p>
6.	<p>Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30. 09. 2021. Plní sa. Riziká/problémy sú bližšie opísané nižšie v kapitole 9 tohto materiálu.</p>
7.	<p>Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30. 09. 2021 Plní sa. K 31. 05. 2021 všetkých 7 fyzických ukazovateľov výkonnostného rámca PO 1 OP IZ dosahuje nadpriemerné plnenie hodnôt voči Zámeru pre rok 2023. Nižšie plnenie dosahujú 2 finančné ukazovatele výkonnostného rámca PO 1 OP IZ z dôvodu nízkeho čerpania. Ich aktuálne plnenie voči Zámeru pre rok 2023 je 21,3 % za MRR a 30,5 % za VRR.</p>
8.	<p>Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie</p>

s finančným dopadom", „Zistenie nezrovnalostí", „Vymáhanie nezrovnalostí" a „Vysporiadaná nezrovnalosť"), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.

T: 30. 09. 2021

Plní sa.

9. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR.

T: priebežne

Plní sa. Projekty sa realizujú v súlade s harmonogramom realizácie aktivít.

9 Kritické problémy OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie

1. Kritickým problémom OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR je výška čerpanie. Hlavnou príčinou nízkeho čerpania je predovšetkým vysoký počet dopytovo – orientovaných projektov a s tým spojené veľké množstvo predkladaných ŽoP v nízkom, opakujúcim sa objeme. Ide predovšetkým o ŽoP z DOP, v ktorých ide vo veľkej miere predovšetkým o preplácanie mzdových výdavkov, ktoré sú viazané na mesačné mzdy a nedostatočný počet administratívnych kapacít na spracovanie ŽoP a tým spôsobená nízka miera čerpania.

Návrhy na riešenie:

Zjednodušenie procesov administrácie počas implementácie projektov - SO neustále analyzuje možnosti a spôsoby vedúce k urýchleniu čerpania PO 1. V súčasnosti prebieha komunikácia s CKO ohľadom hľadania možnosti uplatnenia zmien v postupoch administratívnej finančnej kontroly.

Výzva pre prijímateľov národných projektov s požiadavkou na akceleráciu čerpania finančných prostriedkov - Mailom GR ŠŠF EU MŠVVaŠ SR zo dňa 25. 02. 2021 boli všetci prijímatelia národných projektov informovaní o potrebe maximalizácie úsilia v predkladaní finančných prostriedkov prostredníctvom žiadostí o platbu a urýchleniu všetkých procesov súvisiacich s obstarávaním tovarov a služieb. V tejto súvislosti sú prijímatelia povinní zasielať každomesačné odhady očakávaných výdavkov, ktoré sú predmetom posúdenia SO.

Posilnenie administratívnych kapacít implementačnej zložky sekcie štrukturálnych fondov EU MŠVVaŠ SR - V aktuálnom období dochádza k zvýšeniu počtu projektových manažérov vykonávajúcich kontrolu žiadostí o platbu a kontrolu VO, a to prostredníctvom obsadzovania voľných pracovných miest, vnútornou reorganizáciou sekcie a zamestnávaním externých pracovníkov. Uvedené opatrenie má pozitívny efekt na dĺžku spracovania predkladaných žiadostí o platbu.

Využívanie foriem zjednodušeného vykazovania výdavkov v rámci implementácie projektov z výziev/vyzvaní roka 2019 a 2020 (vstupujúce do financovania v rokoch 2020 – 2023) - Implementácia projektov, v rámci ktorých dochádza k uplatňovaniu výdavkov prostredníctvom zjednodušeného vykazovania výdavkov, čo výrazným spôsobom zjednodušuje a zrýchľuje proces spracovávania žiadostí o platbu.

Uplatňovanie udelenej výnimky CKO zo SR EŠIF na po 2014 – 2020, verzia 9 v znení: „SO OP LZ je oprávnený počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nevykonávať finančnú kontrolu na mieste počas realizácie aktivít projektov OPLZ. Zároveň je SO OPLZ povinný vykonať všetky dotknuté finančné kontroly na mieste projektov OPLZ po odvolaní mimoriadnej situácie.“ - SO v súčasnosti nevykonáva finančnú kontrolu na mieste, ktorá by vzhľadom na vysoký počet implementovaných projektov výrazným spôsobom zasiahla do činností administratívnych kapacít SO. Do budúcnosti je snahou SO vykonávať finančnú kontrolu na mieste iba na vzorke projektov, čím by sa výrazným spôsobom znížila administratívna záťaž implementačnej zložky SO.

2. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nákazy vírusu COVID-19 dochádza k pozastaveniu realizácie aktivít projektov a predlžovaniu harmonogramu ich realizácie. Uvedené môže mať negatívny dopad na výšku čerpania finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie.

Návrh na riešenie: Predlžovanie realizácie projektov nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z výzvy na predkladanie ŽoNFP.

3. V rámci zákaziek s nízkou hodnotou SO eviduje veľké množstvo nespracovaných VO, ktoré boli na SO predložené osobitne alebo v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu.

Návrh na riešenie: Navyšovanie administratívnych kapacít prostredníctvom zamestnávania externých pracovníkov.
