



Informácia o stave implementácie programov
cezhraničnej spolupráce spolu s vyhodnotením úloh
a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu
Implementácia európskych štrukturálnych a
investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021 vrátane
informácií o kritických problémoch programov
cezhraničnej spolupráce k 31.5.2021

Obsah

I.	Úvod.....	3
II.	Stav implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK- CZ k 31.05.2021.....	4
	A) Stav kontrahovania a čerpania	4
	B) Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31.3.2021. .	6
	C) Informácie o kritických problémoch implementácie programu	11
	D) Prijaté opatrenia:.....	12
III.	Stav implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT k 31.05.2021.....	13
	A) Stav kontrahovania a čerpania	13
	B) Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31.3.2021.15	
	C) Informácie o kritických problémoch implementácie programu	19
	D) Prijaté opatrenia:.....	20
IV.	Zoznam použitých skratiek.....	22



I. Úvod

MIRRI SR predkladá na základe bodu B.2. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 Informáciu o stave implementácie programov cezhraničnej spolupráce spolu s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021 vrátane informácií o kritických problémoch programov cezhraničnej spolupráce k 31.5.2021.

Cieľom materiálu je poskytnúť vláde SR informáciu o stave implementácie programov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, prehľad v kontrahovaní a čerpaní EŠIF spolu s vyhodnotením úloh a opatrení k 31.5.2021, vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021 vrátane pokroku oproti stavu implementácie zo strany RO, ktorým je MIRRI SR od 31.3.2021.

Materiál popisuje stav kontrahovania a čerpania programov cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ a Interreg SK-AT k 31.5.2021, pričom popisuje progres v implementácii aj v porovnaní so stavom k 31.3.2020.

Zároveň materiál popisuje kritické problémy programov cezhraničnej spolupráce Interreg, ktoré súvisia s pomalším čerpaním alokácie programov, čiastočne nedostatočným výkonom prijímateľov, a taktiež s negatívnym dopadom pandémie Covid -19.

RO v závere materiálu popisuje prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie a zlepšenie stavu výkonu programov cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ a Interreg SK-AT.

II. Stav implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK- CZ k 31.05.2021

RO: MIRRI SR

A) Stav kontrahovania a čerpania

K 31.5.2021 je stav kontrahovania programu v sume 76 243 901 EUR (EÚ zdroj), čo predstavuje 84,58% podiel z celkovej alokácie programu. V porovnaní so stavom k 31.3.2020 ide o nárast o 11,46 % alokácie programu. Plnenie odporúčaného plánu kontrahovania k 31.12.2021 je na úrovni 93,98%.


Tabuľka č. 1 Kontrahovanie k 31.5.2021:

Názov PCS v gescii rezortu	Alokácia 2014-2020 (EÚ zdroj) v EUR	Kontrahova nie k 31.5.2021 (EÚ zdroj) v EUR	% kontrahov anie k 31.5. 2021	Plán kontrahovania na r. 2021 v EUR v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie v roku 2021 od 01.01.2021 do 31.5.2021 v EUR	% plnenia odporúčané ho plánu kontrahovan ia k 31.12.2021	Zostáva nakontrahovať z odporúčaného plánu kontrahovania do 31.12.2021 v EUR (EÚ zdroj)
INTERREG SK-CZ	90 139 463	76 243 901	84,58	81 125 516,7 (90%alokácie)	8 753 345,00	93,98	4 881 615,7

Zdroj: ITMS2014+

Kontrahovanie k 31.5.2021 v porovnaní so stavom k 31.3.2021 vzrástlo o 3,83 mil. EUR. Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov k 31.5.2021 znázorňuje graf č. 1 a pokrok od roku 2014 - programového obdobia je uvedený v tabuľke č. 2 ročne, kumulatívne a v percentách v pomere k alokácii programu. Program INTERREG SK-CZ bol schválený zo strany EK v júni 2015, kontrahovanie prvých finančných prostriedkov z programu začalo od roku 2018.

Graf č. 1 Pokrok v kontrahovaní k 31.5.2021:

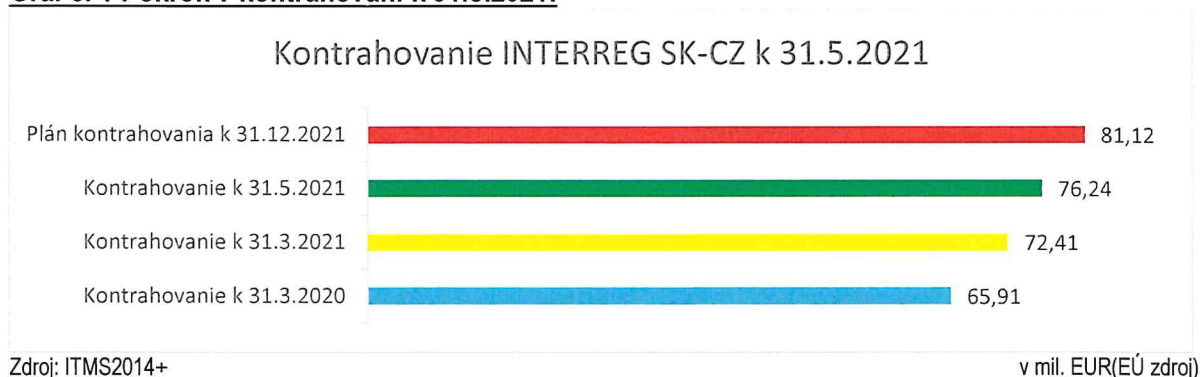

Zdroj: ITMS2014+



Tabuľka č. 2 Pokrok v kontrahovaní k 31.5.2021 od roku 2014 – programového obdobia:

INTERREG V-A SK-CZ	Kontrahovanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Kontrahovanie kumulatívne za zdroj EÚ (EUR)	kumulatívne % v porovnaní s alokáciou
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	46 335 058,00	46 335 058,00	51,40
2019	20 116 860,00	66 451 918,00	73,72
2020 (do 3/2020)	-538 387,00 *	65 913 531,00	73,12
2020 (od 4/2020)	1 577 025,00	67 490 556,00	74,87
2021 (do 05/2021)	8 753 345,00	76 243 901,00	84,58

Zdroj: ITMS2014+

*rozdiel zapríčinený zostatkom z ukončených projektov

K 31.5.2021 je stav čerpania programu na úrovni 35,42% a v porovnaní so stavom k 31.3.2020 ide o nárast o 22,93% alokácie programu. Pre naplnenie pravidla n+3 pre tento rok 2021 je potrebné do 30.12.2021 deklarovať na EK sumu vo výške 2 239 548,65 EUR.

Tabuľka č. 3 Čerpanie k 31.5.2021:

Názov PCS v gescii rezortu	Alokácia 2014-2020 v EUR (EÚ zdroj)	Čerpanie k 31.5.2021 v EUR (EÚ zdroj)	% čerpanie k 31.5.2021	Plán čerpania na r. 2021 v EUR v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 (EÚ zdroj)	Čerpanie v roku 2021 od 01.01.2021 do 31.5.2021 v EUR (EÚ zdroj)	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z odporúčaného ročného plánu do 31.12.2021 v EUR (EÚ zdroj)
INTERREG SK-CZ	90 139 463	31 929 868,60	35,42	18 000 000	4 806 360,38	26,7	13 193 639,62

Zdroj: CO(MF SR)


K 31.5.2021 boli v roku 2021 na úrovni CO schválené žiadosti o platbu vo výške 4 806 360 EUR, plnenie odporúčaného plánu čerpania na rok 2021 predstavuje 26,7%.

Čerpanie programu za celé programové obdobie je k 31.5.2021 vo výške 31 929 868,6 EUR.

Pokrok v čerpaní finančných prostriedkov k 31.5.2021 znázorňuje graf č. 2 a pokrok od roku 2014 programového obdobia je uvedený v tabuľke č. 4 ročne, kumulatívne a v percentách v pomere k alokácii programu.



Graf č. 2 Čerpanie INTERREG SK-CZ v roku 2021:

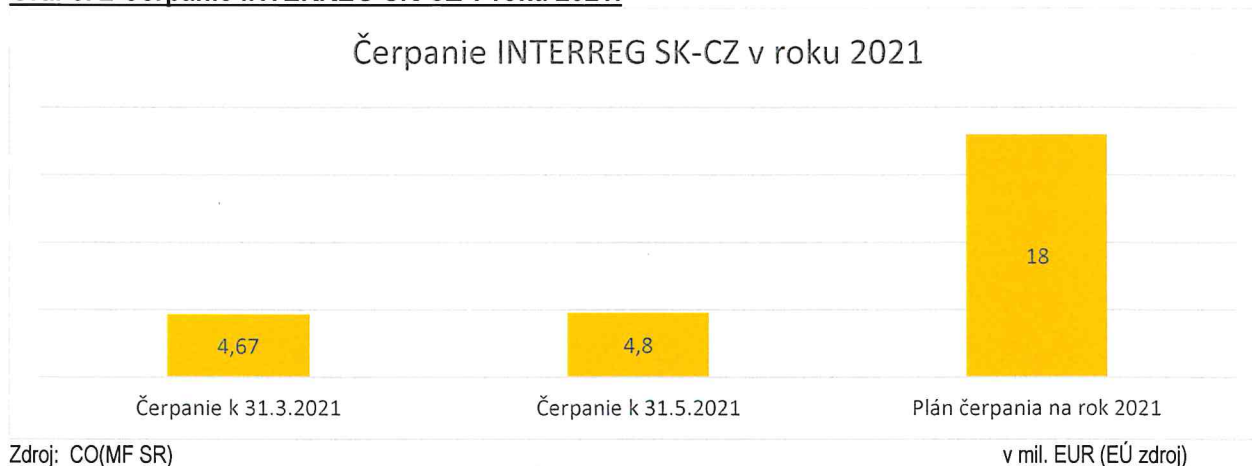

Tabuľka č. 4 Pokrok v čerpaní k 31.5.2021 od roku 2014 – programového obdobia:

INTERREG V-A SK-CZ	Čerpanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	čerpanie kumulatívne za zdroj EÚ (EUR)	kumulatívne % v porovnaní s alokáciou
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	2 248 802,02	2 248 802,02	2,49
2019	9 015 229,02	11 264 031,04	12,50
2020 (do 3/2020)	-2 142,36	11 261 888,68	12,49
2020 (od 4/2020)	15 765 092,04	27 026 980,72	29,98
2021 (do 05/2021)	4 902 919,26	31 929 899,98	35,42

Zdroj: CO(MF SR)

*rozdiel zapríčinený nezrovnalosťou

B) Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31.3.2021.

Úloha č. 1 Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 18 000 000 EUR (EU zdroj).

T: do 30.11.2021.

RO za účelom zabezpečenia čerpania v zmysle uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 v objeme 18 000 000 EUR na rok 2021 vykonáva nasledovné:

- Priebežne monitoruje a vyhodnocuje stav implementácie programu a kľúčových projektov na týždennej báze.
- Kontinuálne zabezpečuje školenia a informačné semináre pre prijímateľov; proaktívne komunikuje so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov minimalizovaním chýb na strane prijímateľa a zabezpečením predkladania ŽoP podľa dohodnutých harmonogramov.
- Vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID-19, pristúpil na formu virtuálnych konzultácií, seminárov, zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru tak, aby proces implementácie pokračoval plynulo a bez vonkajších obmedzení. RO aktívne komunikuje s prijímateľmi s cieľom efektívnej pomoci pri predkladaní a kompletizácii dokumentácie.
- Dňa 10.6.2021 bola v rámci PO 2 Kvalita životného prostredia zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-



- CZ/2021/13 zameraná na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v alokácii vo výške 1 890 000 EUR (EÚ zdroj). Termín uzavretia je 15.10.2021.
- RO skracuje lehoty na výkon kontroly VO, predkladania ZDV a ŽoP.
 - RO pripravuje analýzu projektov z pohľadu rizikovosti, kde budú popísané lehoty jednotlivých procesov (verejné obstarávanie, ZDV a ŽoP).
 - RO zanalyzoval stav kľúčových/strategických projektov, ktoré priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze, zároveň však pripravuje listom podpredsedníčky vlády požiadavku na rizikových prijímateľov o zrýchlenie implementácie projektov (Trnavský samosprávny kraj).
 - Z odporúčaného ročného plánu čerpania do 31.12.2021 zostáva vyčerpať sumu v objeme 13 193 639,62 EUR.
 - Splnenie finančného záväzku (pravidla n+3) sa predpokladá k septembru 2021.
- Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 2 Zabezpečiť kontrahovanie celého programu a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.

- Priebežne prebieha zazmluvňovanie projektov schválených v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. Zároveň v priebehu mája 2021 bolo na Spoločnom monitorovacom výbore schválených 12 ŽoNFP v celkovej sume 2 859 655,30 EUR (EÚ zdroj) a ďalších 8 bolo zaradených do zásobníka projektov.
- Kontrahovanie k 31.5.2021 oproti stavu k 31.3.2021 vzrástlo o 3,83 mil. EUR. Z odporúčaného plánu kontrahovania do 31.12.2021 zostáva nakontrahovať sumu v objeme 4 881 615,7 EUR.

Tabuľka č. 5 Kontrahovanie programu k 31.5.2021 na úrovni jednotlivých prioritných osí oproti stavu k 31.3.2021:


Interreg SK-CZ	Alokácia (EÚ zdroj) v EUR	Kontrahovanie k 31.3.2021 (EÚ zdroj) v EUR	%	Kontrahovanie k 31.5.2021 (EÚ zdroj) v EUR	%	rozdiel/ navýšenie %	rozdiel v EUR
PO1	13 268 529	10 239 428	77,17	10 988 620	82,82	5,65	749 192
PO2	62 340 452	48 798 095	78,28	51 926 310	83,29	5,01	3 128 215
PO3	9 122 115	8 455 609	92,69	8 407 102	92,16	0,53	-48 507
PO4	5 408 367	4 921 868	91,00	4 921 868	91,00	0,00	0
Spolu	90 139 463	72 415 000	80,34	76 243 901	84,58	4,24	3 828 901

Zdroj: ITMS2014+


*rozdiel zapríčinený zostatkom z ukončených projektov

Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov k 31.5.2021 znázorňuje graf č. 3 a pokrok podľa jednotlivých prioritných osí je uvedený v grafe č. 4. Za obdobie od 31.3.2021 do 31.5.2021 bol zaznamenaný najvyšší progres v kontrahovaní v rámci prioritnej osi 2 – Kvalita životného prostredia.

Graf č. 3 Pokrok v kontrahovaní k 31.5.2021:

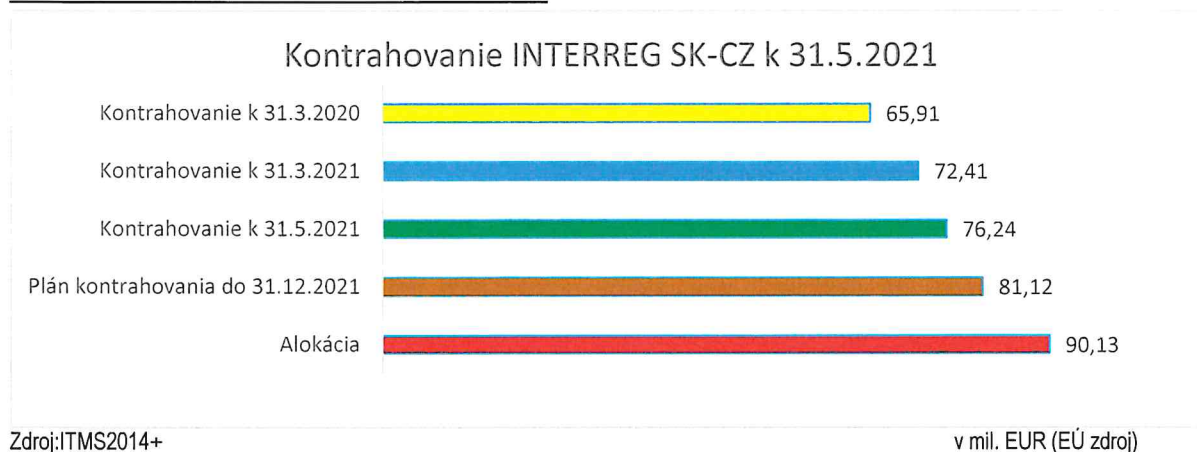

Graf č. 4 Kontrahovanie INTERREG SK-CZ k 31.5.2021 podľa prioritných osí

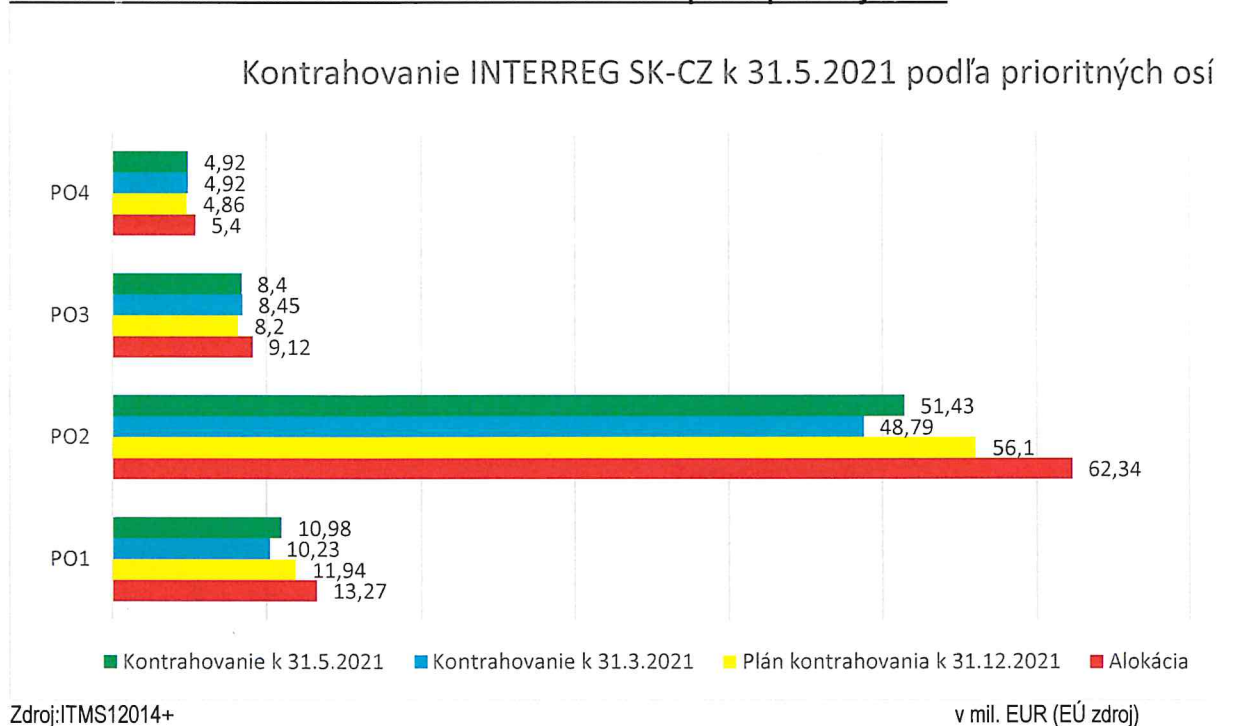

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 3 Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.

- V priebehu mája 2021 bola v rámci PO 2 Kvalita životného prostredia pripravovaná výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameraná na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Alokácia na výzvu je so zohľadnením aktuálnych úspor z projektov a zostatkov z ukončených projektov vo výške 1 890 000 EUR (EÚ zdroj). Súčasťou výzvy bude aj vytvorenie zásobníka projektov a v prípade dispozície ďalších voľných finančných prostriedkov programu bude možné po schválení zo strany Spoločného monitorovacieho výboru podporiť a zazmluvniť projekty zo zásobníka tak, aby bola nakontrahovaná 100% alokácia programu. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 bola vyhlásená dňa 10.6.2021 a touto výzvou bude dosiahnutých 97,8% alokácie programu.

Úloha sa plní priebežne.



Úloha č. 4 Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.

- Predloženie výdavkov na CO so 100% financovaním bolo pre program Interreg V-A SK-CZ v maximálne možnej miere využité do 31.3.2021. RO realizoval kontrolu a schválenie žiadosti o platbu s cieľom v čo najvyššej možnej miere využiť 100% kofinancovanie zo strany EK v 7. účtovnom roku. V 7. účtovnom roku boli predložené výdavky vo výške 22 159 910,03 EUR.
- Od 01.01.2021 do 31.3.2021 boli v súhrnných ŽoP deklarované výdavky v sume 4 670 000 EUR.

Úloha splnená.

Úloha č. 5 Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.

- RO doplnil štvrťročný plán čerpania kľúčových/strategických projektov, ktorý zároveň predkladá v prílohe č. 1_Interreg V-A SK-CZ štvrťročný plán čerpania strategických projektov k 31.5.2021. Projekty pravidelne monitoruje a vyhodnocuje potenciálne riziká v priebehu implementácie vrátane zohľadnenia ich pokroku s cieľom zabezpečiť čerpanie alokácie programu v dostatočnej výške. Čerpanie kľúčových/strategických projektov v počte 11 je k 31.5.2021 vo výške 6 492 969,77 EUR. Plán čerpania k 31.12.2021 je stanovený na 13 559 886,38 EUR.

Úloha splnená.

Úloha č. 6 Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.

- RO implementáciu programu vrátane kľúčových/strategických projektov priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze. V prípade potreby pripraví a predloží návrh Spoločnému monitorovaciemu výboru na presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty v rámci inej prioritnej osi alebo špecifického cieľa s potenciálom ich využitia. Posledná realokácia programu sa uskutočnila v júni 2020. V prílohe č. 1 predkladáme štvrťročný plán čerpania strategických projektov k 31.5.2021.
- Čerpanie kľúčových/strategických projektov v počte 11 je k 31.5.2021 vo výške 6 492 969,77 EUR. Plán čerpania k 31.12.2021 je stanovený na 13 559 886,38 EUR.

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 7 Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, najmä v rámci kritickej prioritnej osi 1, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.

- RO implementáciu programu priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze. V prípade potreby pripraví návrh vnútornej realokácie programu, t. j. presun finančných prostriedkov v rámci iných PO/ŠC programu. V júni 2020 pristúpil RO k realokácii finančných prostriedkov programu v rámci jeho prioritných osí. V súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) 1299/2013 a čl. 30 CRII RO využil možnosť presunu voľných FP medzi prioritnými osami formou notifikácie na EK na zabezpečenie financovania všetkých projektov zaradených do zásobníka projektov. Vďaka tejto notifikácii bolo možné dodatočne schváliť 2 projektové žiadosti zaradené do zásobníka projektov z výzvy č. INTERREG V-A SK - CZ/2019/11 (ŠC 1.2) a 5 projektových žiadostí zaradených do zásobníka projektov z výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 (ŠC 2.1). Týchto 7 ŽoNFP bolo v celkovej výške 6 958 417,52 EUR za EÚ zdroj. V máji 2021 bolo na Spoločnom monitorovacom výbore v rámci prioritnej osi 1, špecifický cieľ 1.1. zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce



s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce schválených 12 ŽoNFP, v celkovej sume 2 8590 665 EUR, ich kontrahovanie prebehne po preukázaní splnenia podmienok poskytnutia príspevku v 3. a 4. kvartáli 2021. RO na základe interných analýz vyhodnotil, že v aktuálnom stave implementácie programu sa nateraz nejaví potreba revízie programu, a to za predpokladu, že vo výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 bude predložené a schválené dostatočné množstvo projektových žiadostí, vrátane schválenia zásobníka projektov. V takom prípade RO zaktualizuje plán výziev tak, že vyššie uvedená výzva bude poslednou.

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 8 Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.

- RO priebežne analyzuje a vyhodnocuje stavy plnenia merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023. K 31.05.2021.
- Vzhľadom na aktuálne dosiahnutý stav ukazovateľov, RO neidentifikoval nateraz potrebu revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov. Cieľové hodnoty ukazovateľov sa vyhodnocujú pri schvaľovaní záverečných súhrnných monitorovacích správ jednotlivých projektov, v súlade s nastavenými internými postupmi RO. O spôsobe vyhodnocovania merateľných ukazovateľov bola informovaná aj EK.
- Detailnejší prehľad plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov predkladáme v prílohe č. 2, ktorá obsahuje zoznam ukazovateľov výstupu a ich percentuálne vyjadrenie, a to znázorňuje, že program napreduje, a je vysoký predpoklad splnenia všetkých merateľných ukazovateľov ku koncu programového obdobia.

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 9 Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalostí v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalostí“, „Vymáhanie nezrovnalostí“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripraví projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.

- RO má v zásobníku projektov 8 ŽoNFP v celkovej sume 1 680 092,55 EUR (EÚ zdroj).
- S vytvorením zásobníka projektov sa počíta aj pri výzve na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v alokácii vo výške 1 890 000 EUR (EÚ zdroj). Výzva bola vyhlásená dňa 10.6.2021, termín uzavretia je 15.10.2021.

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 10 Vypracovať a predložiť plán vyhlasovania výziev na nezazmluvnené prostriedky v rámci programu. T: do 30.04.2021.

- Harmonogram vyhlasovania výziev na rok 2021 bol vypracovaný a schválený na úrovni Spoločného monitorovacieho výboru dňa 29.9.2020 písomnou procedúrou, v súlade so Systémom riadenia EŠIF. Harmonogram vyhlasovania výziev tvorí prílohu č. 3 tohto materiálu a je zverejnený na webovej stránke programu: <https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/harmonogram-vyziev>.

Úloha splnená.



Úloha č. 11 Zabezpečiť skrátenie procesu výkonu prvostupňovej kontroly predložených výdavkov zo strany prijímateľov (first level control). T: priebežne.

- Výdavky sú priebežne predkladané na miesta prvostupňovej kontroly v SR a ČR, kde sú verifikované. Po schválení výdavkov zo strany prvostupňovej kontroly je možné predložiť žiadosť o platbu na úrovni projektu. Hoci je dvojstupňová kontrola časovo náročnejšia, čerpanie na úrovni programu postupne narastá v primeranom tempe. Prvostupňová kontrola v SR (zriadená na MIRRI SR) je dlhodobá personálne poddimenzovaná, RO vyvíja všetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanými pracovnými silami.
- RO pripravuje analýzu projektov z pohľadu rizikovosti, kde budú popísané lehoty jednotlivých procesov (verejné obstarávanie, ZDV a ŽoP).
- RO pravidelne komunikuje na kvartálnej báze s jednotlivými miestami prvostupňovej kontroly (4 miesta), a v prípade potreby apeluje na zrýchlenie procesu prvostupňovej kontroly výdavkov a tým skrátenie lehoty verifikovania výdavkov. V súčasnom období so stavom k 31.5.2021 RO konštatuje, že lehoty na výkon prvostupňovej kontroly sú dodržiavané.

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 12 Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany EK, bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby deklarovania kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku (100 % spolufinancovanie). T: bezodkladne po schválení EK.

- RO bezodkladne dňa 14.5.2021 po informácii zo strany CO zabezpečil uplatnenie finančnej opravy vo výške 10% kartelových výdavkov. Uplatnená 10% korekcia na kartelové výdavky sa týkala projektu 304021C933 - Na bicykli po stopách histórie.
- Kartelové výdavky v zníženej sume vo výške 1 661 758,96 EUR boli deklarované na EK za 7. účtovný rok.

Úloha sa plní priebežne.

C) Informácie o kritických problémoch implementácie programu

Program Interreg V-A SK-CZ v prvých rokoch svojej implementácie čelil obrovským problémom, ktoré mali dopad na neskoršie začatie implementácie programu t.j. od roku 2017. Následne RO zastabilizoval štruktúry, nastavil spoločne s Národným orgánom v ČR systém riadenia a kontroly a zabezpečil štandardnú implementáciu programu, i keď mnohé problémy pretrvávajú dodnes.

Faktory, ktoré spôsobujú kritické problémy implementácie programu:

- Výrazne negatívny dopad COVID-19 na implementáciu projektov:
 - početné zmeny harmonogramov vedúce k početným predlžovaniam projektov;
 - zmeny v spôsobe realizovania aktivít - presun do online priestoru (v prípade aplikovateľnosti), modifikácie a posuny v organizovaní spoločných akcií;
 - výrazne nižšie výdavky predkladané v porovnaní s plánmi čerpania;
 - problémy nových projektov predkladať nevyhnutné povolenia a potvrdenia, čo výrazne spomalilo proces zazmluvňovania (predovšetkým v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10).
 - 7 projektov pozastavilo realizáciu (v súčasnosti už avizované pokračovanie v implementácii);
- Vzhľadom na to, že na začiatku programového obdobia v roku 2015 RO nezabezpečil podklady a vstupy na vývoj ITMS2014+, monitorovací systém sa vyvíjal oveľa neskôr, v dôsledku čoho v ďalšej implementácii systém ITMS 2014+ v plnej miere nemohol zohľadniť potreby a špecifiká programov cezhraničnej spolupráce a je využívaný iba v obmedzenej miere, čo znamená zvýšenú administratívnu záťaž pre prijímateľov (duplicitné predkladanie dokumentácie), RO preto priebežne komunikuje s CKO/odbor ITMS, s prijímateľmi programu Interreg SK-CZ



a používateľmi systému ITMS2014+ (verejná a neverejná časť) s cieľom uľahčiť a dostatočne vysvetliť prácu v ňom.

- Komplikovaný proces verejného obstarávania – opakované verejné obstarávania – nekompletnosť dokumentácie predkladanej zo strany prijímateľov, vysoká chybovosť, a s tým spojené predlžovanie realizácie projektov s výrazným dopadom na čerpanie programu (investičné projekty).
- Neobsadené personálne kapacity.

D) Prijaté opatrenia:

MIRRI SR od začiatku prechodu kompetencií z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktívne pristupuje k riešeniu problematiky implementácie INTERREG V-A SK-CZ a priebežne prijíma opatrenia s cieľom akcelerovať čerpanie programu:

- Aktívna komunikácia so žiadateľmi a partnermi projektov. Poskytovanie pomoci s evidovaním údajov v systéme ITMS2014+.
- Zabezpečenie školení a/alebo konzultácií, či iných informačných seminárov pre prijímateľov; proaktívna komunikácia so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov minimalizovaním chýb na strane prijímateľa a zabezpečiť predkladanie žiadostí o platbu podľa dohodnutých harmonogramov.
- Vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID-19, pristúpenie na formu virtuálnych konzultácií, seminárov, zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru tak, aby proces implementácie pokračoval plynulo a bez vonkajších obmedzení.
- Priebežné a pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie stavu implementácie na týždennej úrovni, a v prípade identifikácie konkrétnych problémov v projektoch, ich operatívne riešenie v súčinnosti s prijímateľmi.
- Ukončenie schvaľovacieho procesu predložených ŽoNFP (na SMV v máji 2021) a následne čo najskoršie zazmluvňovanie schválených projektov (závisí od preukázania podmienok poskytnutia príspevku žiadateľom).
- Príprava analýzy projektov z pohľadu rizikovosti, kde bude budú popísané lehoty jednotlivých procesov (verejné obstarávanie, ZDV a ŽoP);
- Zanalyzovanie stavu kľúčových/strategických projektov, ktoré priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze, zároveň však RO pripravuje listom podpredsedníčky vlády požiadavku na rizikových prijímateľov o zrýchlenie implementácie projektov (Trnavský samosprávny kraj).
- V prípade potreby výzva FLC na skrátenie procesu verifikácie výdavkov. Druhostupňová kontrola na STS vykonáva kontrolu žiadosti o platbu bezodkladne.
- RO zanalyzoval stav kľúčových/strategických projektov, ktoré priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze, zároveň však pripravuje listom podpredsedníčky vlády požiadavku na rizikových prijímateľov o zrýchlenie implementácie projektov (Trnavský samosprávny kraj).
- RO vyvíja všetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanými pracovnými silami.



III. Stav implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT k 31.05.2021

RO: MIRRI SR

A) Stav kontrahovania a čerpania

K 31.5.2021 je stav kontrahovania programu v sume 64 529 455,92 EUR (EÚ zdroj), ktorý predstavuje 85,03% podiel z celkovej alokácie programu (tabuľka č. 6), čo v porovnaní so stavom k 31.3.2020 predstavuje nárast o 19,02% alokácie programu.


Tabuľka č. 6 Kontrahovanie k 31.5.2021

Názov PCS v gescii rezortu	Alokácia 2014- 2020 v EUR (EÚ zdroj)	Kontrahovanie k 31.5.2021 (EÚ zdroj) v EUR	% kontrah ovania k 31.5.2 021	Plán kontrahovania na r. 2021 v EUR v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 (EÚ zdroj) v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.5.2021 v EUR	% plnenia odporúčané ho ročného plánu kontrahovan ia	Zostáva nakontrah ovať z odporúč aného ročného plánu do 31.12.202 1 v EUR
INTERREG SK-AT	75 892 681	64 529 455,92	85,03	68 303 412,9 (90%)	10 389 282,4	94,47	3 773 956, 98

Zdroj: ITMS2014+, CO(MF SR)

Kontrahovanie k 31.5.2021 v porovnaní so stavom k 31.3.2021 vzrástlo o 3,71 mil. EUR. Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov k 31.5.2021 znázorňuje graf č. 5 a pokrok od roku 2014 - programového obdobia je uvedený v tabuľke č. 7 ročne, kumulatívne a v percentách v pomere k alokácii programu. Program INTERREG SK-AT bol schválený zo strany EK v júni 2015, kontrahovanie finančných prostriedkov z programu začalo od roku 2018.

Graf č. 5 Kontrahovanie INTERREG SK-AT k 31.5.2021

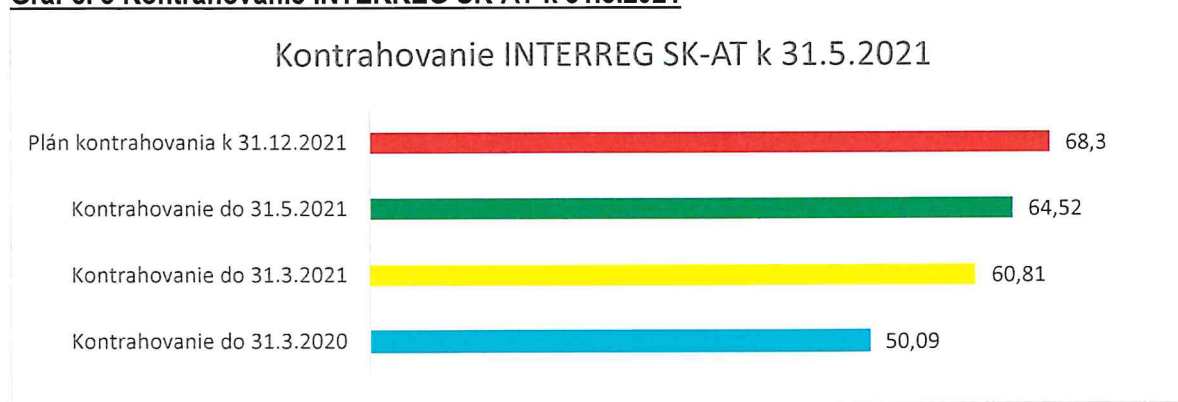

Zdroj: ITMS2014+

v mil. EUR

Tabuľka č. 7 Pokrok v kontrahovaní k 31.5.2021 od roku 2014 – programového obdobia:

Rok	Kontrahovanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne kontrahovanie za zdroj EÚ (EUR)	kumulatívne % v porovnaní s alokáciou
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	36 611 958,45	36 611 958,45	48,24
2019	12 889 001,87	49 500 960,32	65,22
2020 (do 3/2020)	592 372,68	50 093 333,00	66,01
2020 (od 4/2020)	4 046 840,52	54 140 173,52	71,34
2021 (do 05/2021)	10 389 282,40	64 529 455,92	85,03

Zdroj: ITMS2014+

K 31.5.2021 je stav čerpania programu na úrovni 24,71 % a v porovnaní so stavom k 31.3.2020 ide o nárast o 14,52 % alokácie programu (tabuľka č. 8). Pre naplnenie pravidla n+3 pre tento rok 2021 je potrebné do 31.12.2021 deklarovať na EK sumu vo výške 11 378 885 EUR.

Tabuľka č. 8 Čerpanie k 31.5.2021

Názov PCS gescii rezortu	Alokácia 2014-2020 v EUR	Čerpanie k 31.5.2021 (od zač. PO) v EUR	% čerpania k 31.5. 2021	Plán čerpania na r. 2021 v EUR v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 (EÚ zdroj)	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.5.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z odporúčaného ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
INTERREG SK-AT	75 892 681	18 756 063,16	24,71	17 000 000	939 648,74	6	16 017 513,27


Zdroj: CO(MF SR)

K 31.5.2021 boli v roku 2021 na úrovni CO schválené žiadosti o platbu vo výške 285 tis. EUR, plnenie odporúčaného plánu čerpania na rok 2021 predstavuje 6%.

Čerpanie programu za celé programové obdobie je k 31.5.2021 vo výške 18 756 063,16 EUR.

Pokrok v čerpaní finančných prostriedkov k 31.5.2021 znázorňuje graf č. 6 a pokrok od roku 2014 - programového obdobia je uvedený v tabuľke č. 9 ročne, kumulatívne a v percentách v pomere k alokácii programu.

Graf č. 6 Čerpanie INTERREG SK-AT v roku 2021

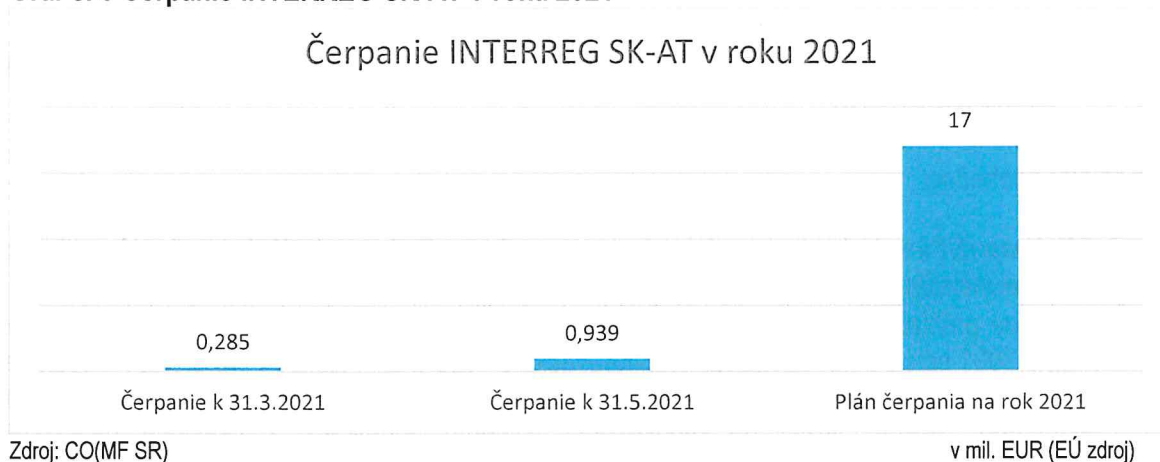

Tabuľka č. 9 Pokrok v čerpaní k 31.5.2021 od roku 2014 – programového obdobia:

Rok	Čerpanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Čerpanie za zdroj EÚ (EUR)	kumulatívne % v porovnaní s alokáciou
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1 909 376,19	1 909 376,19	2,52
2019	5 694 554,25	7 603 930,44	10,02
2020 (do 3/2020)	129 709,93	7 733 640,37	10,19
2020 (od 4/2020)	10 082 774,05	17 816 414,42	23,48
2021 (do 05/2021)	939 648,74	18 756 063,16	24,71

Zdroj: CO(MF SR)

B) Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31.3.2021.

Úloha č. 1 Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 17 000 000 EUR (EU zdroj). T: do 30.11.2021.

- RO za účelom zabezpečenia čerpania v zmysle odporúčania CKO v objeme 17 000 000 EUR na rok 2021 priebežne monitoruje a vyhodnocuje stav implementácie programu na týždennej báze.
- RO/Spoločný sekretariát zabezpečuje a plánuje v priebehu júna 2021 ďalšie informačné semináre pre prijímateľov; proaktívne komunikuje so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov minimalizovaním chýb na strane prijímateľa a zabezpečením predkladania ŽoP podľa dohodnutých harmonogramov.
- Spoločný sekretariát na pravidelnej báze komunikuje s jednotlivými prvostupňovými kontrolami za účelom zefektívnenia čerpania finančných prostriedkov.
- RO skracuje lehoty na výkon kontroly VO, predkladania ZDV a ŽoP.
- RO pripravuje analýzu projektov z pohľadu rizikovosti, kde budú popísané lehoty jednotlivých procesov (verejné obstarávanie, ZDV a ŽoP).



- RO zanalyzoval stav kľúčových/strategických projektov, ktoré priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze, zároveň však pripravuje listom podpredsedníčky vlády požiadavku na rizikových prijímateľov na zrýchlenie implementácie projektov (Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj).
- Z odporúčaného ročného plánu čerpania do 31.12.2021 zostáva vyčerpať sumu v objeme 16 017 513,27 EUR.
- Splnenie finančného záväzku (pravidla n+3) sa predpokladá k decembru 2021.

Úloha sa plní priebežne.


Úloha č. 2 Zabezpečiť kontrahovanie celého programu a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.

- Priebežne prebieha zazmluvňovanie projektov schválených v rámci 6. a 7. hodnotiaceho kola. V apríli 2021 bolo na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru schválených 8 projektov v celkovej sume 6 220 252,82 EUR za zdroj EFRR pri zníženom kofinancovaní a v priebehu mája 2021 boli žiadateľom zaslané výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Kontrahovanie schválených ŽoNFP sa očakáva v priebehu 3. až 4. kvartálu 2021 po preukázaní splnenia podmienok poskytnutia príspevku.
- Z odporúčaného plánu kontrahovania do 31.12.2021 zostáva nakontrahovať sumu v objeme 3 773 956,98 EUR.
- Kontrahovanie programu je k 31.5.2021 na úrovni jednotlivých prioritných osí nasledovné:

Tabuľka č. 10 Kontrahovanie programu k 31.5.2021 na úrovni jednotlivých prioritných osí oproti stavu k 31.3.2021:

Interreg SK-AT	Alokácia (EÚ zdroj)	Kontrahovanie k 31.3.2021 (EÚ zdroj) v EUR	%	Kontrahovanie k 31.5.2021 (EÚ zdroj) v EUR	%	rozdiel v %	rozdiel v EUR
PO 1	19 683 142 €	15 712 689 €	79,84	18 018 761 €	91,54	11,70	2 303 072 €
PO 2	27 820 000 €	25 632 403 €	92,14	26 138 514 €	93,96	1,82	506 111 €
PO 3	9 655 000 €	5 025 880 €	52,05	5 025 880 €	52,05	0,00	0 €
PO 4	14 180 979 €	10 016 045 €	70,63	10 920 508 €	77,01	6,38	904 463 €
PO 5	4 553 560 €	4 425 793 €	97,19	4 425 793 €	97,19	0,00	0 €
Spolu	75 892 681 €	60 812 810 €	80,13	64 529 456 €	85,03	4,69	3 713 645 €

Graf č. 7 Kontrahovanie INTERREG SK-AT k 31.5.2021

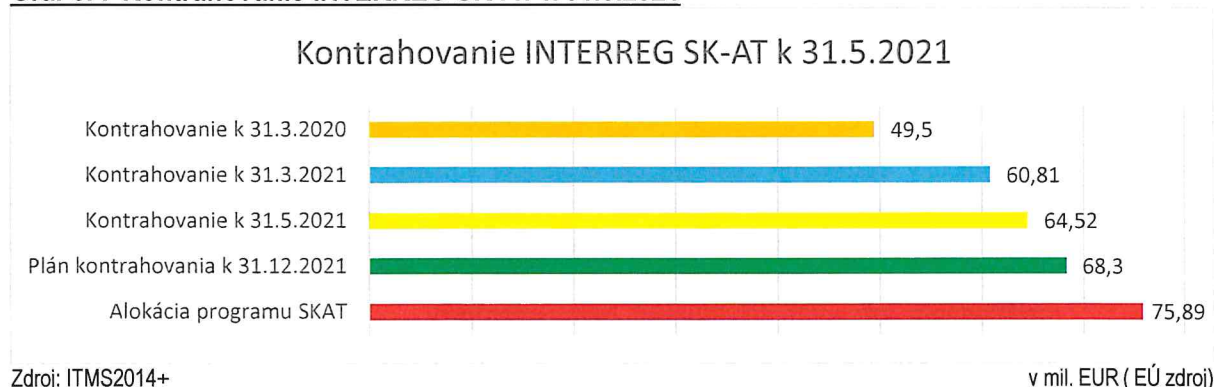


Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov k 31.5.2021 znázorňuje graf č. 7 a pokrok podľa jednotlivých prioritných osí je uvedený v grafe č. 8. Za obdobie od 31.3.2021 do 31.5.2021 bol



zaznamenaný najvyšší progres v kontrahovaní v rámci prioritnej osi 1 – Prispievane k inteligentnému cezhraničnému regiónu.

Graf č. 8 Kontrahovanie INTERREG SK-AT k 31.5.2021 podľa prioritných osí

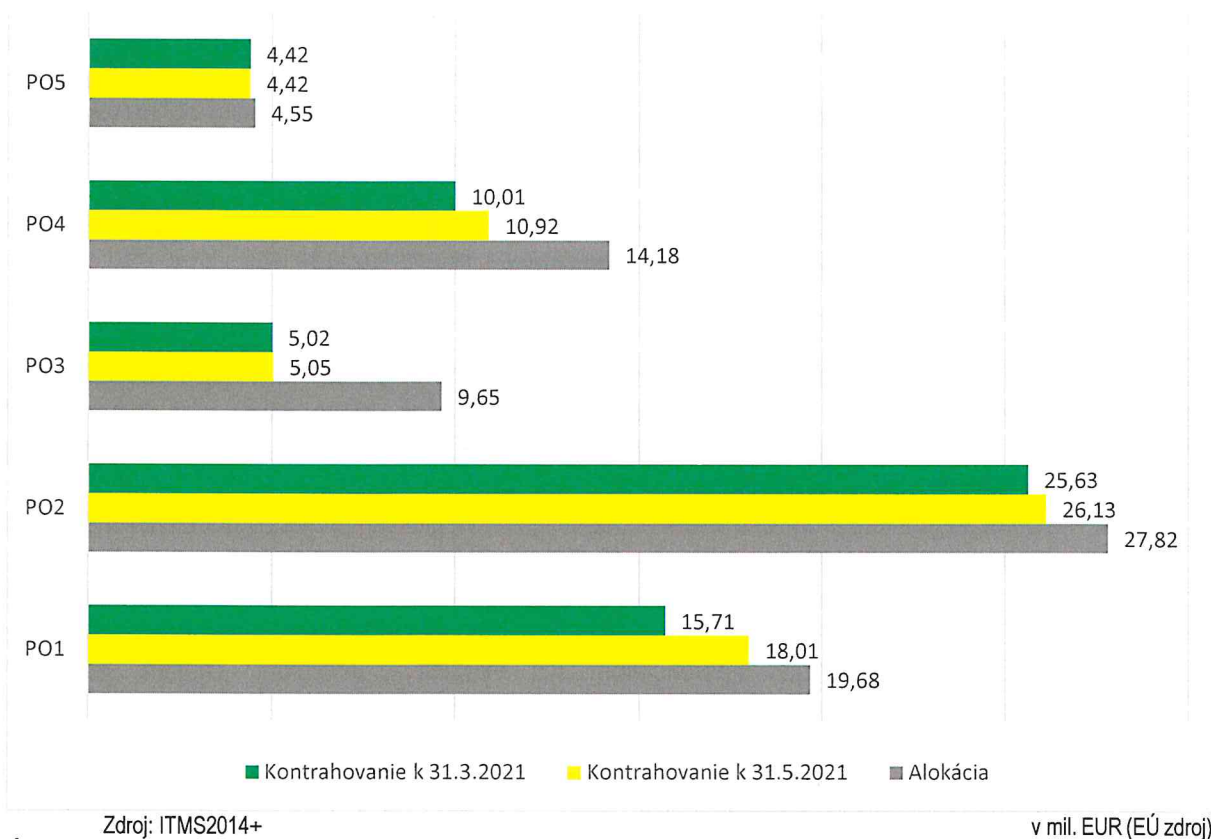

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 3 Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.

- Na programe Interreg SK-AT boli v roku 2016 vyhlásené otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na celú alokáciu programu, t. j. 75 892 681 EUR. Zároveň, na ostatnom zasadnutí Monitorovacieho výboru v apríli 2021 boli schvaľované ŽoNFP v celkovej sume 6 220 252,82 EUR za zdroj EFRR pri zníženom kofinancovaní predložené v rámci 8. hodnotiaceho kola. Zároveň bolo schválené nadkontrahovanie finančných prostriedkov pre slovenských partnerov, aby bolo možné schváliť projekty nad rámec dostupnej alokácie. Uplatnením tohto inštitútu alokácia Programu dosiahla úroveň 103,05 %, avšak na základe výpočtov a odhadov RO sa nepredpokladá ku koncu programového obdobia nadčerpanie alokácie. Ďalšie vyhlásenie výziev, resp. uzávierka ďalšieho hodnotiaceho kola nie je plánovaná.

Úloha splnená.

Úloha č. 4 Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.

- Predloženie výdavkov na CO so 100% financovaním bolo pre program Interreg V-A SK-AT v maximálne nožnej miere využité do 31.3.2021. RO realizoval kontrolu a schválenie predložených žiadostí o platbu s cieľom v čo najvyššej možnej miere využiť 100% kofinancovanie zo strany EK v 7. účtovnom roku. V 7. účtovnom roku boli predložené výdavky vo výške



10 229 408,58 EUR. Vzhľadom k potrebe naplnenia cieľa n+3 boli všetky dostupné výdavky v projektoch predložené 9 920 000 EUR na CO do konca roka 2020.

- Od 1.1.2021 do 31.3.2021 v súhrnných žiadostiach o platbu deklarované výdavky v sume 285 000 EUR.

Úloha splnená.

Úloha č. 5 Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.

- RO doplnil štvrtročný plán čerpania kľúčových/strategických projektov, ktorý zároveň predkladá v prílohe č. 4_Interreg V-A SK-AT štvrtročný plán čerpania strategických projektov k 31.5.2021. Projekty pravidelne monitoruje a vyhodnocuje potenciálne riziká v priebehu implementácie vrátane zohľadnenia ich pokroku s cieľom zabezpečiť čerpanie alokácie programu v dostatočnej výške.
- Čerpanie kľúčových/strategických projektov v počte 8 je k 31.5.2021 vo výške 6 857 699 EUR. Plán čerpania k 31.12.2021 je stanovený na 13 922 574,9 EUR.

Úloha splnená.

Úloha č. 6 Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.

- RO implementáciu programu vrátane kľúčových/strategických projektov priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze. Na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru v apríli 2021 bol schválený presun voľných disponibilných prostriedkov v celkovom objeme 1 560 000 EUR z PO 3 Podpora udržateľných dopravných riešení do PO 2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity s potenciálom ich využitia v programe. Záujem žiadateľov o predloženie projektov v PO 2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity presahuje alokáciu danej PO, zatiaľ čo záujem v PO 3 Podpora udržateľných dopravných riešení je dlhodobo nízky. Presunuté zdroje tak budú využité rýchlo a efektívne. RO aktuálne pripravuje návrh na realokáciu na EK.
- Čerpanie kľúčových/strategických projektov v počte 8 je k 31.5.2021 vo výške 6 857 699 EUR. Plán čerpania k 31.12.2021 je stanovený na 13 922 574,9 EUR.

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 7 Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, najmä v rámci kritickej prioritnej osi 3, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.

- Na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru v apríli 2021 bol schválený presun voľných disponibilných prostriedkov z PO 3 do PO 2 s potenciálom ich využitia v programe.
- RO aktuálne pripravuje návrh na realokáciu na EK.

Úloha č. 8 Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.

- RO priebežne analyzuje a vyhodnocuje stavy plnenia merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023. K 31.05.2021 RO neidentifikoval potrebu revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov.
- Detailnejší prehľad plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov predkladáme v prílohe č. 5, ktorá obsahuje zoznam ukazovateľov výstupu a ich percentuálne vyjadrenie, a to znázorňuje, že program napreduje, a je vysoký predpoklad splnenia všetkých merateľných ukazovateľov ku koncu programového obdobia.

Úloha sa plní priebežne.

Úloha č. 9 Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalostí“, „Vymáhanie nezrovnalostí“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripraví projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.

- Vzhľadom na schválenie nadkontrahovania finančných prostriedkov na ŽoNFP pre slovenských partnerov v rámci 8. hodnotiaceho kola je uvedená úloha už nerelevantná.

Úloha splnená.

Úloha č.10 Vypracovať a predložiť harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci programu za rok 2021, rozdelený po mesiacoch. T: do 30.4.2021.

- RO vypracoval a predkladá harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci programu za rok 2021 rozdelený po mesiacoch (Príloha č. 6).

Úloha splnená.

Úloha č.11 Vypracovať a predložiť plán vyhlasovania výziev na nezazmluvnené prostriedky v rámci programu. T: do 30.04.2021.

- Na programe Interreg SK-AT boli v decembri 2016 vyhlásené otvorené výzvy na celú alokáciu programu. Z uvedeného dôvodu sa plán vyhlasovania výziev na programe nevypracováva.

Úloha splnená.

Úloha č.12 Zabezpečiť skrátenie procesu výkonu prvostupňovej kontroly predložených výdavkov zo strany prijímateľov (first level control). T: priebežne.

- Výdavky sú priebežne predkladané na miesta prvostupňovej kontroly v SR a AT, kde sú verifikované. Až po schválení výdavkov zo strany prvostupňovej kontroly je možné predložiť ŽoP na úrovni projektu. Hoci je dvojstupňová kontrola časovo náročnejšia a čerpanie na úrovni programu narastá postupne, podľa predložených výdavkov od prijímateľov.
- RO pravidelne na kvartálnej báze vyzýva jednotlivé miesta prvostupňovej kontroly (4 miesta), aby proces verifikovania urýchlili a tým pokiaľ je možné skrátili lehoty na výkon kontroly. V súčasnom období so stavom k 31.5.2021 RO konštatuje, že lehoty na výkon prvostupňovej kontroly sú dodržiavané na troch miestach (SK - MIRRI, AT – Mesto Viedeň, Burgenland). Výkon prvostupňovej kontroly v Dolnom Rakúsku je nedostatočný a nespĺňa stanovené lehoty, a preto RO zaslal listom podpredsedníčky vlády požiadavku na zrýchlenie výkonu prvostupňovej kontroly. Kontrola ŽoP na úrovni STS sa vykonáva bezodkladne.
- Prvostupňová kontrola v SR (zriadená na MIRRI SR) je dlhodobo personálne poddimenzovaná, RO vyvíja všetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanými pracovnými silami.

Úloha sa plní priebežne.

C) Informácie o kritických problémoch implementácie programu

Program Interreg V-A SK-AT v prvých rokoch svojej implementácie čelil obrovským problémom, ktoré mali dopad na neskoršie začatie implementácie programu t.j. od roku 2017. Následne RO zastabilizoval štruktúry, nastavil spoločne s Národnými orgánmi/Regionálnymi miestami v AT systém riadenia a kontroly a zabezpečil štandardnú implementáciu programu, i keď mnohé problémy pretrvávajú dodnes.

Faktory, ktoré spôsobujú kritické problémy implementácie programu:

- Výrazne negatívny dopad COVID-19 na implementáciu projektov:
 - početné zmeny harmonogramov vedúce k početným predlžovaniam projektov;
 - zmeny v spôsobe realizovania aktivít - presun do online priestoru (v prípade aplikovateľnosti), modifikácie a posuny v organizovaní spoločných akcií;
 - výrazne nižšie výdavky predkladané v porovnaní s plánmi čerpania;



- pri nových projektoch je problematické predkladanie nevyhnutných povolení a potvrdení, čo výrazne spomaľuje proces zazmluvňovania.
- Vzhľadom na to, že na začiatku programového obdobia v roku 2015 RO nezabezpečil podklady a vstupy na vývoj ITMS2014+, monitorovací systém sa vyvíjal oveľa neskôr, v dôsledku čoho v ďalšej implementácii systém ITMS 2014+ v plnej miere nemohol zohľadniť potreby a špecifiká programov cezhraničnej spolupráce a je využívaný iba v obmedzenej miere, čo znamená zvýšenú administratívnu záťaž pre prijímateľov (duplicitné predkladanie dokumentácie), RO preto priebežne komunikuje s CKO/odbor ITMS, s prijímateľmi programu Interreg SK-CZ a používateľmi systému ITMS2014+ (verejná a neverejná časť) s cieľom uľahčiť a dostatočne vysvetliť prácu v ňom.
- Komplikovaný proces verejného obstarávania – opakované verejné obstarávania – nekompletnosť dokumentácie predkladanej zo strany prijímateľov, vysoká chybovosť, a s tým spojené predlžovanie realizácie projektov s výrazným dopadom na čerpanie programu (investičné projekty).
- Neobsadené personálne kapacity.

D) Prijaté opatrenia:

MIRRI SR od začiatku prechodu kompetencií z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktívne pristupuje k riešeniu problematiky implementácie INTERREG V-A SK-CZ a priebežne prijíma opatrenia s cieľom akcelerovať čerpanie programu:

- Aktívna komunikácia so prijímateľmi a partnermi projektov. Poskytovanie pomoci s evidovaním údajov v systéme ITMS2014+, osobitne vo vzťahu k rakúskym partnerom projektov.
- Zabezpečenie školení a/alebo konzultácií, či iných informačných seminárov pre prijímateľov; proaktívna komunikácia so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov minimalizovaním chýb na strane prijímateľa a zabezpečiť predkladanie žiadostí o platbu podľa dohodnutých harmonogramov.
- Vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID-19, pristúpenie na formu virtuálnych konzultácií, seminárov, zasadnutí Monitorovacieho výboru tak, aby proces implementácie pokračoval plynulo a bez vonkajších obmedzení.
- Priebežné a pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie stavu implementácie na týždennej úrovni a v prípade identifikácie konkrétnych problémov v projektoch ich operatívne riešenie v súčinnosti s prijímateľmi.
- Ukončenie schvaľovacieho procesu predložených ŽoNFP na poslednom zasadnutí monitorovacieho výboru v apríli 2021 a čo možno najskoršie zazmluvňovanie schválených projektov (závisí od preukázania podmienok poskytnutia príspevku žiadateľom). Kontrahovanie sa očakáva v 3. a 4. kvartáli 2021.
- Ukončenie schvaľovacieho procesu predložených ŽoNFP (na SMV v máji 2021) a následne čo najskoršie zazmluvňovanie schválených projektov (závisí od preukázania podmienok poskytnutia príspevku žiadateľom).
- RO pripravuje analýzu projektov z pohľadu rizikovosti, kde budú popísané lehoty jednotlivých procesov (verejné obstarávanie, ZDV a ŽoP).
- RO zanalyzoval stav kľúčových/strategických projektov, ktoré priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze, zároveň však pripravuje listom podpredsedníčky vlády SR požiadavku na rizikových prijímateľov o zrýchlenie implementácie projektov (Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj).
- RO pravidelne na kvartálnej báze vyzýva jednotlivé miesta prvostupňovej kontroly (4 miesta), aby proces verifikovania urýchlili a tým pokiaľ je možné skrátili lehoty na výkon kontroly.



- RO zaslal žiadosť na skrátenie procesu verifikácie výdavkov FLC AT listom podpredsedníčky vlády SR na zrýchlenie výkonu prvostupňovej kontroly v Dolnom Rakúsku. Druhostupňová kontrola na STS v Bratislave a vo Viedni vykonáva kontrolu ŽoP bezodkladne.
- RO vyvíja všetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanými pracovnými silami.

IV. Zoznam použitých skratiek

Skratka	Celý názov
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	certifikačný orgán
COV	celkové oprávnené výdavky
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FLC	Prvostupňová kontrola
Interreg SK-AT	Program spolupráce V-A SK-AT
Interreg SK-CZ	Program spolupráce V-A SK-CZ
ITMS 2014+	Informačný systém
MF SR	Ministerstvo financií SR
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
NFP	nenávratný finančný príspevok
OA	orgán auditu
PO	prioritná os
RO	riadiaci orgán
SR	Slovenská republika
ŠR	štátny rozpočet
TP	technická pomoc
VO	verejné obstarávanie
ZDV	Zoznam deklarovaných výdavkov
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	žiadosť o platbu

Prílohy:

Príloha č. 1_Interreg V-A SK-CZ štvrtročný plán čerpania strategických projektov_k 31.5.2021

Príloha č. 2_Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKCZ

Príloha č. 3_Plán vyhlasovania výziev SKCZ 2021

Príloha č. 4_Interreg V-A SK-AT štvrtročný plán čerpania strategických projektov_k 31.5.2021

Príloha č. 5_Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKAT

Príloha č. 6_Plán čerpania Interreg V-A SK-AT_31 05 2021

