

**INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE IMPLEMENTÁCIE
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
A OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE
V GESCII MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR**

Stav k 31. 08. 2021

Obsah

1	Úvod.....	3
2	Aktuálny stav implementácie OPII v gescii MŠVVAŠ SR k 31. 08. 2021	3
2.1	Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVAŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania	3
2.2	Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVAŠ SR.....	4
3	Pokrok v implementácii PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVAŠ SR za sledované obdobie	5
3.1	Vyhlásené výzvy/vyzvania	5
3.2	Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá.....	5
3.3	Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 9 a PO 10 OP II za sledované obdobie	5
3.4	Národné projekty – externé hodnotenie	6
3.5	Veľký projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and) – externé hodnotenie	8
4	Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia	9
5	Kritické problémy OPII v gescii MŠVVAŠ SR a návrhy na riešenie	11
6	Aktuálny stav implementácie OPLŽ v gescii MŠVVAŠ SR k 31. 08. 2021	12
6.1	Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 1 a PO 8 OPLŽ v gescii MŠVVAŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania.....	12
6.2	Stav kontrahovania a čerpania PO 1 a PO 8 OPLŽ v gescii MŠVVAŠ SR.....	13
7	Pokrok v implementácii PO 1 a PO 8 OPLŽ v gescii MŠVVAŠ SR za sledované obdobie.....	14
7.1	Vyhlásené výzvy/vyzvania	14
7.2	Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá.....	14
7.3	Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 a PO 8 OPLŽ za sledované obdobie	14
8	Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia	15
9	Kritické problémy OPLŽ v gescii MŠVVAŠ SR a návrhy na riešenie	16

1 Úvod

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) vypracovalo v zmysle úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 218/2021 informatívny materiál o aktuálnom stave implementácie operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) a operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj „PO 1 OPLZ“ a „PO 8 OPLZ“) v gescii MŠVVaŠ SR s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu „Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. 03. 2021“.

Cieľom tohto materiálu je najmä:

- informovať o aktuálnom stave implementácie OPII a OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR (prehľad alokovaných finančných prostriedkov vo vyhlásených výzvach, prehľad žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci jednotlivých prioritných osí (ďalej aj „PO“), stav kontrahovania a čerpania);
- informovať o pokroku v implementácii (vyhlásené/ukončené výzvy/vyzvania, pokrok v kontrahovaní v sledovanom období;
- vyhodnotiť plnenie úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia;
- informovať o kritických problémoch a návrhoch na ich riešenie.

Údaje boli spracované k 31. 08. 2021 a popisujú pokrok za obdobie jún – august 2021, t. j. od predloženia ostatného materiálu na rokovanie vlády SR v júni 2021 s údajmi k 31. máju 2021.

2 Aktuálny stav implementácie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 08. 2021

2.1 Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania

Prehľad výšky alokácie a sumy a počtu vyhlásených výziev a vyzvaní v rámci prioritných osí 9, 10 operačného programu Integrovaná infraštruktúra k **31. 08. 2021** obsahuje tabuľka č. 1, a to v členení podľa prioritných osí a typu výziev/vyzvaní (resp. počet výziev na dopytovo orientované projekty, vyzvaní na národné projekty).

Tabuľka č.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR


Prehľad výziev/vyzvaní k 31.08.2021				Počet výziev/vyzvaní*					
Prioritná os	Alokácia	Vyhlásené výzvy/vyzvania		Spolu	DOP	NP	FN	TP	VP
	EUR (EÚ Zdroj)	EUR (EÚ Zdroj)	% z alokácie						
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	494 820 162,31	105,92%	20	15	5	0	0	0
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	85 704 847	98 050 000,00	114,40%	5	4	0	0	0	1
SPOLU	552 874 051	592 870 162,31	107,23%	25	19	5	0	0	1

* - výzvy/vyzvania pre viaceré PO sú započítané 2 krát (zvlášť pre každú os)

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Počet výziev a suma vyhlásených výziev v PO 9 MŠVVaŠ a VA bola znížená o výzvu s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC). Prerušená bola implementácia zakontrahovaných projektov v rámci predmetnej výzvy a došlo k zaevidovaniu systémovej nezrovnalosti na programovej úrovni do ITMS2014+, ktorá nedovoľuje zrealizovať čerpanie prostriedkov z výzvy. Keďže na EK nebudú deklarované výdavky z tejto výzvy, boli údaje vo vykazovaní formálne upravené.

Graf č. 1 Prehľad voľných a alokovaných finančných prostriedkov PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 08. 2021

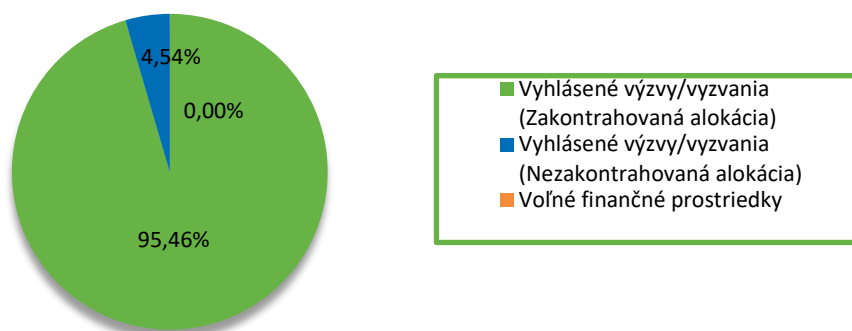

Podiel celkových voľných a alokovaných finančných prostriedkov v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR k **31. 08. 2021** znázorňuje graf č. 1, ktorý zohľadňuje, či sú alokované finančné prostriedky zakontrahované alebo zatiaľ nezakontrahované a premietnuté len do vyhlásených výziev/vyzvaní, t. j. v rámci ktorých aktuálne stále prebieha proces konania o ŽoNFP.

2.2 Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR

Tabuľka č. 2 Kontrahovanie a čerpanie PO 9, 10 OPII k 31. 08. 2021 (EÚ zdroj)

Prioritná os	Alokácia	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)		Čerpanie na úrovni CO	
	EUR	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	443 008 035	94,83%	127 095 988	27,21%
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	85 704 847	81 706 367	95,33%	10 045 012	11,72%
SPOLU	552 874 051	524 714 402	94,91%	137 141 001	24,81%

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Stav kontrahovania a čerpania PO 9, 10 OPII k **31. 08. 2021** obsahuje tabuľka č. 2 (len projekty v stave riadne ukončené a zmluva uzatvorená), ktorá poskytuje podrobný prehľad výšky a podielu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PO 9, 10 OPII v členení podľa prioritných osí. Číselné údaje v tabuľke sú za EÚ zdroj.

Suma kontrahovania v PO 9 (MŠVVaŠ a VA) bola znížená o sumu projektov zakontrahovaných v rámci výzvy s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).

Tabuľka č. 3 Kontrahovanie PO 9, 10 OPII v roku 2021 (EÚ zdroj)

OPII/ Prioritná os	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahova nie k 31.8.2021 (od zač. PO)	% kontrahova nia k 31.8.2021	MIRRI SR odporúča kontrahova nie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovani a od 1.1. 2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčan ého ročné ho plánu kontrahova nia	Zostáva nakontrahov ať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	443 008 035	94,83%	97 375 019	78 761 945	80,89%	18 613 074
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	85 704 847	81 706 619	95,33%	1 567 584	983 807	62,76%	583 777

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Tabuľka č. 4 Čerpanie PO 9, 10 OPII v roku 2021 (EÚ zdroj)

OPII/ Prioritná os	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.8.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.8.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	127 095 988	27,21%	103 867 534	27 739 751	26,71%	76 127 783
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	85 704 847	10 045 012	11,72%	27 690 625	3 341 083	12,07%	24 349 542

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

3 Pokrok v implementácii PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

3.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania

V mesiaci jún, júl, august 2021 nebola vyhlásená žiadna výzva.


3.2 Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá

V mesiaci jún, júl, august 2021 neboli ukončené hodnotiace kolá.

3.3 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 9 a PO 10 OP II za sledované obdobie

Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) znázorňuje graf č. 2 spolu s príslušajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Prírastok kontrahovania za príslušné mesiace je v tabuľke údajov vyjadrený v EUR a v percentách v pomere k alokácii jednotlivých prioritných osí OPII v gescii MŠVVaŠ SR.


Graf č. 2 Pokrok v kontrahovaní PO 9, 10 OPII v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

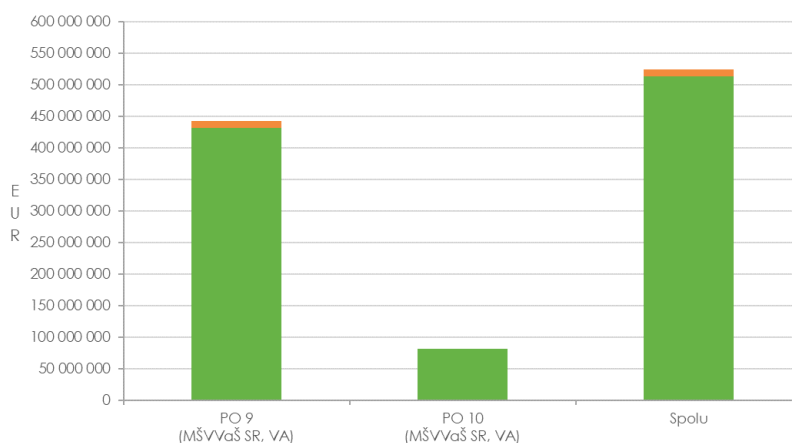

	PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	Spolu
Kontrahovanie k 31.05.2021 (EUR)	431 473 997	81 706 367	513 180 363
Prírastok kontrahovania za mesiace jún, júl a august 2021 (EUR)	11 534 039	0	11 534 039
Prírastok kontrahovania za mesiace jún, júl a august 2021 (% z alokácie)	2,47%	0,00%	0,59%

Pokrok v čerpaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) na úrovni certifikačného orgánu znázorňuje graf č. 3 spolu s prislúchajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Prírastok čerpania za príslušné mesiace je v tabuľke údajov vyjadrený v EUR a v percentách v pomere k alokácii jednotlivých prioritných osí OP II v gescii MŠVVaŠ SR.

Graf č. 3 Pokrok v čerpaní PO 9, 10 OP II v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

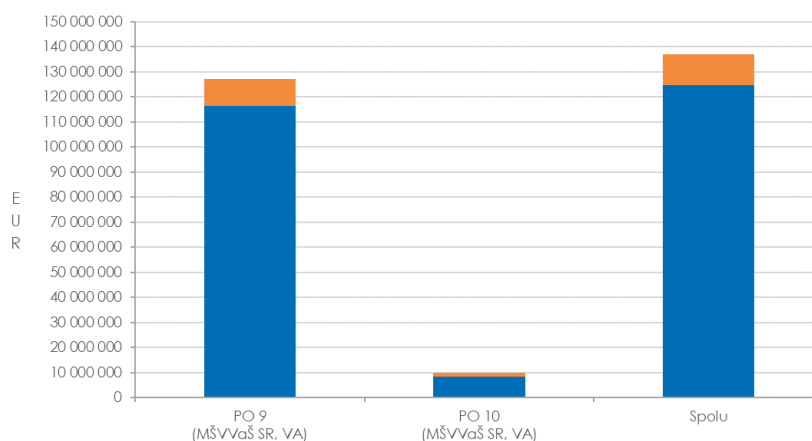

	PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	Spolu
Čerpanie k 31.05.2021 (EUR)	116 534 537	8 340 431	124 874 969
Prírastok čerpania za mesiace jún, júl a august 2021 (EUR)	10 561 451	1 704 581	12 266 032
Prírastok čerpania za mesiace jún, júl a august 2021 (% z alokácie)	2,26%	0,30%	0,63%

3.4 Národné projekty – externé hodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v programovom období 2014 – 2020 implementuje päť národných projektov, ktorých prijímateľom je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Vo vzťahu k zostávajúcemu času implementácie, t. z. do konca roka 2023, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo vykonať nezávislé externé hodnotenie národných projektov prostredníctvom spoločností Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o. Cieľom externého hodnotenia bolo vykonať analýzu realizovateľnosti projektov do konca roka 2023, možné riziká implementácie a prínos projektov pre SR.

1. Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV)

Najväčšia časť rozpočtu pripadá na aktivitu 2 (73 %), čo súvisí s modernizáciou a ďalším rozvojom existujúcej IKT infraštruktúry Dátového centra vedy a výskumu (DC VaV) s cieľom zabezpečenia dostatočných výpočtových, komunikačných a úložných kapacít.

Riziká

Medzi identifikované riziká s vysokou závažnosťou je možné zaradiť okrem verejného obstarávania počas implementácie, aj nedostatočná kvalita resp. stabilita systému z dôvodu morálneho zastarania, na ktorú práve tento projekt a jeho realizácia reagujú.

Prínos

Vybudovaním dátového centra a jeho sprístupneniu ako cloudovej služby formou SaaS (Software as a Service) získali všetky zapojené inštitúcie prístup k centralizovanej a výkonnej výpočtovej kapacite a dostatočnému úložnému priestoru pre zálohu svojich dát. Táto aktivita plní ciele OP Integrovaná

infraštruktúra nie len v technickom zaostávaní VaV obce, ale vytvorila aj nový priestor na výskum v oblasti cloudových aplikácií a poskytla výpočtové kapacity na vysokovýkonné počítanie.

2. Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV)

Primárnou úlohou projektu je zabezpečenie kontinuity prístupu k svetovému vedeckému obsahu od renomovaných vydavateľov pre organizácie výskumu a vývoja na Slovensku.

Riziká

Medzi identifikované riziká s vysokou závažnosťou je možné zaradiť okrem verejného obstarávania najmä počet vedeckých pracovníkov publikujúcich formou otvoreného prístupu.

Prínos

Projekt NISPEZ IV pokračuje v centralizovanom obstarávaní prístupov do vedeckých databáz pre potreby vedeckých a výskumných inštitúcií aplikovanom aj v predchádzajúcich projektoch NISPEZ implementovaných v predchádzajúcom programovom období. Primárnym prínosom má byť pri väčšom obstarávaní lepšia cena a centrálna sprístupnenie všetkých zdrojov pre všetky zapojené inštitúcie VaV. Kým predchádzajúce projekty NISPEZ slúžili predovšetkým na sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov, projekt NISPEZ IV sa zameriava aj na rozvoj informačných systémov.

Potenciál projektov DC VaV a NISPEZ IV v programovom období 2021 – 2027

Je nevyhnutné v nasledujúcom programovom období pokračovať v realizácii projektov s obdobným zameraním, nakoľko zabezpečujú primárny kontakt slovenskej vedy so zahraničím.

Priority pre nové obdobie:

- využiteľnosť výsledkov výskumu a vývoja v praxi;
- zlepšenie vzťahu medzi vedou a spoločnosťou;
- účasť slovenských výskumných inštitúcií v Európskom výskumnom priestore by vzhľadom na celkový počet výskumníkov, štruktúru a množstvo výskumných inštitúcií mali byť horizontálnou prioritou Slovenska aj v rámci programového obdobia 2021-2027, avšak za prijatia opatrení, a to definovanie oblasti ako horizontálnej priority v rámci novej RIS3 SK a v rámci Operačného programu Slovensko.

3. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II (NITT SK II)

Primárnou úlohou projektu je budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR, ako aj profesionálnych personálnych kapacít, ktoré s touto aktivitou súvisia.

Riziká

Akruálne nízke čerpania rozpočtu, je spôsobené oneskorenou realizáciou verejných obstarávaní, čo zvyšuje riziko neplnenia cieľového stavu kľúčových merateľných ukazovateľov, čo ohrozuje celkovú úspešnosť projektu NITT SK II.

Medzi ďalšie identifikované riziká s vysokou závažnosťou je možné zaradiť najmä legislatívne prekážky pre realizáciu transferu technológií – zakladanie spin-off spoločností, prevod práv duševného vlastníctva, výhradné licencovanie, zákazkový výskum s prevodom práv a tiež nedostatočný záujem vedecko-výskumných pracovníkov akademických inštitúcií o zakladanie spin-off spoločností.

Prínos

Prínosy projektu sú priebežne dosahované prostredníctvom činnosti Národného centra pre transfer technológií (NCTT SR), resp. prostredníctvom činnosti centier transferu technológií pracujúcich v rámci vedecko-výskumných inštitúcií združených v NCTT SR, najmä Centrum transferu technológií CVTI SR a ich základné hodnotenie v absolútnom vyjadrení je nespochybniteľne pozitívne.

Za najväčšie pozitíva projektu sú považované nasledovné skutočnosti:

- z kvantitatívneho hľadiska generovanie istého počtu patentových prihlášok (40 patentových prihlášok, 46 medzinárodných patentových prihlášok PCT a 6 Európskych patentových prihlášok) a všetkých ostatných prihlášok na ochranu duševného vlastníctva výskumných inštitúcií,
- z kvalitatívneho hľadiska budovanie kultúry ochrany duševného vlastníctva a potencionálnej možnosti komercializácie výsledkov výskumu a vývoja v rámci kľúčových výskumných inštitúcií na Slovensku – Slovenskej akadémie vied a výskumne orientovaných univerzít/nositelov infraštruktúr univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.

Potenciál projektu v programovom období 2021 - 2027

Problematika ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie by mala byť horizontálnou prioritou Slovenska aj v rámci programového obdobia 2021 - 2027. Pokračovanie projektu je vhodné a potrebné

aj v nasledujúcom programovom období, so zmenenou vnímania cieľov a definovaním želaných prínosov.

4. Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (PopVaT II)

Primárnou úlohou projektu je vybudovanie Centier vedy a ich materiálno-technické zabezpečenie – vrátane exponátov, s cieľom priblížiť vedu širokej verejnosti a vzbudiť u mladej generácie záujem o štúdium v týchto oblastiach.

Riziká

Implementácia projektu je aktuálne v investičnej fáze a má meškanie. Vzhľadom na silný investičný rozmer tohto projektu je pre úspešnú implementáciu projektu kľúčové urýchlené zrealizovanie verejných obstarávaní a zrealizovanie prác na troch nových centrách vedy. Medzi identifikované riziko s vysokou závažnosťou je možné zaradiť najmä verejné obstarávanie, ako aj zvýšenie cien tovarov a služieb (najmä v stavebníctve).

Prínos

Vzhľadom na stav implementácie projektu PopVaT II ostala situácia oproti roku 2015 nezmenená. Avšak vybudovanie Centier na popularizáciu vedy by malo výrazným spôsobom akcelerovať aktivity z oblasti popularizácie, propagácie a komunikácie vedy vo vzťahu k širokej verejnosti.

Potenciál projektu v programovom období 2021 - 2027

Slovenská republika v rámci členských štátov EÚ zaostáva v problematike popularizácie výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom centier vedy veľmi výrazne, preto je jednoznačne potrebné, aby infraštruktúry dlh v tejto oblasti bol vyriešený úspešnou implementáciou jednak projektu POPVAT / POPVAT II, ako aj následnými aktivitami v programovom období 2021 - 2027.

5. Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore (SK4ERA)

Primárnou úlohou projektu je podpora SR a výskumných pracovníkov v etablovaní skúseností zo zahraničia.

Riziká

V aktuálnom období implementácie projektu neboli identifikované riziká, ktoré by mohli mať zásadnejší vplyv na dosiahnutie cieľov projektu a naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov projektu.

Prínos

Prínosom projektu je existujúca ľudská infraštruktúra v tejto oblasti – jednak Národná kancelária pre program Horizont 2020 a Štyčná kancelária v Bruseli – SLORD. Takýto typ infraštruktúry Slovensko pre účely zvýšenej miery internacionalizácie aktivít výskumných inštitúcií potrebuje.

Prínosom sú tiež informačné aktivity CVTI SR a účasť na žiadaných/úspešných účastiach programu v ERA (Európsky výskumný priestor).

Potenciál projektu v programovom období 2021 - 2027

Problematika ochrany zvyšovania účasti SR v ERA, a najmä v programe Horizontu Európa, by mala byť horizontálnou prioritou Slovenska aj v rámci programového obdobia 2021 - 2027.

Nevyhnutnou podmienkou na zlepšenie situácie v tejto oblasti bude bezodkladné zazmluvnenie nového projektu v novom programovom období, aby sa predišlo zníženiu potenciálu pozitívnych prínosov tohto projektu.

3.5 Veľký projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and) – externé hodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v programovom období 2014 – 2020 implementuje jeden veľký projekt, ktorého prijímateľom je Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a partnerom Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Vo vzťahu k zostávajúcemu času implementácie t. z. do konca roka 2023, MŠVVaŠ SR sa rozhodlo vykonať nezávislé externé hodnotenie veľkého projektu prostredníctvom spoločností Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o. Cieľom externého hodnotenia bolo vykonať analýzu realizovateľnosti do konca roka 2023, možné riziká implementácie a prínos pre SR, vedeckú obec a študentov.

Stav implementácie

Pri väčšine aktivít je možné konštatovať, že prijímateľ aj partner sú schopní zabezpečiť realizáciu dodávok a teda implementáciu aktivít v súlade so zmluvou o NFP do plánovaného ukončenia projektu 12/2023. Vzhľadom na investičný charakter aktivít, na väčšinu aktuálne prebieha verejné obstarávanie, resp. je v príprave vo vzťahu k Univerzite Komenského.

Finančná implementácia

Úroveň čerpania výdavkov projektu nie je uspokojivá. Uvedená skutočnosť odráža najmä stav zrealizovaných verejných obstarávaní a následne aj stav dodávok stavebných prác a tovarov v rámci jednotlivých aktivít projektu. Aktuálne je schopnosť realizátorov vyčerpať schválený rozpočet projektu výrazne závislá od ich schopnosti úspešne a včas zrealizovať verejné obstarávania.

Riziká

Rizikom sú aktivity, u ktorých verejné obstarávanie nebolo začaté, resp. bolo zrušené, čím vzniká riziko posunu dodávok prác a tovarov a tým môže ovplyvniť schopnosť realizátorov ukončiť projekt v rámci oprávneného obdobia v súlade so zmluvou o NFP. Ďalším rizikom je aktuálna situácia na trhu najmä v súvislosti s COVID19, a to zvýšenie cien tovarov a služieb (najmä v stavebníctve a IKT) ako aj predlžovanie dodacích lehôt tovarov a služieb z dôvodu nedostatku.

Pomerne závažným rizikom je realizácia aktivít, ktorých implementácie nadväzuje na úspešné ukončenie inej aktivity. Nenaplnenie plánovaných hodnôt špecifických ukazovateľov môže zakladať dôvod na sankcie, ako aj na odstúpenie od zmluvy vzhľadom na vyhodnotenie realizácie aktivity ako neúspešné.

Prínos

Cieľom projektu ACCORD, od ktorého sa odvíja aj potenciálny prínos projektu, je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Projekt má tri strategické ciele:

- posilniť konkurencieschopnosť STU a UK v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM, získavať nových študentov zo Slovenska i zo zahraničia a udržať si tých najtalentovanejších študentov, ako budúcich výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov;
- zvýšiť účasť oboch univerzít na spoločnom výskume prostredníctvom modernizácie existujúcej výskumnej infraštruktúry a cieleného marketingu existujúcich a nových kapacít smerom k potenciálnym výskumným partnerom;
- posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvorí viac príležitostí na efektívny transfer výsledkov vedy a výskumu, najmä v oblasti biotechnológií/biomedicíny, progresívnych materiálov, informačných a komunikačných technológií.

Na Slovensku ide o prvý projekt svojho druhu, ktorý v sebe integruje investície do oblasti infraštruktúry, ktorá má slúžiť na vzdelávacie, výskumné a inovačné aktivity. Potenciálny prínos projektu sa očakáva nielen pre samotné univerzity, ale pre región, ako aj Slovensko ako celok. Vzhľadom na rozsah a charakter projektu efekt intervencie bude viditeľný až po roku 2023, resp. až po ukončení realizácie investícií do infraštruktúry – čo v prípade projektu je dátum 31. 12. 2023.

Potenciál v programovom období 2021 – 2027

Vzhľadom k tomu, že ide o investíciu národného významu do infraštruktúry dvoch najväčších verejných vysokých škôl na Slovensku, pokračovanie obdobných aktivít projektu by sa malo realizovať opätovne. Primárne ďalšími investíciami celonárodného významu s ďalšími univerzitami na Slovensku.

4 Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia

ÚLOHY / ODPOČTY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 9, PO 10, PO 13) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO.
T: do 30.11.2021
Plní sa. Úroveň čerpania je **31 820 082,92 EUR** z objemu 132 348 483 EUR.

2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie.
T: do 31.12.2021
Splnené. Úroveň kontrahovania je **95,46 %**.
3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach
T: 31.12.2021
Plní sa. Úroveň viazanej alokácie vo **výzvach je 97,45 %**.
4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.
T: v závislosti od termínu MF SR
Plní sa.
5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov.
T: do 31.05.2021
Splnené. Údaje v aktuálnom zozname strategických projektov za MŠVVAŠ SR sú aktualizované.
6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.
T: štvrťročne
Plní sa. 2-krát mesačne sa realizujú bilaterálne stretnutia s RO, CKO a CO, kde sa diskutuje o aktuálnom stave implementácie OP.
7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.
T: 30.09.2021
V procese. MŠVVAŠ SR analyzuje možné riziká implementácie.
8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.
T: 30.09.2021
Plní sa. Revíziou OP II, verzia 13 budú ukazovatele upravené tak, aby reflektovali na aktuálny stav implementácie OP v gescii MŠVVAŠ SR.
9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.
T: 30.09.2021
V procese. MŠVVAŠ SR plánuje vyhlásenie zásobníkovej výzvy zameranej výhradne na personálne výdavky výskumných aktivít, ktorej projekty by sa po neplánovanom uvoľnení alokácie dostali do implementácie s vysokým potenciálom riadneho ukončenia do konca programového obdobia.
Plánovanie fázovania projektov v súčasnom stave nie je možné z dôvodu neexistencie legislatívy pre nové programové obdobie. Zároveň by prijímatelia pri uvedenej možnosti znížili pokrok pri realizácii zazmluvnených projektov s negatívnym dopadom na úroveň čerpania v aktuálnom programovom období.
10. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR.
T: priebežne
Plní sa. MŠVVAŠ SR umožnilo vo výzve využívanie predfinancovania resp. zálohových platieb pre všetky subjekty za účelom urýchlenia dostupnosti finančných prostriedkov na samotnú realizáciu výskumných aktivít. Zároveň intenzívne komunikuje s prijímateľmi s cieľom zrýchlenia a zefektívnenia implementácie projektov.

11. Zabezpečiť čerpanie veľkého projektu ACCORD na úrovni 22,9 mil. EUR, v zmysle plánu čerpania SO.
T: 30.11.2021
Plní sa. MŠVVaŠ SR poskytuje maximálnu možnú podporu v oblasti verejného obstarávania, ktoré má najväčší vplyv na dosiahnutie stanovenej úrovne čerpania v roku 2021.

5 Kritické problémy OPII v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie

Kritickým problémom OPII v gescii MŠVVaŠ SR sú verejné obstarávania. Takmer každý projekt má minimálne dve verejné obstarávania v nadlimitnej zákazke, čo spôsobuje, že objem čerpaných prostriedkov nastupuje neskôr.

Ďalším problémom je zdražovanie stavebných materiálov a prác z dôvodu prerušenia výroby počas pandémie koronavírusu celosvetovo na niekoľko mesiacov a po opätovnom spustení je na trhu nedostatok materiálov. To má za následok predražovanie zákazok, zvýšenie nákladov pre verejných obstarávateľov, keďže súčasné financovanie je drahšie v porovnaní s priebežným čerpaním financií.

Návrh na riešenie: MŠVVaŠ SR ako SO OPII pristúpilo k zintenzívneniu komunikácie s prijímateľmi. V prípade národných projektov a veľkého projektu ACCORD sa realizujú bilaterálne pracovné stretnutia na pravidelnej báze, kde sa prioritne rieši zefektívnenie čerpania a riešenie rôznych situácií so zámerom predchádzania, resp. eliminácii rizík pri implementácii a naplňaní cieľov a merateľných ukazovateľov. Komunikácia s CKO, EK s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus valorizácie cien v rámci zmluvných podmienok.

6 Aktuálny stav implementácie OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 08. 2021

6.1 Prehľad alokovaných finančných prostriedkov PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR - vyhlásené výzvy/vyzvania

Prehľad výšky alokácie a sumy a počtu vyhlásených výziev a vyzvaní v rámci PO 1 a PO 8 operačného programu Ľudské zdroje v gescii MŠVVaŠ SR k **31. 08. 2021** obsahuje tabuľka č. 5, a to v členení podľa typu výziev/vyzvaní.

Tabuľka č. 5 Vyhlásené výzvy/vyzvania PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR


Prehľad výziev/vyzvaní k 31. 08. 2021				Počet výziev/vyzvaní		
Prioritná os	Alokácia	Vyhlásené výzvy/vyzvania		Spolu	DOP	NP
	EUR (EÚ Zdroj)	EUR (EÚ Zdroj)	% z alokácie			
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	418 181 410,54	119,91 %	21	9	12
PO 8 (MŠVVaŠ SR, SO)	20 770 000	26 269 196,89	126,47 %	2	0	2
SPOLU	369 511 004	444 450 607,43	120,28 %	23	9	14

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Dňa 2. júla 2021 nadobudol účinnosť dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 1 operačného programu Ľudské zdroje, na základe ktorého sa MŠVVaŠ SR stalo aj sprostredkovateľským orgánom pre časť PO 8 REACT- EÚ s alokáciou 20 770 000 EUR¹ (EÚ zdroje).

Výzvy a vyzvania boli vyhlásené vo vyššej alokácii ako je alokácia PO 1 a PO 8 OPLZ, pričom z PO 8 boli vyhlásené obe plánované vyzvania. Bližšie informácie ku kontrahovaniu finančných prostriedkov z vyhlásených výziev a vyzvaní sú uvedené v ďalších častiach materiálu.

Graf č. 4 Prehľad voľných a kontrahovaných finančných prostriedkov PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 08. 2021

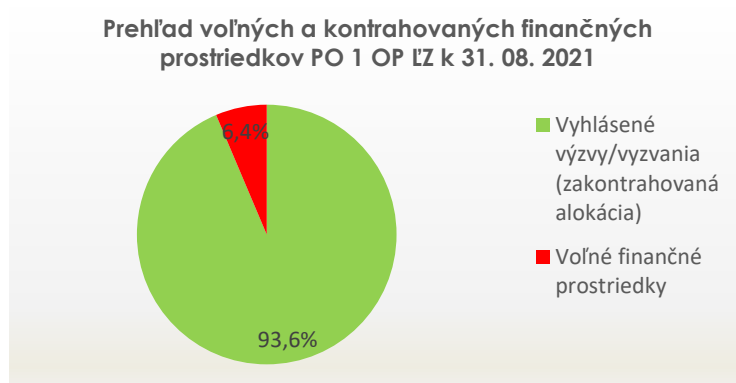

Graf č. 4 znázorňuje podiel celkových voľných a alokovaných finančných prostriedkov v rámci PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR k 31. 08. 2021, t. j. zakontrahované prostriedky v objeme **326 506 182 EUR**, čo tvorí **93,6 %** z objemu alokácie PO 1 OPLZ. Výška kontrahovania predstavuje kontrahovanie očistené o nevyčerpané prostriedky z riadne ukončených projektov. 6,4% alokácie PO 1 OPLZ, t. j. 22 234 822 EUR, predstavujú prostriedky, z už vyhlásených výziev a vyzvaní, ktoré však ešte nie sú kontrahované ako aj predpokladané nedočerpanie projektov v realizácii.

MŠVVaŠ SR na základe priebežnej analýzy odhaduje pri jednotlivých výzvach a národných projektoch nedočerpanie zohľadňujúc skúsenosti z implementácie, charakter projektov či ich dĺžku realizácie.

¹ Alokácia bude navýšená v rámci ďalšej revízie OPLZ.

Zohľadňujúc priebežnú analýzu, ako aj aktuálny a plánovaný stav kontrahovania a čerpania predpokladáme k 31.8.2021 úspory v objeme **13,8 mil. EUR** (EÚ zdroj).

6.2 Stav kontrahovania a čerpania PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR

Tabuľka č. 6 Kontrahovanie a čerpanie PO 1 a PO 8 OPLZ k 31. 08. 2021 (EÚ zdroj)

Prioritná os	Alokácia	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)		Čerpanie na úrovni CO	
	EUR	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	326 506 182	93,6 %	136 674 530	39 %
PO 8 (MŠVVaŠ SR, SO)	20 770 000	0,00	0,00 %	0,00	0 %
SPOLU	369 511 004	326 506 182	93,6 %	136 674 530	39 %

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Stav kontrahovania a čerpania PO 1 a PO 8 OPLZ k **31. 08. 2021** obsahuje tabuľka č. 6, ktorá zahŕňa projekty v stavoch riadne ukončené, zmluva uzavretá, zmluva uzavretá – pozastavenie realizácie projektu a poskytuje podrobný prehľad výšky a podielu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PO 1 a PO 8 OPLZ.

Tabuľka č. 7 Kontrahovanie PO 1 a PO 8 OPLZ k 31. 08. 2021 (EÚ zdroj)

OPLZ/PO 1 a 8/ SO MŠVVaŠ SR	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.8.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.8.2021	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	326 506 182	93,6 %	20 693 045	661 817	3,2 %	20 031 228
PO 8 (MŠVVaŠ SR, SO)	20 770 000	0,00	0,00 %	20 770 000	0,00	0 %	20 770 000
SPOLU	369 511 004	326 506 182	93,6 %	41 463 045	661 817	3,2 %	40 801 228

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Tabuľka č. 8 Čerpanie PO 1 OPLZ k 31. 08. 2021 (EÚ zdroj)

OPLZ/PO 1/ SO MŠVVaŠ SR	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.8.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.8.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PO 1 (MŠVVaŠ SR, SO)	348 741 004	136 674 530	39,2 %	105 017 832	41 990 583	40 %	63 027 249
PO 8 (MŠVVaŠ SR, SO)	20 770 000	0,00	0,00 %	10 500 000	0,00	0 %	10 500 000
SPOLU	369 511 004	136 674 530	39,2 %	115 517 832	41 990 583	40 %	73 527 249

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

7 Pokrok v implementácii PO 1 a PO 8 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR za sledované obdobie

7.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania

V mesiacoch jún až august 2021 boli vyhlásené 3 vyzvania pre NP. V rámci PO 1 bolo 16. 07. 2021 vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania" v alokácii 16 159 023,912 EUR. ŽoNFP zatiaľ nebola predložená, kontrahovanie projektu sa predpokladá v 4. kvartáli 2021. V rámci PO 8 bolo 02. 07. 2021 vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji " v alokácii 6 269 196,89 EUR. V auguste bolo vydané Rozhodnutie o schválení v alokácii 5 606 949,42 mil. EUR (EÚ zdroj), kontrahovanie sa predpokladá do konca 3. kvartálu. Dňa 16. 07. 2021 bolo vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania" v alokácii 20 mil. EUR. ŽoNFP zatiaľ nebola predložená, kontrahovanie projektu sa predpokladá v 4. kvartáli 2021.


7.2 Ukončené výzvy/Hodnotiace kolá

V sledovanom období prebiehalo prijímanie ŽoNFP z 3. hodnotiaceho kola výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" vyhlásenej dňa 31. 05. 2021 v alokácii 7 mil. EUR. Uzávierka 3. hodnotiaceho kola je 30. 09. 2021. V súčasnosti prebieha proces konania o žiadosti 18 ŽoNFP z 1. a 2. hodnotiaceho v žiadanej výške 3 234 540 EUR (zdroje EÚ).

7.3 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 a PO 8 OPLZ za sledované obdobie

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov v EUR (EÚ zdroj) na úrovni certifikačného orgánu znázorňuje graf č. 5 spolu s prislúchajúcou tabuľkou údajov, ktorá súčasne slúži ako legenda grafu. Údaje sú uvedené v pomere k alokácii PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR.

Graf č. 5 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní PO 1 OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR obdobie jún - august 2021

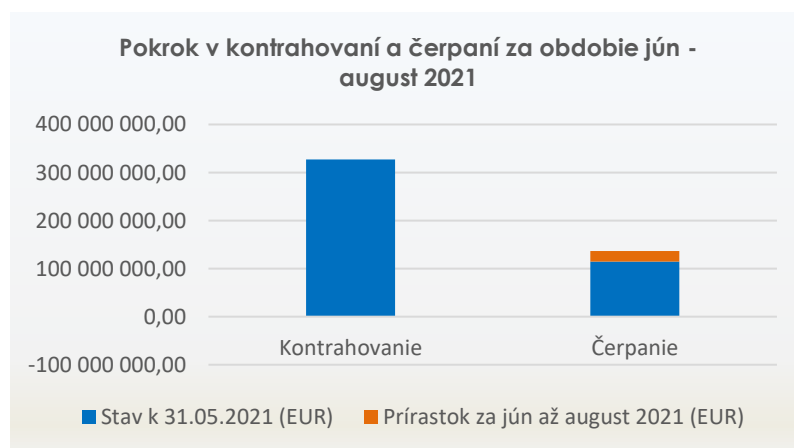

	Kontrahovanie	Čerpanie
Stav k 31.5.2021 (EUR)	326 990 901	114 983 199
Prírastok/pokles za jún až august 2021 (EUR)	-484 719	21 691 331
Prírastok za jún až august 2021 (% z alokácie)	0,00	6,22

Zdroj: ITMS2014+, pravidelné dátové reporty CKO

Pokles v kontrahovaní PO 1 za obdobie jún - august 2021 je spôsobený nedočerpaním riadne ukončených projektov v plnej výške. Mimo sledovaného obdobia, v septembri, sa však na základe zapojenia väčšieho počtu škôl do projektu **zvýšilo kontrahovanie** národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ o 5 353 661,89 EUR, čím sa kontrahovanie PO 1 zvýšilo **na 331 859 843,89 EUR (t. j. 95,2 % z alokácie PO 1)**. Zároveň sa v 4. kvartáli predpokladá kontrahovanie národného projektu „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v alokácii 16,1 mil. EUR, čím sa kontrahovanie PO 1 ďalej zvýši na 348 mil. EUR (t. j. 99,8 % z alokácie PO 1).

Čerpanie

V mesiaci jún 2021 boli na Certifikačný orgán predložené 2 súhrnné žiadosti o platbu, v celkovej výške 8 533 348,77 € (zdroje EÚ), čo predstavuje za celé obdobie implementácie PO 1 najvyššiu sumu z doposiaľ predložených ŠŽP.

8 Vyhodnotenie plnenia úloh pridelených v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31. 03. 2021 a prijaté opatrenia

ÚLOHY / ODPOČTY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 1 OPLZ) NA ROK 2021	
1.	Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme minimálne 105 mil. EUR. T: 30. 11. 2021 Plní sa. Čerpanie od 01. 01. 2021 do 31. 08. 2021 je v objeme 41 990 583 EUR (zdroje EÚ), čo predstavuje 44,01%.
2.	Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31. 12. 2021. Plní sa. MŠVVaŠ v rámci PO 1 OP IŽ vyhlásilo dňa 31. 05. 2021 výzvu OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“ v alokácii 7 mil. EUR (zdroje EÚ). Dňa 16. 07. 2021 bolo vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v alokácii 16 159 023,912 EUR. V rámci PO 8 bolo 02. 07. 2021 vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ v alokácii 6 269 196,89 EUR a 16. 07. 2021 bolo vyhlásené vyzvanie pre NP s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ v alokácii 20 mil. EUR.
3.	Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR. Plní sa.
4.	Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31. 05. 2021 Splnené. Plán čerpania strategických projektov (NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II) bol zaslaný emailom na CKO dňa 7. mája 2021.
5.	Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne. Plní sa. Čerpanie strategického projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ je k 31. 08. 2021 v objeme 11 167 845 EUR, z toho čerpanie za január až august 2021 dosahuje výšku 6 299 385 EUR, čo predstavuje 87 % z plánovanej sumy čerpania k 31. 08. 2021 (7 234 997 EUR, EÚ zdroje). Čerpanie strategického projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ je k 31. 08. 2021 v objeme 10 166 287 EUR, čo zároveň predstavuje čerpanie za obdobie január až august 2021, t. j. 90,4 % z plánovanej sumy čerpania k 31. 08. 2021 (11 241 475 EUR, EÚ zdroje). Riziko nedočerpania finančných prostriedkov z dôvodu neobsadenia pracovných pozícií asistentov

učiteľa, pedagogických asistentov a členov inkluzívneho tímu v jednotlivých školách a školských zariadeniach riešime v spolupráci s prijímateľom národných projektov.

6. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.
T: 30. 09. 2021.

Plní sa. Riziká/problémy sú bližšie opísané nižšie v kapitole 9 tohto materiálu.

7. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.
T: 30. 09. 2021

Plní sa. K 31. 08. 2021 všetkých 7 fyzických ukazovateľov výkonnostného rámca PO 1 OP LZ dosahuje nadpriemerné plnenie hodnôt voči Zámeru pre rok 2023. Plnenie finančných ukazovateľov výkonnostného rámca PO 1 OP LZ je voči Zámeru pre rok 2023 na úrovni 21,3 % za MRR a 30,5 % za VRR.

8. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.
T: 30. 09. 2021

Plní sa.

9. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR.
T: priebežne

Plní sa. Projekty sa realizujú v súlade s harmonogramom realizácie aktivít.

9 Kritické problémy OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR a návrhy na riešenie

1. Kritickým problémom OPLZ v gescii MŠVVaŠ SR je výška čerpania. Hlavnou príčinou nízkeho čerpania je predovšetkým vysoký počet dopytovo – orientovaných projektov a s tým spojené veľké množstvo predkladaných ŽoP v nízkom, opakujúcom sa objeme. Ide predovšetkým o ŽoP z DOP, v ktorých ide vo veľkej miere predovšetkým o preplácanie mzdových výdavkov, ktoré sú viazané na mesačné mzdy a nedostatočný počet administratívnych kapacít na spracovanie ŽoP a tým spôsobená nízka miera čerpania.

Návrhy na riešenie:

Zjednodušenie procesov administrácie počas implementácie projektov - SO neustále analyzuje možnosti a spôsoby vedúce k urýchleniu čerpania PO 1. V súčasnosti prebieha komunikácia s CKO a CO ohľadom hľadania možnosti uplatnenia zmien v postupoch administratívnej finančnej kontroly, kde SO čerpá aj zo skúseností z Českej republiky, kde sú postupy AFK jednoduchšie a menej byrokratické.

Výzva pre prijímateľov národných projektov s požiadavkou na akceleráciu čerpania finančných prostriedkov - Mailom GR SŠF EU MŠVVaŠ SR zo dňa 25. 02. 2021 boli všetci prijímatelia národných projektov informovaní o potrebe maximalizácie úsilia v predkladaní finančných prostriedkov prostredníctvom žiadostí o platbu a urýchleniu všetkých procesov súvisiacich s obstarávaním tovarov a služieb. V tejto súvislosti sú prijímatelia povinní zasielať každomesačné odhady očakávaných výdavkov, ktoré sú predmetom posúdenia SO. Zároveň MŠVVaŠ SR ako SO OPLZ pristúpilo k zintenzívneniu komunikácie s prijímateľmi. V prípade národných projektov sa realizujú bilaterálne pracovné stretnutia na pravidelnej báze, kde sa prioritne rieši zefektívnenie čerpania a riešenie rôznych situácií so zámerom predchádzania, resp. eliminácii rizík pri implementácii a napĺňaní cieľov a merateľných ukazovateľov, ako aj možnosti zníženia administratívnej záťaže.

Posilnenie administratívnych kapacít implementačnej zložky sekcie štrukturálnych fondov EU MŠVVaŠ SR - V aktuálnom období dochádza k zvýšeniu počtu projektových manažérov vykonávajúcich kontrolu žiadostí o platbu a kontrolu VO, a to prostredníctvom obsadzovania voľných pracovných miest, vnútornou reorganizáciou sekcie a zamestnávaním externých pracovníkov. Uvedené opatrenie má pozitívny efekt na dĺžku spracovania predkladaných žiadostí o platbu.

Využívanie foriem zjednodušeného vykazovania výdavkov v rámci implementácie projektov z výziev/vyzvaní roka 2019 a 2020 (vstupujúce do financovania v rokoch 2020 – 2023) - Implementácia projektov, v rámci ktorých dochádza k uplatňovaniu výdavkov prostredníctvom zjednodušeného vykazovania výdavkov, čo výrazným spôsobom zjednodušuje a zrýchľuje proces spracovávanía žiadostí o platbu.

Uplatňovanie udelenej výnimky CKO zo SR EŠIF na po 2014 – 2020, verzia 9 v znení: „SO OP LZ je oprávnený počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nevykonávať finančnú kontrolu na mieste počas realizácie aktivít projektov OPLZ. Zároveň je SO OPLZ povinný vykonať všetky dotknuté finančné kontroly na mieste projektov OPLZ po odvolaní mimoriadnej situácie.“ - SO v súčasnosti nevykonáva finančnú kontrolu na mieste, ktorá by vzhľadom na vysoký počet implementovaných projektov výrazným spôsobom zasiahla do činností administratívnych kapacít SO. Do budúcnosti je snahou SO vykonávať finančnú kontrolu na mieste iba na vzorke projektov, čím by sa výrazným spôsobom znížila administratívna záťaž implementačnej zložky SO. Predmetné SO plánuje komunikovať a diskutovať s CKO.

2. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nákazy vírusu COVID-19 dochádza k pozastaveniu realizácie aktivít projektov a predlžovaniu harmonogramu ich realizácie. Uvedené môže mať negatívny dopad na výšku čerpania finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie.

Návrh na riešenie: Predlžovanie realizácie projektov nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z výzvy na predkladanie ŽoNFP.

3. V rámci zákaziek s nízkou hodnotou SO eviduje veľké množstvo nespracovaných VO, ktoré boli na SO predložené osobitne alebo v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu.

Návrh na riešenie: Navyšovanie administratívnych kapacít prostredníctvom interných aj externých pracovníkov.
