



Informácia o stave implementácie programov  
cezhraničnej spolupráce s vyhodnotením úloh  
a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu  
Implementácia európskych štrukturálnych a  
investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021 vrátane  
informácií o kritických problémoch programov  
cezhraničnej spolupráce k 31.10.2021

## Obsah

<b>I.</b>	<b>Úvod</b> .....	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Stav implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK- CZ k 31.10.2021</b> .....	<b>4</b>
	A) Stav kontrahovania a čerpania.....	4
	B) Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31.3.2021..	6
	C) Informácie o kritických problémoch implementácie programu .....	10
	D) Prijaté opatrenia:.....	11
<b>III.</b>	<b>Stav implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT k 31.10.2021</b> .....	<b>12</b>
	A) Stav kontrahovania a čerpania.....	12
	B) Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31.3.2021.	14
	C) Informácie o kritických problémoch implementácie programu .....	17
	D) Prijaté opatrenia:.....	18
<b>IV.</b>	<b>Zoznam použitých skratiek</b> .....	<b>19</b>

## I. Úvod

MIRRI SR predkladá na základe úlohy B.2. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 Informáciu o stave implementácie programov cezhraničnej spolupráce s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021 vrátane informácií o kritických problémoch programov cezhraničnej spolupráce k 31.10.2021.

Cieľom materiálu je poskytnúť vláde SR informáciu o stave implementácie programov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, prehľad v kontrahovaní a čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s vyhodnotením úloh a opatrení k 31.10.2021, vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31.3.2021 vrátane pokroku oproti stavu implementácie zo strany RO od 31.3.2021.

Materiál popisuje stav kontrahovania a čerpania programov cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ a Interreg SK-AT k 31.10.2021, pričom popisuje progres v implementácii aj v porovnaní so stavom k 31.3.2020.

Zároveň materiál popisuje kritické problémy programov cezhraničnej spolupráce Interreg, ktoré súvisia s pomalším čerpaním alokácie programov, čiastočne nedostatočným výkonom prijímateľov, a taktiež s negatívnym dopadom pandémie Covid-19.

RO v závere materiálu popisuje prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie a zlepšenie stavu výkonu programov cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ a Interreg SK-AT.

## II. Stav implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK- CZ k 31.10.2021

RO: MIRRI SR

### A) Stav kontrahovania a čerpania

K 31.10.2021 je stav kontrahovania programu v sume 83 937 011 EUR (EÚ zdroj), čo predstavuje 93,14 % podiel z celkovej alokácie programu. V porovnaní so stavom k 31.3.2020 ide o nárast o 12,8 % alokácie programu. Plnenie odporúčaného plánu kontrahovania k 31.12.2021 je na úrovni 61,14%.


**Tabuľka č. 1 Kontrahovanie k 31.10.2021:**

Názov PCS v gescii rezortu	Alokácia 2014-2020 (EÚ zdroj) v EUR	Kontrahova nie k 31.10.202 1 (EÚ zdroj) v EUR	% kontrahov anie k 31.10. 2021	Plán kontrahovania na r. 2021 v EUR v zmysle záväzného plánu programu (EÚ zdroj)	Kontrahovanie v roku 2021 od 01.01.2021 do 31.10.2021 v EUR (EÚ zdroj)	% plnenia plánu kontrahovan ia k 31.12.2021	Zostáva nakontrahovať z plánu kontrahovania do 31.12.2021 v EUR (EÚ zdroj)
Interreg SK-CZ	90 139 463	83 937 011	93,12	26 900 247	16 446 455	61,14%	10 453 792

Zdroj: ITMS2014+

Kontrahovanie k 31.10.2021 v porovnaní so stavom k 31.3.2021 vzrástlo o 11,5 mil. EUR. Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov k 31.10.2021 znázorňuje graf č. 1 a pokrok od roku 2014 - programového obdobia je uvedený v tabuľke č. 2 ročne, kumulatívne a v percentách v pomere k alokácii programu. Program Interreg SK-CZ bol schválený zo strany EK v júni 2015, kontrahovanie prvých finančných prostriedkov z programu začalo od roku 2018.

**Graf č. 1 Pokrok v kontrahovaní k 31.10.2021:**

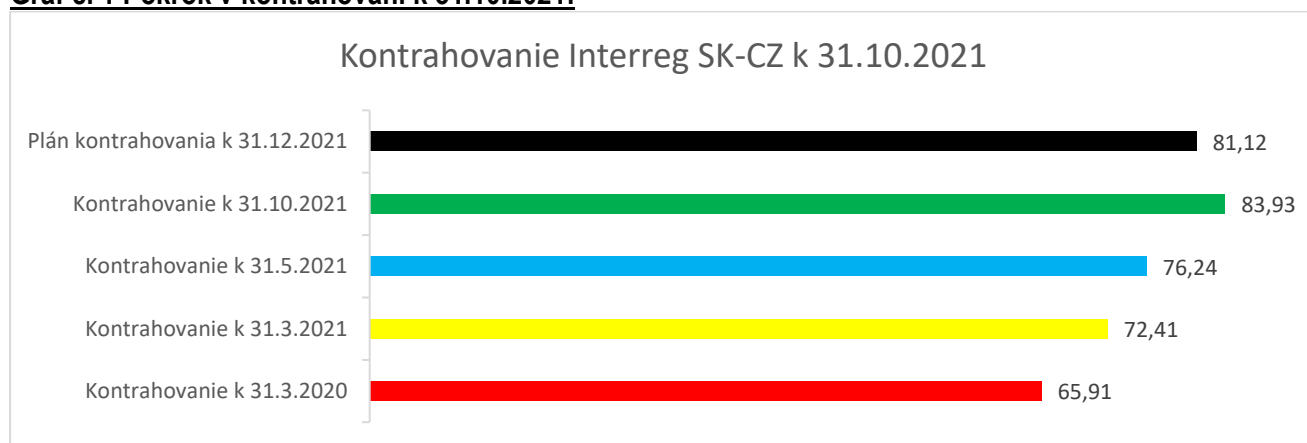

Zdroj: ITMS2014+

v mil. EUR(EÚ zdroj)

**Tabuľka č. 2 Pokrok v kontrahovaní k 31.10.2021 od roku 2014 – programového obdobia:**

Interreg V-A SK-CZ	Kontrahovanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Kontrahovanie kumulatívne za zdroj EÚ (EUR)	kumulatívne % v porovnaní s alokáciou
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	46 335 058,00	46 335 058,00	51,40
2019	20 116 860,00	66 451 918,00	73,72
2020 (do 3/2020)	-538 387,00 *	65 913 531,00	73,12
2020 (od 4/2020)	1 577 025,00	67 490 556,00	74,87
2021 (do 05/2021)	8 753 345,00	76 243 901,00	84,58
2021 (do 08/2021)	14 838 428	82 328 984	91,34
2021 (do 10/2021)	16 446 455	83 937 011	93,12

Zdroj: ITMS2014+

\*rozdiel zapríčinený zostatkom z ukončených projektov

K 31.10.2021 je stav čerpania programu na úrovni 43,92 % a v porovnaní so stavom k 31.3.2021 ide o nárast o 8,93 % alokácie programu. Pre naplnenie pravidla N+3 pre tento rok 2021 už je potrebné do 31.12.2021 deklarovať na EK sumu vo výške 0,00 EUR.

### Tabuľka č. 3 Čerpanie k 31.10.2021:

Názov PCS v gescii rezortu	Alokácia 2014-2020 v EUR (EÚ zdroj)	Čerpanie k 31.10.2021 v EUR (EÚ zdroj)	% čerpanie k 31.10.2021	Plán čerpania na r. 2021 v EUR v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 (EÚ zdroj)	Čerpanie v roku 2021 od 01.01.2021 do 31.10.2021 v EUR (EÚ zdroj)	% plnenia odporúčan ého ročn ého plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z odporúčaného ročného plánu do 31.12.2021 v EUR (EÚ zdroj)
Interreg SK-CZ	90 139 463	39 589 022,43	43,92	18 000 000	12 562 041,71	69,79	5 437 958,29


Zdroj: CO(MF SR)

Čerpanie v roku 2021 je vo výške 12 562 041,71EUR, plnenie odporúčaného plánu čerpania na rok 2021 predstavuje 69,79%.

Čerpanie programu za celé programové obdobie je k 31.10.2021 vo výške 39 589 022,43 EUR.

Pokrok v čerpaní finančných prostriedkov k 31.10.2021 znázorňuje graf č. 2 a pokrok od roku 2014 - programového obdobia je uvedený v tabuľke č. 4 ročne, kumulatívne a v percentách v pomere k alokácii programu.

### Graf č. 2 Čerpanie Interreg SK-CZ v roku 2021:

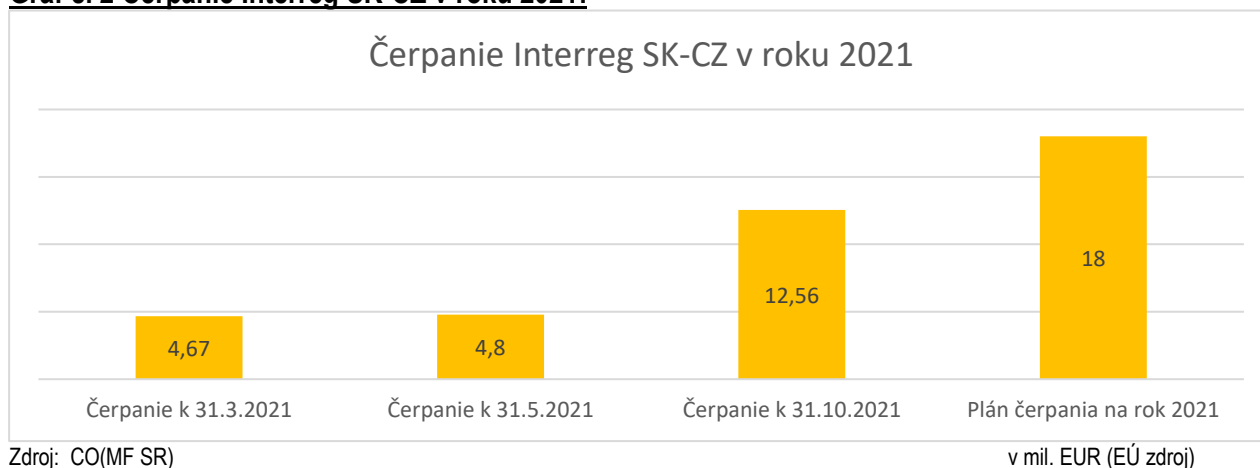

Zdroj: CO(MF SR)

**Tabuľka č. 4 Pokrok v čerpaní k 31.10.2021 od roku 2014 – programového obdobia:**

Interreg V-A SK-CZ	Čerpanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	čerpanie kumulatívne za zdroj EÚ (EUR)	kumulatívne % v porovnaní s alokáciou
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	2 248 802,02	2 248 802,02	2,49
2019	9 015 229,02	11 264 031,04	12,50
2020 (do 3/2020)	-2 142,36	11 261 888,68	12,49
2020 (od 4/2020)	15 765 092,04	27 026 980,72	29,98
2021 (do 05/2021)	4 902 919,26	31 929 899,98	35,42
2021 (do 08/2021)	11 196 794,8000	38 223 775,80	42,40
2021 (do 10/2021)	12 562 041,71	39 589 022,43	43,92

Zdroj: CO(MF SR)

\*rozdiel zapríčinený nezrovnalosťou

**B) Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31.3.2021.**

**Úloha č. 1 Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 18 000 000 EUR (EU zdroj).  
T: do 30.11.2021.**

RO za účelom zabezpečenia čerpania v zmysle uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 v objeme 18 000 000 EUR na rok 2021 vykonáva nasledovné:

- Priebežne monitoruje a vyhodnocuje stav implementácie programu a kľúčových projektov na týždennej báze.
  - Kontinuálne zabezpečuje školenia a informačné semináre pre prijímateľov; proaktívne komunikuje so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov minimalizovaním chýb na strane prijímateľa a zabezpečením predkladania ŽoP podľa dohodnutých harmonogramov.
  - Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19, pristúpil na formu virtuálnych konzultácií, seminárov, zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru tak, aby proces implementácie pokračoval plynulo a bez vonkajších obmedzení. RO aktívne komunikuje s prijímateľmi s cieľom efektívnej pomoci pri predkladaní a kompletizácii dokumentácie.
  - RO úspešne zazmluvnil žiadosti o NFP schválené v rámci výzvy č. Interreg V-A SK - CZ/2019/11 čo má pozitívny dopad na napĺňanie stanovených cieľov programu.
  - RO skracuje lehoty na výkon kontroly VO, predkladania ZDV a ŽoP.
  - RO zanalyzoval stav kľúčových/strategických projektov, ktoré priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze.
  - Z odporúčaného ročného plánu čerpania do 31.12.2021 zostáva vyčerpať sumu v objeme 5 437 958,29 EUR.
  - Finančný záväzok (pravidlo N+3) bol k 31. augustu 2021 splnený.
- Úloha sa plní priebežne.


**Úloha č. 2 Zabezpečiť kontrahovanie celého programu a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.**



- Priebežne prebieha zazmluvňovanie projektov schválených v rámci výzvy č. Interreg V-A SK-CZ/2019/10 a Interreg V-A SK-CZ/2020/12. Žiadosti o NFP schválené v rámci výzvy č. Interreg V-A SK-CZ/2019/11 boli úspešne zazmluvnené.
- Kontrahovanie k 31.10.2021 oproti stavu k 31.3.2021 vzrástlo o 11,5 mil. EUR. K 31.10.2021 je stav kontrahovania programu v sume 83 937 011 EUR. Plnenie úlohy zabezpečiť kontrahovanie programu do 31.12.2021 vo výške minimálne 90% alokácie (81,1 mil. EUR) (EÚ zdroj) je na úrovni 103,46%.
- Dňa 15.10.2021 bola v rámci PO 2 Kvalita životného prostredia uzavretá výzva na predkladanie ŽoNFP č. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 zameraná na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v alokácii vo výške 1 890 000 EUR (EÚ zdroj). Bolo predložených 26 žiadostí o NFP v hodnote 12 189 379,12 eur (za zdroj EFRR). Aktuálne prebieha overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku.

Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov k 31.10.2021 znázorňuje graf č. 3. Za obdobie od 1.3.2021 do 31.10.2021 bol zaznamenaný najvyšší progres v kontrahovaní v rámci PO 2 – Kvalita životného prostredia. Celkovo sa v roku 2021, a teda od 01.01.2021 do 31.10.2021 nakontrahovalo 16 463 691,69 EUR.

**Graf č. 3 Pokrok v kontrahovaní k 31.10.2021:**

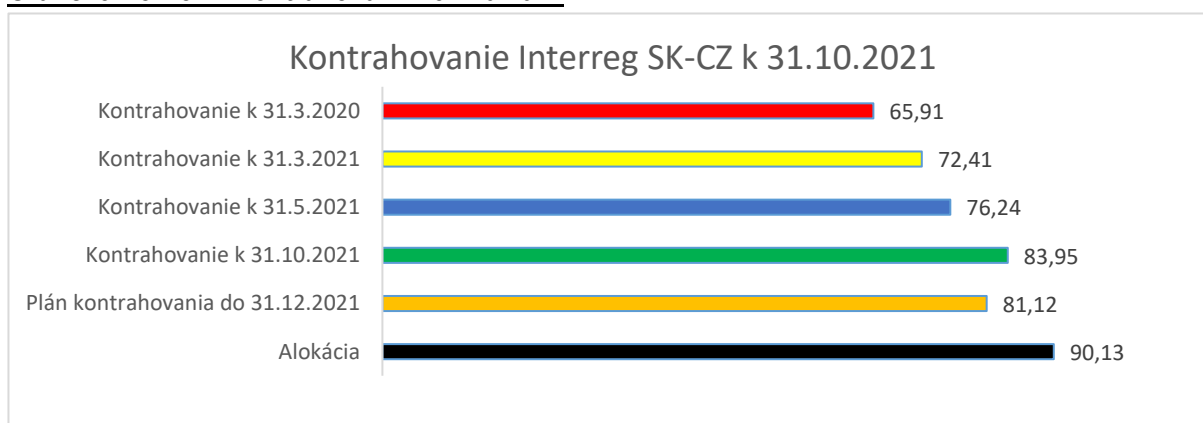

Zdroj: ITMS2014+

v mil. EUR (EÚ zdroj)

Úloha je splnená.

**Úloha č. 3 Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.**

- K 15.10.2021 bola v rámci PO 2 - Kvalita životného prostredia uzavretá výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 zameraná na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Alokácia na výzvu bola vo výške 1 890 000 EUR (EÚ zdroj). Bolo predložených 26 žiadostí o NFP v hodnote 12,18 mil. eur za zdroj EFRR. Súčasťou výzvy bolo aj vytvorenie zásobníka projektov a v prípade dispozície ďalších voľných finančných prostriedkov programu bude možné po schválení zo strany Spoločného monitorovacieho výboru podporiť a zazmluvniť projekty zo zásobníka tak, aby bola nakontrahovaná 100% alokácia programu. V súčasnosti prebieha overovanie splnenia ostatných podmienok poskytnutia príspevku predložených žiadostí o NFP.

Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 4 Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.**



- Predloženie výdavkov na CO so 100% financovaním bolo pre program Interreg V-A SK-CZ v maximálne možnej miere využité do 31.3.2021. RO realizoval kontrolu a schválenie ŽoP s cieľom v čo najvyššej možnej miere využiť 100% kofinancovanie zo strany EK v 7. účtovnom roku. V 7. účtovnom roku boli predložené výdavky vo výške 22 159 910,03 EUR.
- Od 01.01.2021 do 31.3.2021 boli v súhrnných ŽoP deklarované výdavky v sume 4 670 000 EUR.

Úloha bola splnená.

**Úloha č. 5 Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.**

- RO doplnil štvrťročný plán čerpania kľúčových/strategických projektov, ktorý zároveň predkladá v prílohe č. 1 Interreg V-A SK-CZ štvrťročný plán čerpania strategických projektov k 31.10.2021. Projekty pravidelne monitoruje a vyhodnocuje potenciálne riziká v priebehu implementácie vrátane zohľadnenia ich pokroku s cieľom zabezpečiť čerpanie alokácie programu v dostatočnej výške. Čerpanie kľúčových/strategických projektov v počte 11 je k 31.10.2021 vo výške 11 390 113,26 EUR. Plán čerpania k 31.12.2021 je stanovený na 13 979 752,05 EUR.

Úloha bola splnená

**Úloha č. 6 Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.**

- RO implementáciu programu vrátane kľúčových/strategických projektov priebežne monitoruje a vyhodnocuje na mesačnej báze. V prípade potreby pripraví a predloží návrh Spoločnému monitorovaciemu výboru na presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty v rámci inej PO alebo špecifického cieľa s potenciálom ich využitia. Posledná realokácia programu sa uskutočnila v júni 2020. V prílohe č. 1 Interreg V-A SK-CZ štvrťročný plán čerpania strategických projektov k 31.10.2021 RO predkladá štvrťročný plán čerpania strategických projektov k 31.10.2021.
- Čerpanie kľúčových/strategických projektov v počte 11 je k 31.10.2021 vo výške 11 390 113,26 EUR. Plán čerpania k 31.12.2021 je stanovený na 13 979 752,05 EUR.

Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 7 Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, najmä v rámci kritickej prioritnej osi 1, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.**

- RO implementáciu programu priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze. V prípade potreby pripraví návrh vnútornej realokácie programu, t. j. presun finančných prostriedkov v rámci iných PO/ŠC programu. V júni 2020 pristúpil RO k realokácii finančných prostriedkov programu v rámci jeho prioritných osí. V súlade s čl. 8 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 1299/2013 z 17 decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a čl. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) využil možnosť presunu voľných finančných prostriedkov medzi prioritnými osami formou notifikácie na EK na zabezpečenie financovania všetkých projektov zaradených do zásobníka projektov. Vďaka tejto notifikácii bolo možné dodatočne schváliť 2 projektové žiadosti zaradené do zásobníka projektov z výzvy č. Interreg V-A SK - CZ/2019/11 (ŠC 1.2) a 5 projektových žiadostí zaradených do zásobníka projektov z výzvy č. Interreg V-A SK-





CZ/2019/10 (ŠC 2.1). Týchto 7 ŽoNFP bolo v celkovej výške 6 958 417,52 EUR za EÚ zdroj. V máji 2021 bolo na Spoločnom monitorovacom výbore v rámci PO 1, špecifický cieľ 1.1. zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce schválených 12 ŽoNFP, v celkovej sume 2 8590 665 EUR, pričom aktuálne prebieha ich kontrahovanie. RO na základe interných analýz vyhodnotil, že v aktuálnom stave implementácie programu sa nateraz nejaví potreba revízie programu, keďže vo výzve č. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 bolo predložené dostatočné množstvo žiadostí o NFP, a teda predpokladáme, že bude využitý aj zásobník projektov. RO preto zaktualizoval Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní na rok 2021 (ďalej „HVVV“), v rámci ktorého bola odstránená plánovaná výzva č. Interreg V-A SK-CZ/2021/14. HVVV bola v tomto znení predložená na posúdenie členom SMV v rámci 38. písomnej procedúry, a následne bol predložený na schválenie Pracovnej komisii pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory Únie a SR.

Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 8 Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.**

- RO priebežne analyzuje a vyhodnocuje stavy plnenia merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023.
- Vzhľadom na aktuálne dosiahnutý stav ukazovateľov, RO neidentifikoval nateraz potrebu revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov. Cieľové hodnoty ukazovateľov sa vyhodnocujú pri schvaľovaní záverečných súhrnných monitorovacích správ jednotlivých projektov, v súlade s nastavenými internými postupmi RO. O spôsobe vyhodnocovania merateľných ukazovateľov bola informovaná aj EK.
- Detailnejší prehľad plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov RO predkladá v prílohe č. 2 Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKCZ, ktorý obsahuje zoznam ukazovateľov výstupu a ich percentuálne vyjadrenie, a to znázorňuje, že program napreduje, a je vysoký predpoklad splnenia všetkých merateľných ukazovateľov ku koncu programového obdobia.

Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 9 Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalostí“, „Vymáhanie nezrovnalostí“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.**

- RO má v zásobníku projektov 8 ŽoNFP v celkovej sume 1 680 092,55 EUR ( EÚ zdroj).
- So zásobníkom projektov sa počíta aj pri výzve na predkladanie žiadostí o NFP č. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v alokácii vo výške 1 890 000 EUR (EÚ zdroj). Výzva bola uzavretá 15.10.2021, bolo predložených 26 žiadostí o NFP v hodnote 12,18 mil. eur za zdroj EFRR.

Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 10 Vypracovať a predložiť plán vyhlasovania výziev na nezazmluvnené prostriedky v rámci programu. T: do 30.04.2021.**

- Harmonogram vyhlasovania výziev na rok 2021 bol vypracovaný a schválený na úrovni Spoločného monitorovacieho výboru 29.9.2020 písomnou procedúrou, v súlade so Systémom riadenia EŠIF. Harmonogram vyhlasovania výziev tvorí prílohu č. 3 Plán vyhlasovania výziev SKCZ 2021 a je zverejnený na webovej stránke programu: <https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/harmonogram-vyziev>.



- RO na základe interných analýz vyhodnotil, že aktuálne nezazmluvnené prostriedky evidujeme v rámci PO č. 4 Technická pomoc. Zároveň bolo v rámci výzvy č. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 predložené dostatočné množstvo žiadostí o NFP, a teda predpokladáme, že bude využitý aj zásobník projektov. RO preto zaktualizoval Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní na rok 2021, v rámci ktorého bola odstránená plánovaná výzva č. Interreg V-A SK-CZ/2021/14 a bolo pridané plánované vyhlásenie Vyzvania č. 3 na projekty Technickej pomoci. HVVV bol v tomto znení predložený na posúdenie členom SMV v rámci 38. písomnej procedúry, a následne bol predložený na schválenie Pracovnej komisii pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory Únie a SR. RO predpokladá schválenie aktualizovaného HVVV v priebehu mesiaca november 2021, preto k 31.10.2021 ostáva stav nezmenený.

Úloha bola splnená/plní sa priebežne v súlade s potrebami programu.

**Úloha č. 11 Zabezpečiť skrátenie procesu výkonu prvostupňovej kontroly predložených výdavkov zo strany prijímateľov (first level control). T: priebežne.**

- Výdavky sú priebežne predkladané na miesta prvostupňovej kontroly v SR a CZ, kde sú verifikované. Po schválení výdavkov zo strany prvostupňovej kontroly sú priebežne predkladané ŽoP na úrovni projektu. Hoci je dvojestupňová kontrola časovo náročnejšia, čerpanie na úrovni programu postupne narastá v primeranom tempe.
- RO pravidelne komunikuje na štvrťročnej báze s jednotlivými miestami prvostupňovej kontroly (4 miesta), a v prípade potreby apeluje na zrýchlenie procesu prvostupňovej kontroly výdavkov a tým skrátenie lehoty verifikovania výdavkov. V súčasnom období so stavom k 31.10.2021 RO konštatuje, že lehoty na výkon prvostupňovej kontroly sú dodržiavané s výnimkou prípadov ak to z objektívnych príčin nie je možné (napr. šetrenia tretích strán).

Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 12 Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany EK, bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby deklarovania kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku (100 % spolufinancovanie). T: bezodkladne po schválení EK.**

- V rámci projektu 304021C933 - Na bicykli po stopách histórie, RO zabezpečuje uplatnenie finančnej opravy vo výške 10% kartelových výdavkov v ďalších 2 ŽoP. Dňa 26.10.2021 bola zaevidovaná správa o zistenej nezrovnalosti so stavom "bez finančného dopadu". Oprávnené výdavky budú v priebehu novembra predložené PJ na preplatenie.

Úloha sa plní priebežne.

**C) Informácie o kritických problémoch implementácie programu**

Program Interreg V-A SK-CZ v prvých rokoch svojej implementácie čelil obrovským problémom, ktoré mali dopad na neskoršie začatie implementácie programu t.j. od roku 2017. Následne RO zastabilizoval štruktúry, nastavil spoločne s Národným orgánom v CZ systém riadenia a kontroly a zabezpečil štandardnú implementáciu programu, i keď mnohé problémy pretrvávajú dodnes.

Faktory, ktoré spôsobujú kritické problémy implementácie programu:

- Výrazne negatívny dopad COVID-19 na implementáciu projektov:
  - početné zmeny harmonogramov vedúce k početným predlžovaniam projektov;
  - zmeny v spôsobe realizovania aktivít - presun do online priestoru (v prípade aplikovateľnosti), modifikácie a posuny v organizovaní spoločných akcií;
  - výrazne nižšie výdavky predkladané v porovnaní s plánmi čerpania;



- problémy nových projektov predkladať nevyhnutné povolenia a potvrdenia, čo výrazne spomalilo proces zazmluvňovania (predovšetkým v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP č. Interreg V-A SK-CZ/2019/10).
- 7 projektov pozastavilo realizáciu (v súčasnosti už avizované pokračovanie v implementácii);
- Vzhľadom na to, že na začiatku programového obdobia v roku 2015 RO nezabezpečil podklady a vstupy na vývoj ITMS2014+, monitorovací systém sa vyvíjal oveľa neskôr, v dôsledku čoho v ďalšej implementácii systém ITMS 2014+ v plnej miere nemohol zohľadniť potreby a špecifiká programov cezhraničnej spolupráce a je využívaný iba v obmedzenej miere, čo znamená zvýšenú administratívnu záťaž pre prijímateľov (duplicitné predkladanie dokumentácie), RO preto priebežne komunikuje s CKO/odbor ITMS, s prijímateľmi programu Interreg SK-CZ a používateľmi systému ITMS2014+ (verejná a neverejná časť) s cieľom uľahčiť a dostatočne vysvetliť prácu v ňom.
- Komplikovaný proces VO – opakované VO – nekompletnosť dokumentácie predkladanej zo strany prijímateľov, vysoká chybovosť, a s tým spojené predlžovanie realizácie projektov s výrazným dopadom na čerpanie programu (investičné projekty).
- Nedostatok administratívnych kapacít.

#### **D) Prijaté opatrenia:**

MIRRI SR aktívne pristupuje k riešeniu problematiky implementácie Interreg V-A SK-CZ a priebežne prijíma opatrenia s cieľom akcelerovať čerpanie programu:

- Aktívna komunikácia so žiadateľmi a partnermi projektov. Poskytovanie pomoci s evidovaním údajov v systéme ITMS2014+.
- Zabezpečenie školení a/alebo konzultácií, či iných informačných seminárov pre prijímateľov; proaktívna komunikácia so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov minimalizovaním chýb na strane prijímateľa a zabezpečiť predkladanie ŽoP podľa dohodnutých harmonogramov.
- Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19, pristúpenie na formu virtuálnych konzultácií, seminárov, zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru tak, aby proces implementácie pokračoval plynulo a bez vonkajších obmedzení.
- Priebežné a pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie stavu implementácie na týždennej úrovni, a v prípade identifikácie konkrétnych problémov v projektoch, ich operatívne riešenie v súčinnosti s prijímateľmi.
- Ukončenie schvaľovacieho procesu predložených ŽoNFP (na SMV v máji 2021) a následne čo najskoršie zazmluvňovanie schválených projektov (závisí od preukázania podmienok poskytnutia príspevku žiadateľom).
- RO vyvíja všetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanými pracovnými silami (pravidelné vyhlasovanie výberových konaní).

### **III. Stav implementácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT k 31.10.2021**

RO: MIRRI SR

#### **A) Stav kontrahovania a čerpania**

K 31.10.2021 je stav kontrahovania programu v sume 64 894 887,72 EUR (EÚ zdroj), ktorý predstavuje 85,509 % podiel z celkovej alokácie programu (tabuľka č. 5), čo v porovnaní so stavom k 31.3.2021 predstavuje nárast o 6,29 % alokácie programu.


**Tabuľka č. 5 Kontrahovanie k 31.10.2021**

Názov PCS v gescii rezortu	Alokácia 2014-2020 v EUR (EÚ zdroj)	Kontrahovanie k 31.10.2021 (EÚ zdroj) v EUR	% kontrahovania k 31.10.2021	Plán kontrahovania na r. 2021 v EUR v zmysle záväzného plánu čerpania (EÚ zdroj) v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
Interreg SK-AT	75 892 681	64 894 887,72	85,51	22 351 487	10 754 714,20	48,12%	11 596 764

Zdroj: ITMS2014+, CO(MF SR)

Kontrahovanie k 31.10.2021 v porovnaní so stavom k 31.3.2021 vzrástlo o 4,082 mil. EUR. Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov k 31.10.2021 znázorňuje graf č. 4 a pokrok od roku 2014-začiatku programového obdobia je uvedený v tabuľke č. 6 ročne, kumulatívne a v percentách v pomere k alokácii programu. Program Interreg SK-AT bol schválený zo strany EK v júni 2015, kontrahovanie finančných prostriedkov z programu začalo od roku 2018.

**Graf č. 4 Kontrahovanie Interreg SK-AT k 31.10.2021**

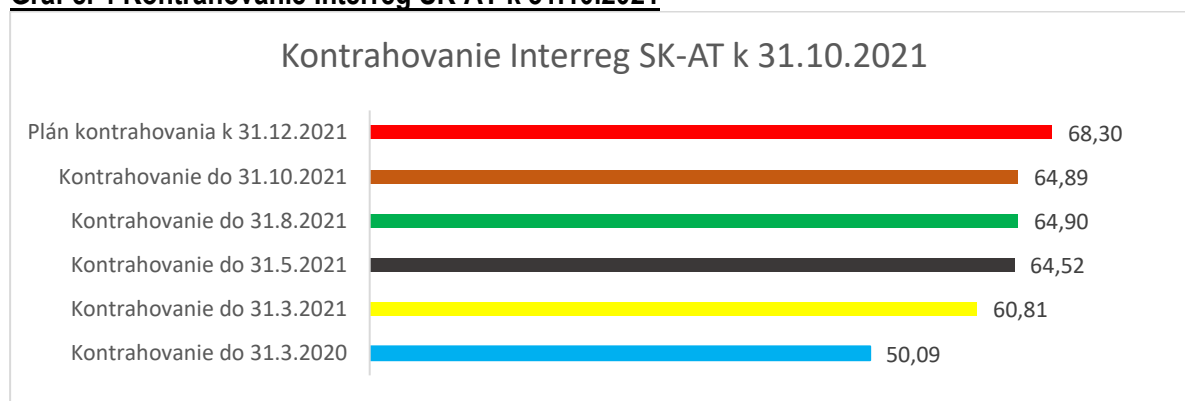

Zdroj: ITMS2014+

v mil. EUR

**Tabuľka č. 6 Pokrok v kontrahovaní k 31.10.2021 od roku 2014 – programového obdobia:**

Rok	Kontrahovanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne kontrahovanie za zdroj EÚ (EUR)	kumulatívne % v porovnaní s alokáciou
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

2018	36 611 958,45	36 611 958,45	48,24
2019	12 889 001,87	49 500 960,32	65,22
2020 (do 3/2020)	592 372,68	50 093 333,00	66,01
2020 (od 4/2020)	4 046 840,52	54 140 173,52	71,34
2021 (do 5/2021)	10 389 282,40	64 529 455,92	85,03
2021 (do 8/2021)	10 756 811,57	64 896 985,57	85,51
2021 (do 10/2021)	10 754 714,20	64 894 887,72	85,51

Zdroj: ITMS2014+

V rámci Interreg V-A SK-AT bol pokles kontrahovania v septembri 2021 spôsobený úpravou rozpočtov implementovaného projektu na základe uzatvoreného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP a zároveň menej podstatnou zmenou rozpočtu v rámci iného projektu, ktorá nemá zásadný vplyv na realizáciu projektu a nebola potrebná zmena zmluvy o poskytnutí NFP formou dodatku.

K 31.10.2021 je stav čerpania programu na úrovni 30,26 % a v porovnaní so stavom k 31.3.2021 ide o nárast o 27,18 % alokácie programu (tabuľka č. 7). Pre naplnenie pravidla N+3 pre rok 2021 je potrebné do 31.12.2021 deklarovať na EK sumu vo výške 5 764 665,70 EUR.

#### Tabuľka č. 7 Čerpanie k 31.10.2021


Názov PCS gescii rezortu	Alokácia 2014-2020 v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO) v EUR	% čerpania k 31.10. 2021	Plán čerpania na r. 2021 v EUR v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 (EÚ zdroj)	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z odporúčaného ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
Interreg SK-AT	75 892 681	22 967 018,28	30,26	17 000 000	5 150 603,86	30,30	11 849 396,14

Zdroj: CO(MF SR)

K 31.10.2021 boli v roku 2021 na úrovni CO schválené ŽoP po zohľadnení nezrovnalostí započítaných na CO vo výške 5 150 603,86 EUR, plnenie odporúčaného plánu čerpania na rok 2021 predstavuje 30,30%. Čerpanie programu za celé programové obdobie je k 31.10.2021 vo výške 22 967 018,28 EUR.

Pokrok v čerpaní finančných prostriedkov k 31.10.2021 znázorňuje graf č. 5 a pokrok od roku 2014 - programového obdobia je uvedený v tabuľke č. 8 ročne, kumulatívne a v percentách v pomere k alokácii programu.

#### Graf č. 5 Čerpanie Interreg SK-AT v roku 2021

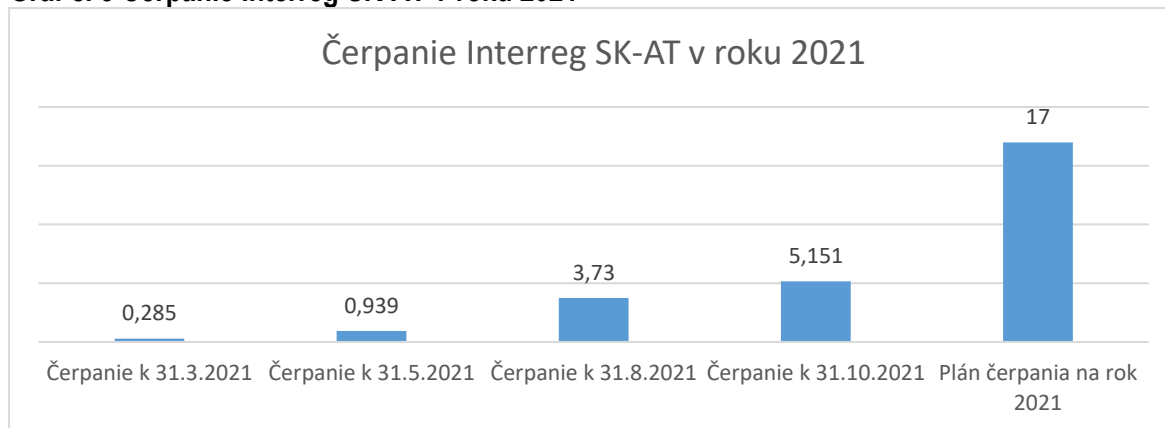

Zdroj: CO(MF SR)

v mil. EUR (EÚ zdroj)

**Tabuľka č. 8 Pokrok v čerpaní k 31.10.2021 od roku 2014 – programového obdobia:**

Rok	Čerpanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Čerpanie za zdroj EÚ (EUR)	kumulatívne % v porovnaní s alokáciou
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1 909 376,19	1 909 376,19	2,52
2019	5 694 554,25	7 603 930,44	10,02
2020 (do 3/2020)	129 709,93	7 733 640,37	10,19
2020 (do 4/2020)	10 082 774,05	17 816 414,42	23,48
2021 (do 05/2021)	939 648,74	18 756 063,16	24,71
2021 (do 08/2021)	3 736 705,84	21 553 119,84	28,40
2021 (do 10/2021)	5 150 603,86	22 967 018,28	30,26

Zdroj: CO (MF SR)

**B) Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení v zmysle materiálu Implementácia EŠIF k 31.3.2021.**

**Úloha č. 1 Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 17 000 000 EUR (EU zdroj). T: do 30.11.2021.**

- RO za účelom zabezpečenia čerpania v zmysle odporúčania CKO v objeme 17 000 000 EUR na rok 2021 priebežne monitoruje a vyhodnocuje stav implementácie programu na týždennej báze.
- RO/Spoločný sekretariát priebežne pripravuje a zabezpečuje ďalšie informačné semináre pre prijímateľov; proaktívne komunikuje so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov minimalizovaním chýb na strane prijímateľa a zabezpečením predkladania ŽoP podľa dohodnutých harmonogramov.
- Spoločný sekretariát na pravidelnej báze komunikuje s jednotlivými prvostupňovými kontrolami za účelom zefektívnenia čerpania finančných prostriedkov.
- RO skracuje lehoty na výkon kontroly VO, predkladania ZDV a ŽoP.
- RO zanalyzoval stav kľúčových/strategických projektov, ktoré priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze.
- Splnenie finančného záväzku (pravidla N+3) sa predpokladá k decembru 2021.


Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 2 Zabezpečiť kontrahovanie celého programu a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021.**

- Priebežne prebieha zazmluvňovanie projektov schválených v rámci 6. a 7. hodnotiaceho kola. V apríli 2021 bolo na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru schválených 8 projektov v celkovej sume 6 220 252,82 EUR za zdroj EFRR pri zníženom kofinancovaní a v priebehu mája 2021 boli žiadateľom zaslané výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Kontrahovanie schválených ŽoNFP sa očakáva v druhej polovici roka 2021 po preukázaní splnenia podmienok poskytnutia príspevku.
- Plnenie úlohy zabezpečiť kontrahovanie programu do 31.12.2021 vo výške minimálne 90% alokácie (68,30 mil. EUR) (EU zdroj) je na úrovni 95%. Z plánu kontrahovania do 31.12.2021 zostáva nakontrahovať sumu v objeme 3 408 525,18 EUR.



**Graf č. 6 Kontrahovanie Interreg V-A SK-AT k 31.10.2021**

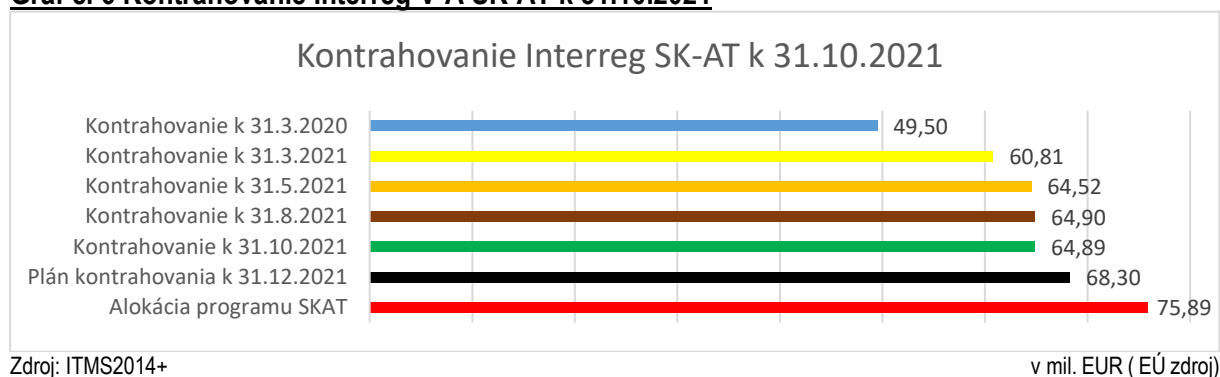

Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov k 31.10.2021 znázorňuje graf č. 6  
Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 3 Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.**

- Na programe Interreg V-A SK-AT boli v roku 2016 vyhlásené otvorené výzvy na predkladanie ŽoNFP na celú alokáciu programu, t. j. 75 892 681 EUR. Zároveň, na ostatnom zasadnutí Monitorovacieho výboru v apríli 2021, boli schvaľované ŽoNFP v celkovej sume 6 220 252,82 EUR za zdroj EFRR pri zníženom kofinancovaní predložené v rámci 8. hodnotiaceho kola. Zároveň bolo schválené nadkontrahovanie finančných prostriedkov pre slovenských partnerov, aby bolo možné schváliť projekty nad rámec dostupnej alokácie. Uplatnením tohto inštitútu alokácia Programu dosiahla úroveň 103,05%, avšak na základe výpočtov a odhadov RO sa nepredpokladá ku koncu programového obdobia nadčerpanie alokácie. Ďalšie vyhlásenie výziev, resp. uzávierka ďalšieho hodnotiaceho kola nie je plánovaná.

Úloha splnená.

**Úloha č. 4 Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.**

- Predloženie výdavkov na CO so 100 % financovaním bolo pre program Interreg V-A SK-AT v maximálne možnej miere využité do 31.3.2021. RO realizoval kontrolu a schválenie predložených ŽoP s cieľom v čo najvyššej možnej miere využiť 100 % kofinancovanie zo strany EK v 7. účtovnom roku. V 7. účtovnom roku boli predložené výdavky vo výške 10 229 408,58 EUR. Vzhľadom k potrebe naplnenia cieľa N+3 boli všetky dostupné výdavky v projektoch predložené 9 920 000 EUR na CO do konca roka 2020.
- Od 1.1.2021 do 31.3.2021 v súhrnných žiadostiach o platbu deklarované výdavky v sume 285 000 EUR.

Úloha splnená.

**Úloha č. 5 Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.**

- RO doplnil štvrťročný plán čerpania kľúčových/strategických projektov, ktorý zároveň predkladá v prílohe č. 4 Interreg V-A SK-AT štvrťročný plán čerpania strategických projektov k 31.10.2021. Projekty pravidelne monitoruje a vyhodnocuje potenciálne riziká v priebehu implementácie vrátane zohľadnenia ich pokroku s cieľom zabezpečiť čerpanie alokácie programu v dostatočnej výške.

Čerpanie kľúčových/strategických projektov v počte 8 je k 31.10.2021 vo výške 8 667 402,29 EUR. Plán čerpania k 31.12.2021 je stanovený na 12 428 037,89 EUR.



- Úloha splnená.

**Úloha č. 6 Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.**

- RO implementáciu programu vrátane kľúčových/strategických projektov priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze. Na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru v apríli 2021 bol schválený presun voľných disponibilných prostriedkov v celkovom objeme 1 560 000 EUR z PO 3 Podpora udržateľných dopravných riešení do PO 2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity s potenciálom ich využitia v programe. Záujem žiadateľov o predloženie projektov v PO 2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity presahuje alokáciu danej PO, zatiaľ čo záujem v PO 3 Podpora udržateľných dopravných riešení je dlhodobo nízky. Presunuté zdroje tak budú využité rýchlo a efektívne. RO aktuálne pripravuje návrh na realokáciu na EK.
- Čerpanie kľúčových/strategických projektov v počte 8 je k 31.10.2021 vo výške 8 667 402,29 EUR. Plán čerpania k 31.12.2021 je stanovený na 12 428 037,89 EUR.
- RO zároveň predkladá v prílohe č. 4 Interreg V-A SK-AT štvrťročný plán čerpania strategických projektov k 31.10.2021

Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 7 Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, najmä v rámci kritickej prioritnej osi 3, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.**

- Na 10. zasadnutí Monitorovacieho výboru v apríli 2021 bol schválený presun voľných disponibilných prostriedkov z PO 3 do PO 2 s potenciálom ich využitia v programe.
- RO aktuálne pripravuje návrh na realokáciu finálnych prostriedkov na EK a to z PO 3 do PO 2 v sume 1 556 079 € za zdroj EÚ. Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 8 Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.**

- RO priebežne analyzuje a vyhodnocuje stavy plnenia merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023. K 31.10.2021 RO neidentifikoval potrebu revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov.
- Detailnejší prehľad plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov RO predkladá v prílohe č. 5 Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKAT, ktorá obsahuje zoznam ukazovateľov výstupu a ich percentuálne vyjadrenie, a to znázorňuje, že program napreduje, a je vysoký predpoklad splnenia všetkých merateľných ukazovateľov ku koncu programového obdobia.

Úloha sa plní priebežne.

**Úloha č. 9 Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.**

- Vzhľadom na schválenie nadkontrahovania finančných prostriedkov na ŽoNFP pre slovenských partnerov v rámci 8. hodnotiaceho kola je uvedená úloha už nerelevantná.

Úloha splnená.

**Úloha č.10 Vypracovať a predložiť harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci programu za rok 2021, rozdelený po mesiacoch. T: do 30.4.2021.**





- RO vypracoval a predkladá harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci programu za rok 2021 rozdelený po mesiacoch v prílohe č. 6 Plán čerpania Interreg V-A SK-AT\_31 10 2021.

Úloha splnená.

**Úloha č.11 Vypracovať a predložiť plán vyhlasovania výziev na nezazmluvnené prostriedky v rámci programu. T: do 30.04.2021.**

- Na programe Interreg SK-AT boli v decembri 2016 vyhlásené otvorené výzvy na celú alokáciu programu. Z uvedeného dôvodu sa plán vyhlasovania výziev na programe nevypracováva.

Úloha splnená.

**Úloha č.12 Zabezpečiť skrátenie procesu výkonu prvostupňovej kontroly predložených výdavkov zo strany prijímateľov (first level control). T: priebežne.**

- Výdavky sú priebežne predkladané na miesta prvostupňovej kontroly v SR a AT, kde sú verifikované. Až po schválení výdavkov zo strany prvostupňovej kontroly je možné predložiť ŽoP na úrovni projektu. Hoci je dvojstupňová kontrola časovo náročnejšia, čerpanie na úrovni programu narastá postupne podľa predložených výdavkov od prijímateľov.
- RO pravidelne na štvrťročnej báze vyzýva jednotlivé miesta prvostupňovej kontroly (4 miesta), aby proces verifikovania urýchlili a tým pokiaľ je možné skrátili lehoty na výkon kontroly. Kontrola ŽoP na úrovni STS sa vykonáva bezodkladne.
- Prvostupňová kontrola v SR (zriadená na MIRRI SR) je dlhodobo personálne poddimenzovaná, RO vyvíja všetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanými pracovnými silami.

Úloha sa plní priebežne.

**C) Informácie o kritických problémoch implementácie programu**

Program Interreg V-A SK-AT v prvých rokoch svojej implementácie čelil obrovským problémom, ktoré mali dopad na neskoršie začatie implementácie programu t.j. od roku 2017. Následne RO zastabilizoval štruktúry, nastavil spoločne s Národnými orgánmi/Regionálnymi miestami v AT systém riadenia a kontroly a zabezpečil štandardnú implementáciu programu, i keď mnohé problémy pretrvávajú dodnes.

Faktory, ktoré spôsobujú kritické problémy implementácie programu:

- Výrazne negatívny dopad pandémie Covid-19 na implementáciu projektov:
  - početné zmeny harmonogramov vedúce k početným predlžovaniam projektov;
  - zmeny v spôsobe realizovania aktivít - presun do online priestoru (v prípade aplikovateľnosti), modifikácie a posuny v organizovaní spoločných akcií;
  - výrazne nižšie výdavky predkladané v porovnaní s plánmi čerpania;
  - pri nových projektoch je problematické predkladanie nevyhnutných povolení a potvrdení, čo výrazne spomaľuje proces zazmluvňovania.
- Vzhľadom na to, že na začiatku programového obdobia v roku 2015 RO nezabezpečil podklady a vstupy na vývoj ITMS2014+, monitorovací systém sa vyvíjal oveľa neskôr, v dôsledku čoho v ďalšej implementácii systém ITMS 2014+ v plnej miere nemohol zohľadniť potreby a špecifiká programov cezhraničnej spolupráce a je využívaný iba v obmedzenej miere, čo znamená zvýšenú administratívnu záťaž pre prijímateľov (duplicitné predkladanie dokumentácie), RO preto priebežne komunikuje s CKO/odbor ITMS, s prijímateľmi programu Interreg SK-CZ a používateľmi systému ITMS2014+ (verejná a neverejná časť) s cieľom uľahčiť a dostatočne vysvetliť prácu v ňom.
- Komplikovaný proces VO – opakované VO – nekompletnosť dokumentácie predkladanej zo strany prijímateľov, vysoká chybovosť, a s tým spojené predlžovanie realizácie projektov s výrazným dopadom na čerpanie programu (investičné projekty).



- RO zaslal žiadosť na skrátenie procesu verifikácie výdavkov FLC AT listom podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na zrýchlenie výkonu prvostupňovej kontroly v Dolnom Rakúsku a požiadavku na rizikových prijímateľov o zrýchlenie implementácie projektov (Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj).
- Nedostatok administratívnych kapacít.

#### **D) Prijaté opatrenia:**

MIRRI SR aktívne pristupuje k riešeniu problematiky implementácie programu Interreg V-A SK-AT a priebežne prijíma opatrenia s cieľom akcelerovať čerpanie programu:

- Aktívna komunikácia s prijímateľmi a partnermi projektov, poskytovanie pomoci s evidovaním údajov v systéme ITMS2014+, osobitne vo vzťahu k rakúskym partnerom projektov.
- Zabezpečenie školení a/alebo konzultácií, či iných informačných seminárov pre prijímateľov; proaktívna komunikácia so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov minimalizovaním chýb na strane prijímateľa a zabezpečiť predkladanie ŽoP podľa dohodnutých harmonogramov.
- Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19, pristúpenie na formu virtuálnych konzultácií, seminárov, zasadnutí Monitorovacieho výboru tak, aby proces implementácie pokračoval plynulo a bez vonkajších obmedzení.
- Priebežné a pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie stavu implementácie na týždennej úrovni a v prípade identifikácie konkrétnych problémov v projektoch ich operatívne riešenie v súčinnosti s prijímateľmi.
- Ukončenie schvaľovacieho procesu predložených ŽoNFP na poslednom zasadnutí Monitorovacieho výboru v apríli 2021 a čo možno najskoršie zazmluvňovanie schválených projektov (závisí od preukázania podmienok poskytnutia príspevku žiadateľom). Kontrahovanie sa očakáva v 3. a 4. štvrtroku 2021.
- Ukončenie schvaľovacieho procesu predložených ŽoNFP (na SMV v máji 2021) a následne čo najskoršie zazmluvňovanie schválených projektov (závisí od preukázania podmienok poskytnutia príspevku žiadateľom).
- RO zanalyzoval stav kľúčových/strategických projektov, ktoré priebežne monitoruje a vyhodnocuje na týždennej báze,
- RO pravidelne na štvrtročnej báze vyzýva jednotlivé miesta prvostupňovej kontroly (4 miesta), aby proces verifikovania urýchlili a tým pokiaľ je možné skrátili lehoty na výkon kontroly.
- RO vyvíja všetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanými pracovnými silami (pravidelné vyhlasovanie výberových konaní).

#### **IV. Zoznam použitých skratiek**

<b>Skratka</b>	<b>Celý názov</b>
AT	Rakúsko
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	certifikačný orgán
COV	celkové oprávnené výdavky
CZ	Česká republika
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FLC	Prvostupňová kontrola
Interreg SK-AT	Program spolupráce V-A SK-AT
Interreg SK-CZ	Program spolupráce V-A SK-CZ
ITMS 2014+	Informačný systém
MF SR	Ministerstvo financií SR
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
NFP	nenávratný finančný príspevok
OA	orgán auditu
PO	prioritná os
RO	riadiaci orgán
SR	Slovenská republika
ŠR	štátny rozpočet
TP	technická pomoc
VO	verejné obstarávanie
ZDV	Zoznam deklarovaných výdavkov
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	žiadosť o platbu

#### **Prílohy:**

Príloha č. 1 Interreg V-A SK-CZ štvrtročný plán čerpania strategických projektov k 31.10.2021

Príloha č. 2 Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKCZ

Príloha č. 3 Plán vyhlasovania výziev SKCZ 2021

Príloha č. 4 Interreg V-A SK-AT štvrtročný plán čerpania strategických projektov k 31.10.2021

Príloha č. 5 Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKAT

Príloha č. 6 Plán čerpania Interreg V-A SK-AT\_31 10 2021
