

Informácia o stave implementácie
európskych štrukturálnych a investičných fondov
k 31.05.2023

Obsah

1.	Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 31.05.2023	3
1.1	Stav implementácie podľa operačných programov	9
1.2	Stav implementácie podľa jednotlivých rezortov bez prioritných osí technickej pomoci	22
2.	Využitie nových iniciatív Európskej komisie – stav k 31.05.2023.....	24
2.1	Implementácia opatrení na eliminovanie dopadov pandémie COVID-19	24
2.2	Implementácia REACT-EU.....	25
2.3	Implementácia FAST-CARE	27
2.4	Implementácia SAFE.....	29
3.	Plány čerpania na roky 2023 a 2024 podľa rezortov.....	30
	Príloha č. 1: Stav implementácie EŠIF podľa prioritných osí OP (k 31.05.2023, so zohľadnením SAFE presunov) - semafor	32
	Príloha č. 2: Predbežná sumarizácia fázovaných projektov z PO 2014 – 2020 do PO 2021 – 2027 – stav k 15.05.2023	34
	Príloha č. 3: "Spiace projekty" v delení na OP a rezorty - stav k 31.05.2023	35
	Príloha č. 4: Stanovenie rizík na úrovni RO a SO	36
	Príloha č. 5: Zoznam rizikových projektov PO7 podľa rezortov so stavom hlavného verejného obstarávania.....	37

1. Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 31.05.2023

V programovom období 2014 – 2020 sa implementujú fondy EÚ prostredníctvom 11 operačných programov, pričom za implementáciu každého operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán.

Informácia je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31.12.2025.

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR na realizáciu operačného programu. RO je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 plne zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.

Rok 2023 je pre RO kľúčový na zabezpečenie riadneho ukončovania programov. RO v tejto fáze implementácie finalizujú prípravy posledných žiadostí o zmenu programu, zabezpečujú zvýšený počet administratívnych kontrol žiadostí o platbu, ukončovanie projektov, prípravu fázovania niektorých projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí a zabezpečujú všetky potrebné postupy pre úspešné ukončovanie programov.

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie EŠIF, ktorý je na úrovni 102,38 %, je zároveň kľúčové, aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023. Efektívne čerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich rézii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli.

Z celkovej alokácie 14,50 mld. EUR je k 31.05.2023 vyčerpaných 10,21 mld. EUR a zostáva vyčerpať ešte 4,29 mld. EUR.

Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na certifikačný orgán MF SR.

Kľúčové opatrenia na vyčerpanie 4,29 mld. EUR sú:

1. ukončovanie implementácie projektov zo strany prijímateľov do 31.12.2023 a dočerpanie zostávajúcich alokácií jednotlivých programov;
2. **SAFE** (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) **v súčasnosti RO avizujú vyčleniť 1,04 mld. EUR**, s možnosťou navýšenia až do výšky 1,45 mld. EUR, a to na pomoc zraniteľným domácnostiam prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP (revízia OP KŽP a OP II už schválená MV OP);
3. **FAST CARE** (pomoc UA utečencom) – **315,26 mil. EUR** je presmerovaných na výdavky súvisiace s prvotným prijatím **UA utečencov** a ich integráciou do spoločnosti prostredníctvom 3 OP, a to: IROP, OP ĽZ a OP II. **K 31.05.2023 bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 317,56 mil. EUR (100,73 %), zazmluvnených 14,18 mil. EUR (4,50 %) a vyplatených 192,35 tis. EUR (0,06 %).**
4. **využívanie 15 % flexibility** čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci operačného programu/fondu bez potreby realokácie;
5. **analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní** vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK;
6. **využívanie fázovania – možné** rozdelenie projektov na 2 fázy, z ktorých druhá bude ukončená v programovom období 2021 – 2027. Do 15.05.2023 jednotlivé RO a SO zaslali menný zoznam projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia alokácií na 1. a 2. fázu;
7. **sfunkčnenie projektov najneskôr do 15. februára 2027, ktoré nebudú do 31. decembra 2023 finančne ukončené** (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa);

8. využívanie dodatočného príspevku, teda využitie prostriedkov získaných uplatnením 100 % financovania výdavkov zo strany EK za 7. a 8 účtovný rok na dofinancovania zvýšených výdavkov projektov.

Tabuľka č. 1: Prehľad opatrení na vyčerpanie 4,29 mld. EUR


Operačný program	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (alokácia - čerpanie)	Plánovaná realokácia na energokrízu	Realokácia na migračnú krízu	Zostáva vyčerpať po realokácii na energo a migračnú krízu
OP Integrovaná infraštruktúra	1 918 933 936	574 818 551	30 000 000	1 314 115 385
OP Kvalita životného prostredia	969 350 871	387 885 361		581 465 510
Integrovaný regionálny OP	798 149 036	76 366 735	244 014 456	477 767 845
OP Ľudské zdroje	486 120 997	-	41 254 000	444 866 997
OP Efektívna verejná správa	62 089 692			62 089 692
PS Interreg V-A SK-AT	21 814 301			21 814 301
PS Interreg V-A SK-CZ	20 462 206			20 462 206
OP Technická pomoc	6 724 178			6 724 178
OP Rybné hospodárstvo	6 903 403			6 903 403
Program spolupráce INTERACT III	277 213			277 213
EŠIF bez PRV:	4 290 825 833	1 039 070 647	315 268 456	2 936 486 730

Z objemu 4,29 mld. EUR je plánovaných na:

- ✓ **SAFE**, t.j. riešenie energokrízy: 1,04 mld. EUR
- ✓ **FAST CARE**, podpora UA utečencov: 0,31 mld. EUR (315,25 mil. EUR)
- ✓ **čerpanie ostatných projektov EŠIF**: 2,94 mld. EUR (t.j. 20 % z alokácie)


(k 31.05.2023 je v realizácii ešte 7002 projektov so zazmluvnenou sumou 9,70 mld. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 5,30 mld. EUR na projektoch).

Graf č. 1a Plánované použitie zostávajúcej alokácie programového obdobia 2014 – 2020

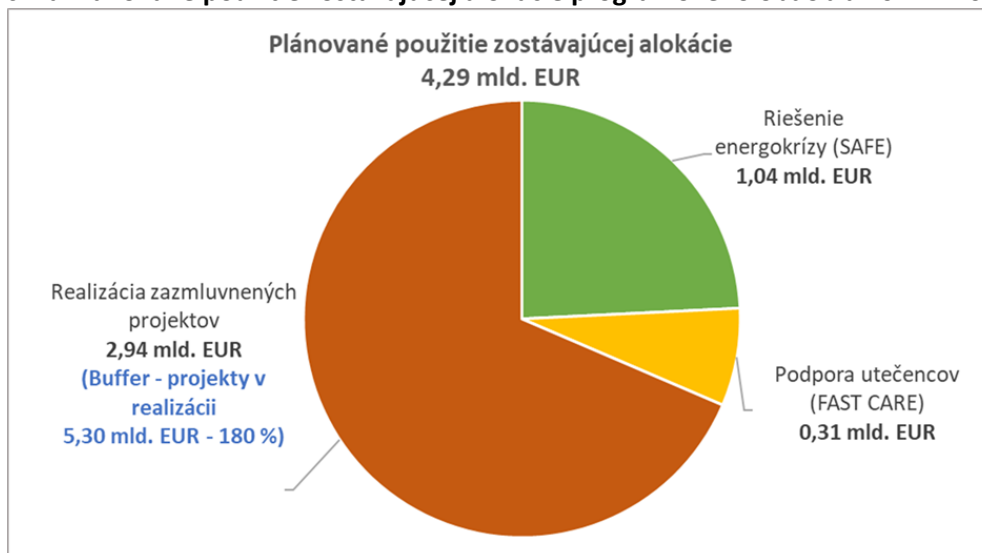

Len realizáciou opatrení na riešenie energokrízy v objeme 1,04 mld. EUR a opatrení na podporu UA utečencov v objeme 315,26 mil. EUR sa čerpanie dostane na úroveň 79,75 %.

Graf č. 1b Potenciál čerpania v zazmluvnených projektoch

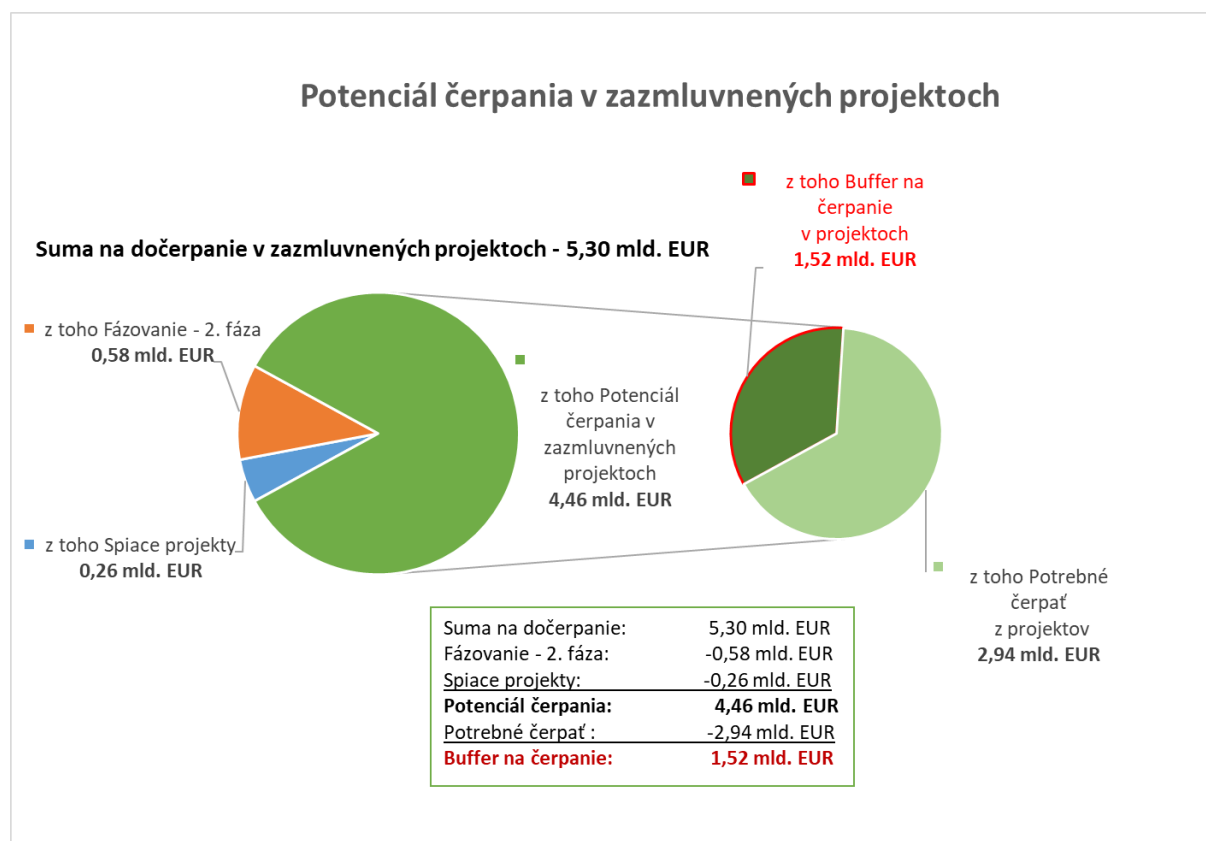

Za predpokladu úspešnej realizácie SAFE a FAST CARE sa zníži zostávajúca suma potrebná pre vyčerpanie celej alokácie do marca 2024 zo zazmluvnených projektov na 2,94 mld. EUR, ktoré sú kryté ešte nevyčerpanými projektami v objeme 5,30 mld. EUR, čo predstavuje 180 % z potrebnej sumy 2,94 mld. EUR. Aj po zohľadnení spiacich projektov v objeme 0,26 mld. EUR a 2. fáz projektov, ktoré sú v súčasnosti v objeme 0,58 mld. EUR, zostáva potenciál čerpania v zazmluvnených projektoch v objeme 4,46 mld. EUR, čo predstavuje 152 % z potrebnej sumy 2,94 mld. EUR a rezerva na čerpanie z projektov predstavuje 1,52 mld. EUR. Z uvedeného je zrejmé, že kľúčovým hráčom v implementácii eurofondov PO 2014 – 2020 v súčasnom období sú prijímatelia, s ktorými sú uzatvorené zmluvy.

Materiál ďalej poskytuje informáciu o rizikách jednotlivých operačných programov a ich riadiacich a sprostredkovateľských orgánov v zmysle stanovenia rizík v prílohe č. 4.

Ako vysoko rizikové a rizikové boli identifikované tieto RO a SO:

- ✖ **MŽP SR (SAŽP) - OP KŽP – vysoké riziko** – problematické PO 1 a PO 2 financované z KF, čo znamená, že **nie je možný presun alokácie do inej PO**; implementácia je postavená na veľkom množstve menších investičných projektov, ktorú sú ovplyvnené COVIDom a nárastom cien stavebných materiálov; problémová implementácia projektov rezortných organizácií; zostáva vyčerpať ešte pomerne vysoký objem finančných prostriedkov vo výške 361 mil. EUR.
- ✖ **MPRV SR – OP RH - vysoké riziko** - dlhodobá problémová implementácia (dekomitment každý rok a aj strata výkonnostnej rezervy)
- ✖ **MV SR – OP IŽ - PO6 MRK - vysoké riziko** - problematická je **PO 6 MRK** financovaná z EFRR, čo znamená, že **je obmedzený presun alokácie do inej PO**; veľa malých infraštruktúrnych projektov v obciach s MRK, v rámci ktorých je vysoká chybovosť VO a problém s navýšením cien stavebných materiálov; mimoriadna ukončovanie projektov (EK odmietla presun na SAFE, čo by zmiernilo riziko dekomitmentu) – **uvedené môže byť čiastočne riešené prostredníctvom finančných nástrojov implementovaných SIH cez projekt DoDo do výšky 25 mil. EUR, za predpokladu súhlasného stanoviska SIH a spoločnosti Dostupný Domov j.s.a (zatiaľ s ním nedisponujeme).**



- ✖ **MŠVVŠ SR - OP II - riziko - realizácie veľkého projektu ACCORD v gescii MŠVVŠ SR** – ostáva vyčerpať ešte 26,79 mil. EUR (48 %) a aktuálne je prešetrovaná kauza prijatia úplatku koordinátorom projektu na UK (pozastavené platby zo strany EK), MŠVVŠ zároveň rieši s EK možné navýšenie alokácie z dôvodu navýšenia cien – projekt má byť ukončený do 2023; **realizácia projektov biobanky** – problémy so stavbou; ostáva vyčerpať ešte 21,13 mil. EUR (80 %), fázovanie projektu.
- ✖ **MIRRI SR - OP II - riziko - Implementácia PO 7** – pomalá a meškajúca implementácia projektov na strane prijímateľov; suma, ktorú je potrebné vyčerpať prevyšuje doterajšie čerpanie (zoznam rizikových projektov tejto prioritnej osi je v prílohe č.5)
- ✖ **MK SR – IROP - riziko** – veľa projektov s veľkým počtom VO - neukončené kontroly VO a zmenové konania – zmeny v projektoch v enormných objemoch kvôli cenám a nedostupnosti viacerých tovarov na trhu; nezáujem prijímateľov pokračovať v projekte po skončení kovidovej doby, vysoký počet mimoriadnych ukončení projektov v REACT-EU a to najmä z dôvodu vysokej chybovosti vo VO a ďalej sa očakáva rozsiahle mimoriadne ukončovanie už zazmluvnených projektov zo strany prijímateľov; otvorenie zásobníka projektov a pristúpenie k nadkontrahovaniu.

Prehľad nevyčerpanej alokácie jednotlivých programov k 31.05.2023

OP Integrovaná infraštruktúra



Revízie OP II: ✓ FAST CARE - revízia schválená EK 4.04.2023,

SAFE - revízia schválená MV 29.05.2023, EK bude zaslaná do konca júna 2023

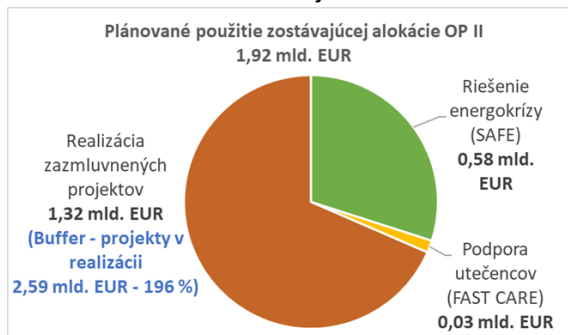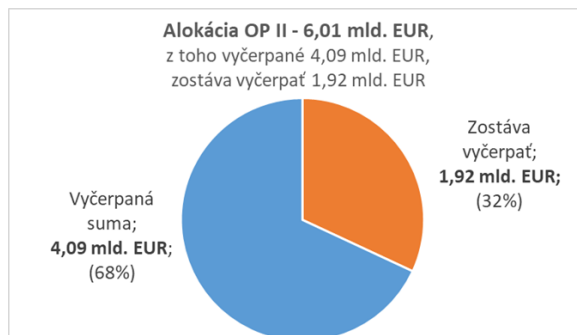

OP Kvalita životného prostredia



Revízia OP KŽP: SAFE - revízia schválená MV 30.03.2023, EK bude zaslaná po konaní SEA v 9/2023

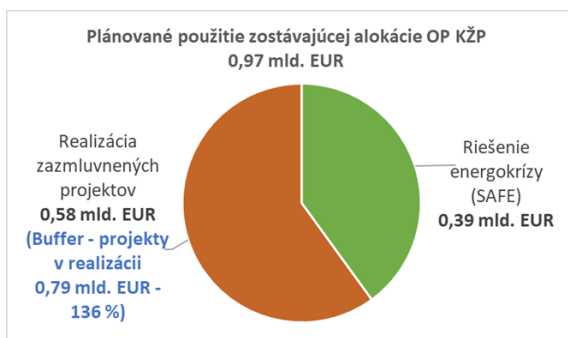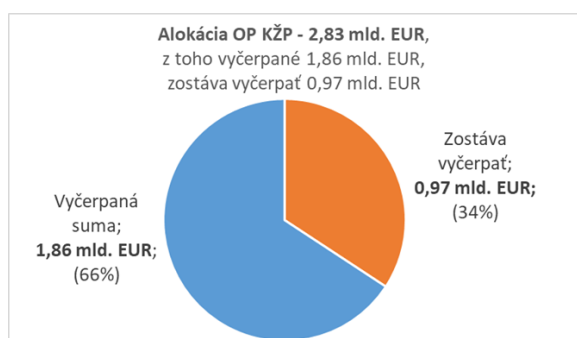

Integrovaný regionálny OP

Revízie IROP: ✓ FAST CARE - revízia schválená EK 12.05.2023



SAFE – revízia v príprave, odkomunikovaná s EK, schvaľovanie na MV začiatkom júna 2023

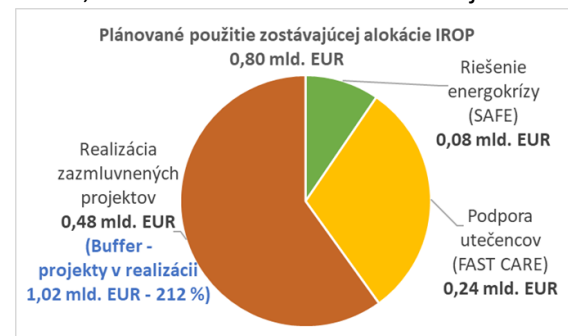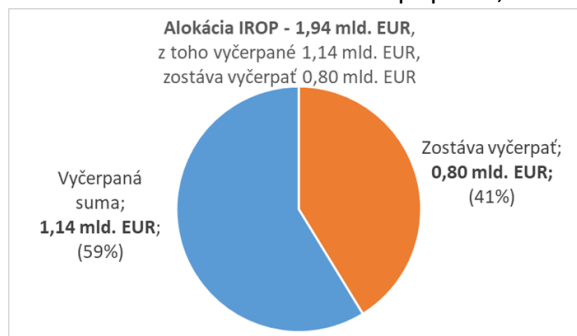

OP Ľudské zdroje

Revízie OP ĽZ: ✓ FAST CARE - revízia schválená EK 19.12.2022


✗ SAFE - nesúhlas EK s presunom z PO 6 MRK

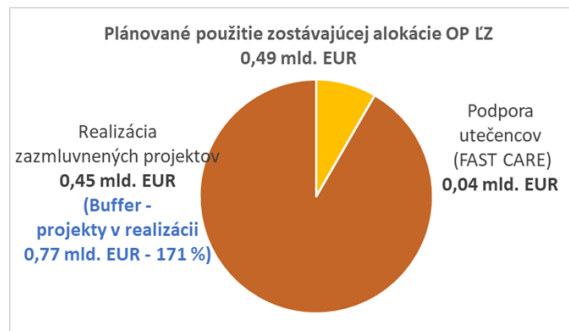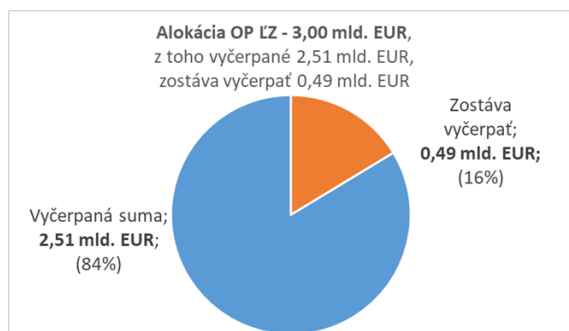

OP Efektívna verejná správa

Alokácia OP EVS - 354 mil. EUR


z toho vyčerpané 292 mil. EUR,
zostáva vyčerpať 62 mil. EUR



OP Technická pomoc

Alokácia OP TP - 159 mil. EUR,


z toho vyčerpané 152 mil. EUR,
zostáva vyčerpať 7 mil. EUR



Interreg V-A SK-CZ

Alokácia Interreg V-A SK-CZ - 90 mil. EUR


z toho vyčerpané 70 mil. EUR,
zostáva vyčerpať 20 mil. EUR



Interreg V-A SK-AT

Alokácia Interreg V-A SK-AT - 76 mil. EUR


z toho vyčerpané 54 mil. EUR,
zostáva vyčerpať 22 mil. EUR



OP Rybné hospodárstvo

Alokácia OP RH - 7,74 mil. EUR (po dekomitmente),


z toho vyčerpané 2,5 mil. EUR,
zostáva vyčerpať 5,3 mil. EUR



INTERACT III

Alokácia INTERACT III - 39,4 mil. EUR

z toho vyčerpané 39,1 mil. EUR,
zostáva vyčerpať 0,3 mil. EUR



1.1 Stav implementácie podľa operačných programov

Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 14,50 mld. EUR (oproti pôvodnej alokácii vo výške 13,78 mld. EUR došlo v rokoch 2021 – 2022 k navýšeniu o zdroje REACT-EU vo výške 722,25 mil. EUR).

➤ Výzvy/vyzvania

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 sprístupnili riadiace orgány v **833 výzvach a vyzvaniach** pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 31.05.2023 finančné prostriedky vo výške **21,72 mld. EUR**, čo predstavuje **150,17 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

➤ Kontrahovanie

Úroveň **kontrahovania** všetkých fondov alokovaných pre SR (okrem EPFRV) v rámci programového obdobia 2014 – 2020 dosiahla k 31.05.2023 hodnotu **14,85 mld. EUR**, čo predstavuje **102,38 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

➤ Čerpanie

K 31.05.2023 dosiahla SR za všetky fondy (okrem EPFRV) alokované pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni **10,21 mld. EUR**, čo predstavuje **70,41 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Do konca programového obdobia je ešte potrebné vyčerpať 4,29 mld. EUR. Čerpanie je možné až do marca 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania záverečných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na MF SR.


Tabuľka č. 2: Stav implementácie jednotlivých OP k 31.05.2023 (vrátane alokácie na SAFE)

Operačný program	Zodpovedný rezort/orgán	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (EÚ zdroj)	% kontrahovania	% čerpania	Ostáva vyčerpať do 3/2024 (rozdiel alokácie a aktuálneho čerpania)
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	2 996 457 169	3 097 236 284	2 510 336 172	103,36%	83,78%	486 120 997
OP Integrovaná infraštruktúra	MD SR	6 009 937 611	6 385 130 693	4 091 003 675	106,24%	68,07%	1 918 933 936
OP Kvalita životného prostredia	MŽP SR	2 832 531 290	2 569 928 209	1 863 180 419	90,73%	65,78%	969 350 871
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	1 935 724 762	2 085 387 096	1 137 575 726	107,73%	58,77%	798 149 036
OP Efektívna verejná správa	MV SR	354 655 437	344 748 369	292 565 745	97,21%	82,49%	62 089 692
OP Technická pomoc	MIRRI SR	159 071 912	155 426 464	152 347 734	97,71%	95,77%	6 724 178
OP Rybné hospodárstvo	MPRV SR	9 386 728	3 097 619	2 483 325	33,00%	26,46%	6 903 403
PS Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	92 308 763	69 677 257	102,41%	77,30%	20 462 206
PS Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	76 328 239	54 078 380	100,57%	71,26%	21 814 301
Program spolupráce INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	39 115 381	100,00%	99,30%	277 213
EŠIF bez PRV		14 503 189 647	14 848 984 329	10 212 363 814	102,38%	70,41%	4 290 825 833

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Porovnanie stavu a zostatkov čerpania k 31.05.2023 podľa jednotlivých OP

Graf č. 2: Stav čerpania podľa OP k 31.05.2023

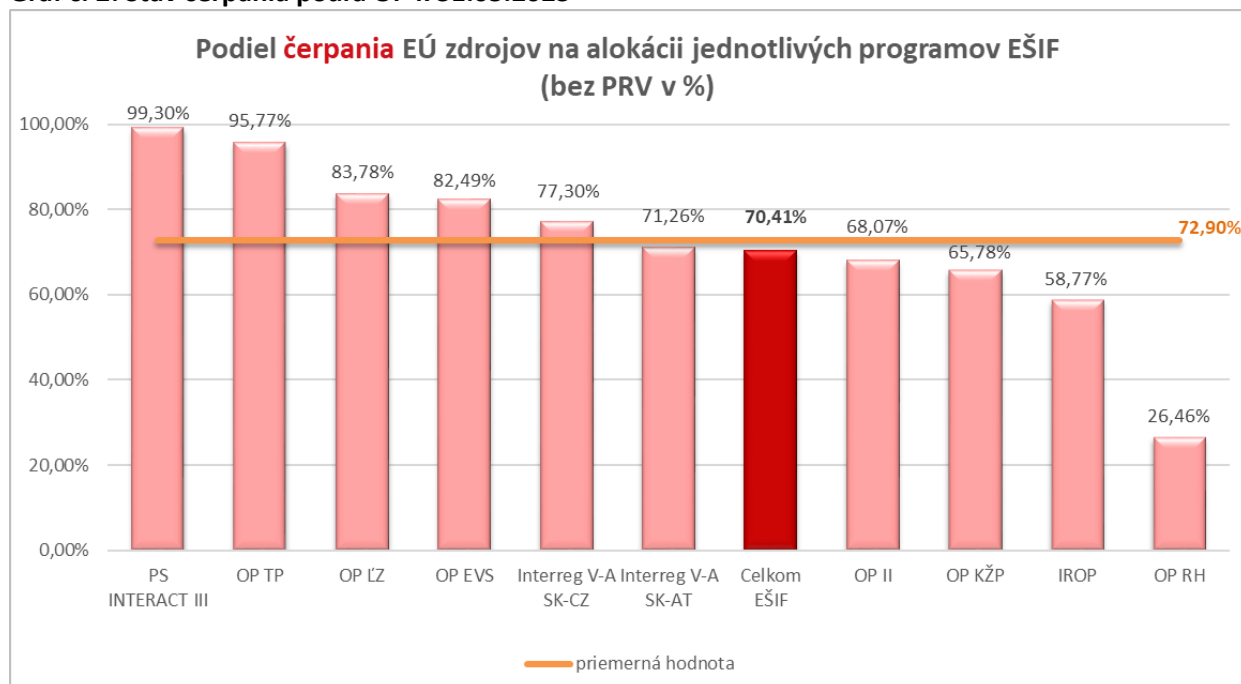

Graf č. 3: Zostáva vyčerpať do konca programového obdobia podľa OP k 31.05.2023



Do konca programového obdobia (najneskôr do marca 2024) zostáva vyčerpať ešte **4,29 mld. EUR**



Najviac zostáva vyčerpať za:

- **OP II (1,92 mld. EUR)**, čo predstavuje 31,93 % alokácie,
- **OP KŽP (969,35 mil. EUR)**, čo predstavuje 34,22 % alokácie,
- **IROP (798,15 mil. EUR)**, čo predstavuje 41,23 % alokácie.

OP Integrovaná infraštruktúra - riadiaci orgán MD SR

Alokácia:	6,01 mld. EUR
Kontrahovanie:	6,38 mld. EUR (106,24 %)
Čerpanie k 31.05.2023:	4,09 mld. EUR (68,07 %)
Potrebné vyčerpať:	1,92 mld. EUR
Pokrytie čerpania:	3,12 mld. EUR
✓ FAST CARE:	30 mil. EUR (revízia schválená EK 04.04.2023)
✓ SAFE:	575 mil. EUR (revízia schválená MV 29.05.2023)
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	2,59 mld. EUR – potrebné vyčerpať 1,32 mld. EUR

(k 31.05.2023 je v realizácii ešte 1441 projektov so zazmluvnenou sumou 4,69 mld. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 2,59 mld. EUR, z toho 234 spiacich projektov v sume 120,80 mil. EUR a 17 fázovaných projektov s objemom 2. fázy minimálne 420,44 mil. EUR)

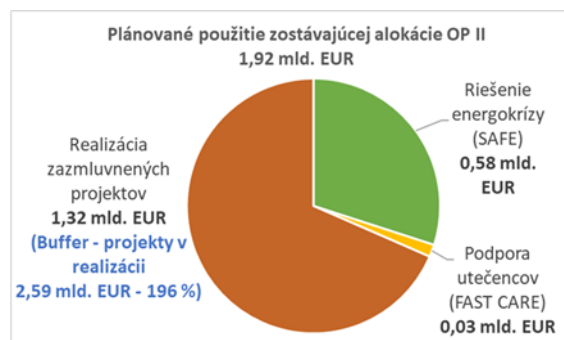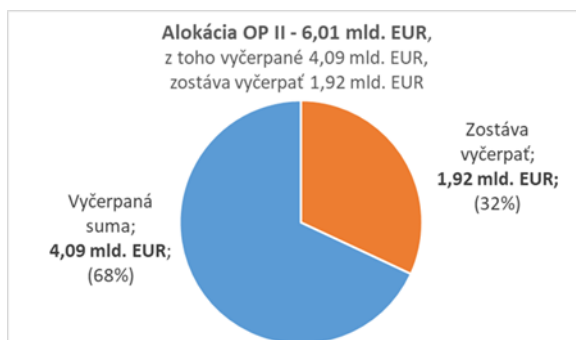

Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	MATEMATICKY Zostáva nakontrahovať do konca program. obdobia	MATEMATICKY Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia 3/2024	Zostáva vyčerpať v zazmluvnených projektoch (potenciál čerpania)
Zodpovedný rezort - Ministerstvo dopravy SR	3 105 676 947	3 693 246 204	2 303 991 958	118,92%	74,19%	- 587 569 257	801 684 989	1 433 364 633
SO - Ministerstvo hospodárstva SR	1 254 806 311	1 356 338 549	1 143 027 094	108,09%	91,09%	- 101 532 238	111 779 217	452 532 464
SO - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	456 940 302	658 567 081	201 553 964	144,13%	44,11%	- 201 626 779	255 386 338	458 868 153
SO - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	460 695 500	525 730 338	302 356 773	114,12%	65,63%	- 65 034 838	158 338 727	227 722 454
SAFE	574 818 551							
OP Integrovaná infraštruktúra (bez TP)	5 852 937 611	6 233 882 171	3 950 929 789	106,51%	67,50%	- 380 944 560	1 902 007 822	2 572 487 704
OP Integrovaná infraštruktúra (s TP)	6 009 937 611	6 385 130 693	4 091 003 675	106,24%	68,07%	- 375 193 082	1 918 933 936	2 590 555 304

Pozn.: Alokácie sú znížené o zdroje na SAFE

Riziká:

- ✗ MD SR – **mierne riziko** – veľký objem nevyčerpanej alokácie
- ✗ MH SR - **bez rizika**
- ✗ MIRRI SR - **riziko** - Implementácia PO 7 – pomalá a meškajúca implementácia projektov na strane prijímateľov (zoznam rizikových projektov v prílohe č.5); suma, ktorú je potrebné vyčerpať prevyšuje doterajšie čerpanie
- ✗ MŠVVŠ SR - **riziko** - realizácie veľkého projektu ACCORD v gescii MŠVVŠ SR – ostáva vyčerpať ešte 26,79 mil. EUR (48 %) a aktuálne je prešetrovaná kauza prijatia úplatku koordinátorom projektu na UK (pozastavené platby zo strany EK), MŠVVŠ zároveň rieši s EK možné navýšenie alokácie z dôvodu navýšenia cien – projekt má byť ukončený do 2023; realizácia projektov biobanky – problémy so stavbou; ostáva vyčerpať ešte 21,13 mil. EUR (80 %), fázovanie projektu.

Navrhované opatrenia:

- ❖ Využitie iniciatív EK – FAST CARE a SAFE
- ❖ Využitie nadkontrahovania
- ❖ Plné využitie finančných nástrojov v rámci MH SR
- ❖ Využitie inštitútov EK - fázovanie a nefunkčné projekty (najmä veľké projekty dopravy)
- ❖ Využitie možnosti presunov alokácie medzi PO toho istého fondu a kategórie regiónov prostredníctvom revízie OP do 9/2023, najmä v prípade MIRRI SR a MŠVVŠ SR
- ❖ Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP

- ❖ **Analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK**
- ❖ **Analýza spiacich projektov a na základe jej výsledkov určenie, ktoré projekty a v akej výške sa nebudú realizovať.**

Opatrenia v procese implementácie - MIRRI SR – PO 7:


- ❖ **spätné financovanie výdavkov štátneho rozpočtu prostredníctvom PO7 v alokácii 61 mil. EUR:**
 - ✓ **„EDUNET_SK“ v rámci PO7**, v ktorom ide o poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR prostredníctvom virtuálnej privátnej siete s centrálnym prestupom do internetu. Uvedený projekt je v realizácii od roku 2019 a v nadväznosti na spätnú oprávnenosť výdavkov sa financujú výdavky vynaložené počas pandémie ochorenia COVID-19 (t.j. od februára 2020). Zmluva bola uzavretá 1.12.2022. Finančné prostriedky na prostriedky **predstavujú 31 mil. EUR;**
 - ✓ **výzva „Modernizácia informačných systémov“ v alokácii 30 mil. EUR** – v júli 2022 bola vyhlásená výzva zameraná na rozvoj elektronických služieb pre občana, podnikateľa a manažment dát verejnej správy prostredníctvom optimalizácie informačných systémov realizovaných primárne formou tzv. „change requests“ t.j. zmenových požiadaviek vykonávaných prostredníctvom existujúcich dodávateľských / zmlúv o úrovni poskytovaných služieb (tzv. SLA zmlúv). Ide o **spätnú refundáciu týchto zmenových požiadaviek, ktoré boli financované zo štátneho rozpočtu;**
- ❖ **digitálny príspevok pre žiakov SR (voucherová/poukážková schéma) vo výške 49,9 mil. EUR** – realizácia národného projektu za účelom **financovania digitálneho príspevku pre vybrané kategórie žiakov základných a stredných škôl** – spolu 152 000 žiakov. Príspevok vo výške 350 EUR sa bude poskytovať ako jednorazová platba za účelom rozvoja a podpory ich digitálnych zručností (IT vybavenie, softwarové programy,). Príspevok nie je viazaný na konkrétny tovar/službu, ale je koncipovaný na podporu rozvoja digitálnych zručností. Zmluva bola uzavretá 6.12.2022;
- ❖ **rozšírenie okruhu oprávnených žiadateľov PO7 OPII o neziskové organizácie a súkromný sektor prostredníctvom 2 dopytovo-orientovaných výziev s využitím zjednodušeného vykazovania výdavkov (40% paušálnej sadzby) v alokácii 10 mil. EUR:**
 - výzva *„Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“* v alokácii 5 mil. EUR - vyhlásená 25. 4. 2022 s cieľom podporiť využívanie internetových služieb (vrátane elektronických služieb) zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu prostredníctvom projektov organizácií neziskového sektora;
 - výzva *„Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci“* v alokácii 5 mil. EUR - vyhlásená 18.1.2022 s cieľom podporiť zlepšenie využívania elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizáciu a zefektívnenie ich prevádzky. Zároveň je cieľom zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov. Opravenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty v oblasti IT.
- ❖ **IT konzultanti – MIRRI SR poskytovalo žiadateľom odborných IT konzultantov, ktorí participovali na príprave projektov PO7 pre subjekty štátnej a verejnej správy** (financované z technickej asistencie OPII);
- ❖ **pravidelné analytické monitorovanie rizikovosti projektov** z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia (december 2023) a následné **zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov** - **rizikové projekty sú zo strany MIRRI SR pravidelne monitorované** a MIRRI SR poskytuje prijímateľom maximálnu súčinnosť a podporu; podľa závažnosti rizika pravidelné stretnutia s prijímateľmi na úrovni generálnych riaditeľov a/alebo riaditeľmi odborov;
- ❖ **zníženie administratívnej záťaže prijímateľov** - zjednodušenie procesov v rámci implementácie projektov v rámci vydaného usmernenia k predkladaniu dokumentácie pri preukazovaní vykonaných prác zamestnancov prijímateľa (najmä **zavedenie zjednodušených pracovných výkazov a sumarizačných hárkov**) a zníženie rozsahu predkladanej dokumentácie k žiadostiam o platbu;
- ❖ **akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov – stanovenie hraničného termínu na vyhlásenie verejného obstarávania (ďalej len „VO“) na hlavné aktivity projektu;** ak prijímateľ nevyhlási VO do stanoveného termínu 29.10.2021, má MIRRI SR právo odstúpiť od zmluvy a presunúť finančné prostriedky na lepšie pripravené projekty;

- ❖ pravidelné upozorňovanie prijímateľov na **nutnosť akcelerovať implementáciu projektov** a zrýchliť podávanie žiadostí o platbu – **v priebehu februára 2023 boli prostredníctvom listinnej komunikácie (listy na ministerskej úrovni) vyzvaní na zrýchlenie čerpania všetci prijímatelia, ktorí nesplnili plán čerpania stanovený na r. 2022 aspoň na 50 %;**
- ❖ **akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov – stanovenie hraničného termínu na vyhlásenie verejného obstarávania (ďalej len „VO“) na hlavné aktivity projektu;** ak prijímateľ nevyhlási VO do stanoveného termínu do termínu 31.10.2022, ak zmluvy o NFP nadobudli účinnosť do 31.12.2021, a do termínu 31.12.2022, ak zmluvy o NFP nadobudli účinnosť do 31.3.2022; má MIRRI SR právo odstúpiť od zmluvy a presunúť finančné prostriedky na lepšie pripravené projekty;
- ❖ **za účelom eliminácie prepadu finančných prostriedkov** a vzhľadom na pokrok v implementácii projektov na strane prijímateľov, napriek prijatým opatreniam zo strany MIRRI, boli realokované finančné prostriedky z PO7 nasledovne: **30 mil. EUR do novovytvorenej prioritnej osi 14 (FAST CARE) a 200 mil. EUR do prioritnej osi 15 (SAFE);**
- ❖ **na základe monitoringu rizikových projektov PO 7, ktorých prijímateľmi sú ministerstvá a nimi zriadené organizácie, akcelerovať čerpanie.**

OP Kvalita životného prostredia - riadiaci orgán MŽP SR

Alokácia:	2,83 mld. EUR
Kontrahovanie:	2,57 mld. EUR (90,73 %)
Čerpanie k 31.05.2023:	1,86 mld. EUR (65,78 %)
Potrebné vyčerpať:	969 mil. EUR
Pokrytie čerpania:	1,18 mld. EUR
✓ SAFE:	388 mil. EUR (revízia schválená MV 30.03.2023, EK bude zaslaná po konaní SEA v 9/2023)
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	787 mil. EUR – potrebné vyčerpať 581 mil. EUR

(k 31.05.2023 je v realizácii ešte 922 projektov so zazmluvnenou sumou 1,45 mld. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 787 mil. EUR, z toho 23 spiacich projektov v sume 16,53 mil. EUR a 19 projektov s predpokladom fázovania, s objemom 2. fázy maximálne 160,13 mil. EUR)

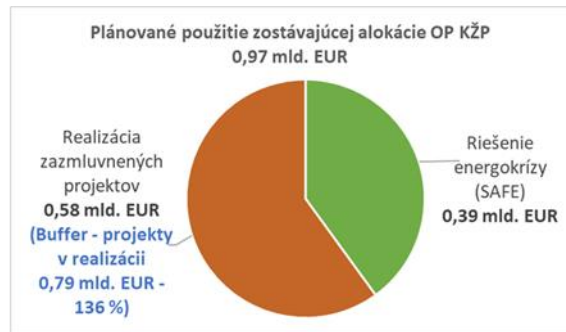

Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	MATEMATICKÝ Zostáva nakontrahovať do konca program. obdobia	MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024	Zostáva vyčerpať v zazmluvnených projektoch (potenciál čerpania)
Zodpovedný rezort - Ministerstvo životného prostredia SR	1 361 217 081	1 506 924 249	999 935 042	110,70%	73,46%	- 145 707 168	361 282 039	541 675 441
SO - Ministerstvo hospodárstva SR	787 772 813	795 838 189	630 185 743	101,02%	80,00%	- 8 065 376	157 587 070	196 021 301
SO - Ministerstvo vnútra SR	218 656 035	191 602 299	155 501 331	87,63%	71,12%	27 053 736	63 154 704	48 166 465
SAFE	387 885 361							
OP Kvalita životného prostredia celkom (bez TP)	2 755 531 290	2 494 364 737	1 785 622 116	90,52%	64,80%	261 166 553	969 909 174	785 863 207
OP Kvalita životného prostredia (s TP)	2 832 531 290	2 569 928 209	1 863 180 419	90,73%	65,78%	262 603 081	969 350 871	787 785 437

Pozn.: Alokácie sú znížené o zdroje na SAFE

Riziká:

- ✗ **MŽP SR (SAŽP) – vysoké riziko** – problematické PO 1 a PO 2 financované z KF, čo znamená, že nie je možný presun alokácie do inej PO; implementácia je postavená na veľkom množstve menších investičných projektov, ktorú sú ovplyvnené COVIDom a nárastom cien stavebných materiálov; problémová implementácia projektov rezortných organizácií; zostáva vyčerpať ešte pomerne vysoký objem finančných prostriedkov vo výške 361 mil. EUR.
- ✗ **MH SR (SIEA) - bez rizika** (nadčerpá svoju alokáciu a využije 15 % flexibilitu z PO 3 časť MV)
- ✗ **MV SR - bez rizika** (čerpanie časti alokácie bude pokryté projektami PO 4 SIEA)

Navrhované opatrenia:


- ❖ Využitie iniciatívy EK – SAFE
- ❖ Využitie nadkontrahovania
- ❖ Využitie absorpčnej kapacity SIEA v rámci EFRR
- ❖ Umožnenie aktualizácie rozpočtu, doplnenia 15 % rezervy a čerpania dodatočného príspevku v súvislosti s nárastom cien stavebných prác, tovarov a služieb
- ❖ Plné využitie finančných nástrojov (MŽP SR a SIEA)
- ❖ Využitie inštitútov EK - fázovanie a nefunkčné projekty
- ❖ Využitie možnosti presunov alokácie medzi PO toho istého fondu a kategórie regiónov prostredníctvom revízie OP do 9/2023
- ❖ Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP
- ❖ Analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgency vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK
- ❖ Zvýšený dohľad nad implementáciou rizikových projektov, v rámci ktorých je prijímateľom organizácia v riadiacej pôsobnosti MŽP SR
- ❖ Analýza spiacich projektov a na základe jej výsledkov určenie, ktoré projekty a v akej výške sa nebudú realizovať.

Integrovaný regionálny operačný program - riadiaci orgán MIRRI SR

Alokácia: 1,94 mld. EUR (REACT-EU v objeme 235 mil. EUR)
Kontrahovanie: 2,09 mld. EUR (107,73 %)
Čerpanie k 31.05.2023: 1,14 mld. EUR (58,77 %)
Potrebné vyčerpať: 798 mil. EUR

Pokrytie čerpania: 1,34 mld. EUR
 ✓ FAST CARE 244 mil. EUR (revízia schválená EK 12.5.2023)
 ✓ SAFE: 76 mil. EUR (revízia v príprave, odkomunikovaná s EK; schvaľovanie na MV začiatkom júna)
 ✓ Realizácia zazmluvnených projektov: 1,02 mld. EUR – potrebné vyčerpať 478 mil. EUR

(k 31.05.2023 je v realizácii ešte 1682 projektov so zazmluvnenou sumou 1,59 mld. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 1,02 mld. EUR, z toho 171 spiacich projektov v sume 98,58 mil. EUR a 13 fázovaných projektov s objemom 2. fázy, ktorá je ešte predmetom analýzy – max 60 mil. EUR)

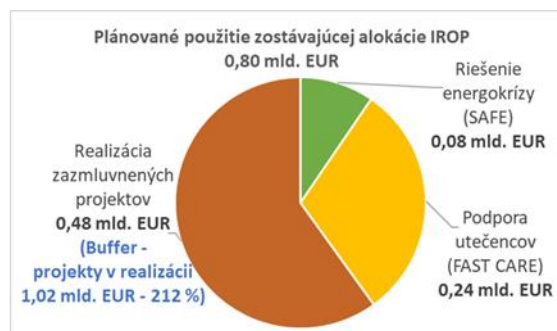

Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	MATEMATICKÝ Zostáva nakontrahovať do konca program. obdobia	MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia 3/2024	Zostáva vyčerpať v zazmluvnených projektoch (potenciál čerpania)
Zodpovedný rezort - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 325 934 926	1 573 648 627	811 534 573	118,68%	61,20%	- 247 713 701	514 400 353	827 476 600
SO - Ministerstvo zdravotníctva SR	355 882 489	317 046 718	233 415 887	89,09%	65,59%	38 835 771	122 466 602	89 815 087
SO - Ministerstvo kultúry SR	108 240 612	125 560 647	30 993 811	116,00%	28,63%	- 17 320 035	77 246 801	94 348 860
SAFE	76 366 735							
Integrovaný regionálny operačný program (bez TP)	1 866 424 762	2 016 255 992	1 075 944 271	108,03%	57,65%	- 149 831 230	790 480 491	1 011 640 546
Integrovaný regionálny operačný program (s TP)	1 935 724 762	2 085 387 096	1 137 575 726	107,73%	58,77%	- 149 662 334	798 149 036	1 021 782 658

Pozn.: Alokácie sú znížené o zdroje na SAFE

Riziká:

- ✗ **MIRRI SR - mierne riziko** – veľký objem nevyčerpanej alokácie
- ✗ **MZ SR – bez rizika**
- ✗ **MK SR - riziko** – veľa projektov s veľkým počtom VO - neukončené kontroly VO a zmenové konania – zmeny v projektoch v enormných objemoch kvôli cenám a nedostupnosti viacerých tovarov na trhu; nezáujem prijímateľov pokračovať v projekte po skončení kovidovej doby, vysoký počet mimoriadnych ukončení projektov v REACT-EU a to najmä z dôvodu vysokej chybovosti vo VO a ďalej sa očakáva rozsiahle mimoriadne ukončovanie už zazmluvnených projektov zo strany prijímateľov; otvorenie zásobníka projektov a pristúpenie k nadkontrahovaniu.

Opatrenia v procese implementácie :

❖ Využitie iniciatív EK – FAST CARE a SAFE

Iniciatíva FAST CARE sa implementuje prostredníctvom:

1. Národného projektu, kde sa financujú výdavky štátneho sektora v súvislosti s poskytovaním pomoci utečencom - **dňa 27.04.2023 bolo vyhlásené písomné vyzvanie** pre podporu štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny na 117 098 056 EUR. Prijímateľom projektu je MIRRI SR, ktorý predložil žiadosť o NFP dňa 31.05.2023. Aktuálne prebieha proces administratívneho overovania. V projekte je Ministerstvo vnútra SR partnerom projektu, kde sa refundujú činnosti na riadenie projektu z dôvodu poskytnutia registra utečencov.

2. Dopytovo-orientovanej výzvy pre mestá a obce na financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov - **dňa 14.03.2023 bola vyhlásená výzva „Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine“** určená pre 1 463 miest a obcí a zameraná na refundáciu zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s alokáciou 126,92 mil. EUR. Na túto výzvu je k 1.6.2023 predložených 1 410 ŽoNFP v celkovom objeme 125,89 mil. EUR, z toho podmienky OH spĺňa 718 ŽoNFP v objeme 86,56 mil. EUR a sú uzatvorené 4 zmluvy poskytnutie o ŽoNFP v objeme 8,43 mil. EUR (zdroj EÚ).

SAFE na úhradu energií zraniteľným domácnostiam vo výške **76 mil. €** - s cieľom efektívnej implementácie operačného programu a včasnej prípravy na jeho ukončenie RO pre IROP je aktuálne v procese zisťovacieho konania revízia operačného programu verzia 14.0, kde predmetom zmeny IROP je **vytvorenie prioritnej osi 10 – Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy – SAFE CARE**. Investície v danej prioritnej osi budú riešiť dôsledky energetickej krízy so zameraním na kompenzáciu zvýšených cien energií pre zraniteľné domácnosti, ktoré v rokoch 2022 - 2023 čelia inflačnému tlaku na rast životných nákladov. Prioritná os 10 absorbuje alokácie voľných zdrojov z prioritnej osi 7 – REACT-EU v celkovom objeme 76 366 735 EUR (zdroj EÚ). Predpokladané schválenie revízie členmi MV pre IROP je v júni 2023. Schválenie revízie Európskou komisiou bude závisieť od výsledkov zisťovacieho konania a potreby robiť SEA.

❖ **Využitie nového FN cez SIH vo výške 51,4 mil. EUR (úvery pre VÚC a mestá na financ. projektov)**

V rámci revízie IROP, verzia 13.0, ktorá bola schválená Monitorovacím výborom IROP dňa 17.02.2023, je zo strany RO pre IROP navrhnutá podpora investícií do cestnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotníckej infraštruktúry prostredníctvom finančného nástroja SIH. Takáto podpora sa týka výlučne územia menej rozvinutého regiónu (MRR), keďže v území viac rozvinutého regiónu (VRR) IROP nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami. Predpokladané poskytnutie tranží po dohode so SIH-om bude v priebehu júna 2023.

❖ **Refundácia výdavkov na vakcíny vo výške 26 mil. EUR - príprave NP MZ SR**

Dňa 10.05.2023 členovia MV pre IROP schválili zámer národného projektu na **Podporu opatrení na zvýšenie kolektívnej imunity obyvateľstva pred šírením koronavírusovej pandemickej infekcie a zabezpečenie materiálo-technického vybavenia v zdravotníckom systéme**. V júni 2023 je predpokladané vyhlásenie písomného vyzvania na národný projekt.

❖ **Využitie nadkontrahovania, využitie zásobníka vo výzvach (ak relevantné)**

❖ **Využitie inštitútov EK - fázovanie a nefunkčné projekty**

❖ **Dodatočný príspevok (SUR+)**

❖ **Zjednodušenie a sprehľadnenie metodických usmernení v rámci Operačného programu pre prijímateľov a žiadateľov**

❖ **Optimalizovanie a stabilizácia administratívnych kapacít sekcie, v náročnom období prelínania dvoch programových období ukončovania programového obdobia 2014-2020 a rozbehnutia programového obdobia 2021-2027**

❖ **Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP**

❖ **Intenzívna komunikácia s prijímateľmi a zaslané upozorňujúce listy prijímateľom na stav implementácie projektov a výzva na akceleráciu čerpania a dodržiavania predložených projektov (marec/apríl 2023)**


❖ **Usmernenie RO pre IROP pre prijímateľov k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP**

❖ **Analýza spiacich projektov a na základe jej výsledkov určenie, ktoré projekty a v akej výške sa nebudú realizovať.**

OP Ľudské zdroje – riadiaci orgán MPSVR SR

Alokácia:	2,99 mld. EUR (REACT-EU v objeme 383 mil. EUR)
Kontrahovanie:	3,10 mld. EUR (103,36 %)
Čerpanie k 31.05.2023:	2,51 mld. EUR (83,78 %)
Potrebné vyčerpať:	486 mil. EUR
Pokrytie čerpania:	811 mil. EUR
✓ FAST CARE	41 mil. EUR (revízia schválená EK 19.12.2022)
✓ SAFE	0 mil. EUR (nesúhlas EK s presunom z PO 6 MRK)
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	770 mil. EUR – potrebné vyčerpať 445 mil. EUR

(k 31.05.2023 je v realizácii ešte **2768 projektov** so zazmluvnenou sumou 1,69 mld. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 770 mil. EUR na projektoch, z toho 97 spiacich projektov v sume 28,31 mil. EUR)

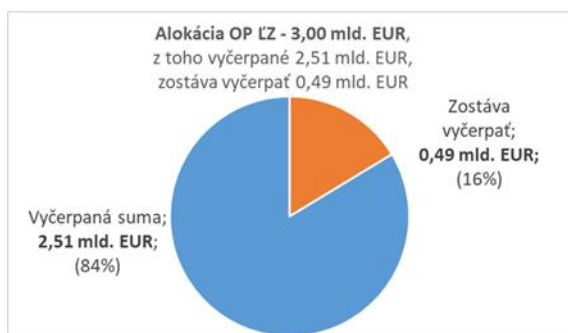

Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	MATEMATICKY Zostáva nakontrahovať do konca program. obdobia	MATEMATICKY Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia 3/2024	Zostáva vyčerpať v zazmluvnených projektoch (potenciál čerpania)
Zodpovedný rezort - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	2 160 489 587	2 236 322 057	1 876 500 313	103,51%	86,86%	- 75 832 470	283 989 274	503 677 512
SO - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	373 762 595	400 786 141	310 796 499	107,23%	83,15%	- 27 023 546	62 966 096	112 747 476
SO - Ministerstvo vnútra SR	371 762 462	369 274 479	236 164 157	99,33%	63,53%	2 487 983	135 598 305	147 046 181
OP Ľudské zdroje (bez TP)	2 906 014 644	3 006 382 678	2 423 460 970	103,45%	83,39%	- 100 368 034	482 553 674	763 471 169
OP Ľudské zdroje (s TP)	2 996 457 169	3 097 236 284	2 510 336 172	103,36%	83,78%	- 100 779 115	486 120 997	770 403 488

Riziká:


- ❖ MPSVR SR – bez rizika
- ❖ MŠVVŠ SR – bez rizika
- ❖ MV SR – PO 5,8 bez rizika, PO6 MRK - vysoké riziko - problematická je PO 6 MRK financovaná z EFRR, čo znamená, že je obmedzený presun alokácie do inej PO; veľa malých infraštruktúrnych projektov v obciach s MRK, v rámci ktorých je vysoká chybovosť VO a problém s navýšením cien stavebných materiálov; mimoriadna ukončovanie projektov (EK odmietla presun na SAFE, čo by zmiernilo riziko dekomitmentu) – uvedené môže byť čiastočne riešené prostredníctvom finančných nástrojov implementovaných SIH cez projekt DoDo do výšky 25 mil. EUR, za predpokladu súhlasného stanoviska SIH a spoločnosti Dostupný Domov j.s.a (zatiaľ s ním nedisponujeme).

Navrhované opatrenia:

- ❖ Využitie iniciatívy EK FAST CARE
- ❖ Využitie nadkontrahovania
- ❖ Využitie finančných nástrojov na projekt DoDo v rámci PO 6 MRK do výšky 25 mil. EUR
- ❖ Využitie inštitútov EK - fázovanie a nefunkčné projekty
- ❖ Využitie možnosti presunov alokácie medzi PO toho istého fondu a kategórie regiónov prostredníctvom revízie OP do 9/2023
- ❖ Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP
- ❖ Analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgency vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK
- ❖ Analýza spiacich projektov a na základe jej výsledkov určenie, ktoré projekty a v akej výške sa nebudú realizovať.

OP Efektívna verejná správa – riadiaci orgán MV SR

Alokácia:	354 mil. EUR (REACT-EU v objeme 103 mil. EUR)
Kontrahovanie:	345 mil. EUR (97,21 %)
Čerpanie k 31.05.2023:	292 mil. EUR (82,49 %)
Potrebné vyčerpať:	62 mil. EUR
Pokrytie čerpania:	62 mil. EUR
✓ Realizácia zazmluvnených projektov: 62 mil. EUR – potrebné vyčerpať 62 mil. EUR	
(k 31.05.2023 je v realizácii ešte 58 projektov so zazmluvnenou sumou 168,93 mil. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 62 mil. EUR na projektoch)	

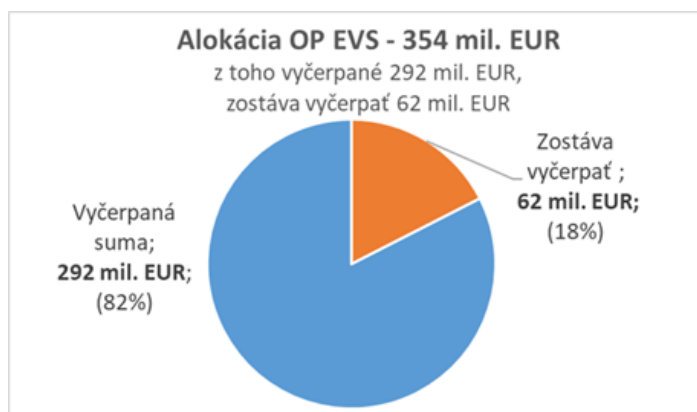

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 ÚR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	37 730 586	217 584 872	108,31%	-16 692 688	169 153 060	84,20%	31 739 124
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	7 533 343	30 682 213	81,94%	6 764 128	27 976 732	74,71%	9 469 609
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	2 691 739	12 559 636	95,60%	578 336	11 514 304	87,64%	1 623 668
	PO 4 - REACT EU	RO: MV SR	ESF REACT-EU	103 178 940	0	83 921 649	81,34%	19 257 291	83 921 649	81,34%	19 257 291
	CELKOM OP EVS:			354 655 437	47 955 668	344 748 369	97,21%	9 907 068	292 565 745	82,49%	62 089 692

Riziká:

- ✗ **bez rizika** - 1 národný projekt (NP) z PO2 vo výške 6,24 mil. EUR je v štádiu odborného hodnotenia, 1 NP z PO4 vo výške 19,25 mil. EUR je v štádiu prípravy. Sú to NP, pri ktorých nie je žiadne verejné obstarávanie a v rámci naplnenia cieľov projektov ide o spätnú refundáciu vzniknutých nákladov. Zaradenie schválených ŽoP do čerpania je naplánované v 3. a 4. kvartáli roku 2023. Kontrahovanie bude vo výške 104,4 %.


Navrhované opatrenia:

- ❖ **Využitie nadkontrahovania**
- ❖ **Využitie 2. tranže REACT-EU cez národný projekt**
- ❖ **Využitie možnosti presunov alokácie medzi PO toho istého fondu a kategórie regiónov prostredníctvom revízie OP do 9/2023**
- ❖ **Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP**
- ❖ **Analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgency vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK**
- ❖ **Zvýšený dohľad nad implementáciou rizikových projektov, v rámci ktorých je prijímateľom ÚOŠS.**

PCS SK-AT – riadiaci orgán MIRRI SR

Alokácia:	76 mil. EUR
Kontrahovanie:	76 mil. EUR (100,57 %)
Čerpanie k 31.05.2023:	54 mil. EUR (71,26 %)
Potrebné vyčerpať:	22 mil. EUR
Pokrytie čerpania:	30 mil. EUR
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	30 mil. EUR

(k 31.05.2023 je v realizácii za SK-AT ešte **40 projektov** so zazmluvnenou sumou 64,29 mil. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 29,81 mil. EUR na projektoch)

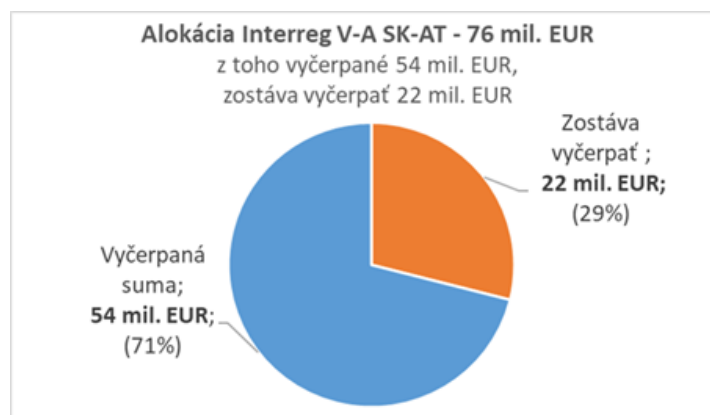

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj / za 7. ÚR + 8 ÚR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	722 402	19 583 359	99,49%	99 783	16 789 505	85,30%	2 893 637
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	29 376 079	1 806 594	30 343 627	103,29%	-967 548	17 382 265	59,17%	11 993 814
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	8 098 921	403 708	8 098 921	100,00%	0	5 703 219	70,42%	2 395 702
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	590 791	13 828 802	97,52%	352 177	10 097 023	71,20%	4 083 956
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	457 680	4 473 529	98,24%	80 031	4 106 369	90,18%	447 191
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	3 981 175	76 328 239	100,57%	-435 558	54 078 380	71,26%	21 814 301

Riziká:

- ✗ **Mierne riziko** - nízka úroveň čerpania v PO 2 (59,17 %) - v danej osi sa nachádza podstatný počet projektov, ktoré nie sú finančne ukončené alebo sú v implementácii a ešte budú v roku 2023 generovať výdavky.


Opatrenia v procese implementácie:

- ❖ **Možnosť navýšenia intenzity EFRR na 85%** - ako nástroj na maximálnu absorpciu v programe bolo zavedené, že nie všetky projekty boli zazmluvnené s maximálnou intenzitou. V PO1 ide o 1 projekt, kde je potenciál absorpcie 928 tis. EUR. V PO2 ide o 4 projekty, kde je potenciál absorpcie 960 tis. EUR.
- ❖ **Využitie nadkontrahovania** - nadkontrahovanie na SK stane v rámci 4 projektov v PO2 (v súčasnosti 100,57%), kde ide o sumu 754 tis. EUR.
- ❖ **V predložených žiadostiach o platbu a zoznamoch deklarovaných výdavkov je potenciál čerpania 18 mil. EUR.** Okrem toho je 9 projektov stále v realizácii s potenciálom čerpania do 9,5 mil. EUR (viď zoznam projektov v implementácii v tabuľke nižšie)
- ❖ **Dôsledný monitoring projektov zo strany Riadiaceho orgánu**
- ❖ **Využitie možnosti 15 % flexibility čerpania v rámci OP** (680 tis. EUR sa plánuje presunúť do PO5 „Technická pomoc“)

PCS SK-CZ– riadiaci orgán MIRRI SR

Alokácia:	90 mil. EUR
Kontrahovanie:	92 mil. EUR (102,41 %)
Čerpanie k 31.05.2023:	70 mil. EUR (77,30 %)
Potrebné vyčerpať:	20 mil. EUR
Pokrytie čerpania:	29,5 mil. EUR
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	29,5 mil. EUR

(k 31.05.2023 je v realizácii je v realizácii ešte **53 projektov** so zazmluvnenou sumou 45,69 mil. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 29,50 mil. EUR na projektoch)

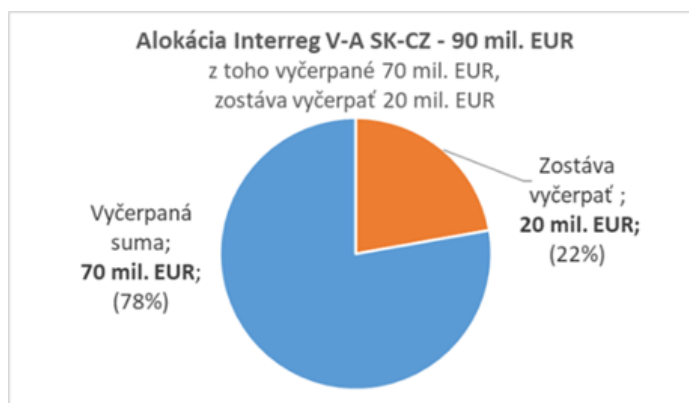

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 ÚR za všetky zdroje bez pro rata	
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	775 447	12 646 829	95,31%	621 700	10 347 743	77,99%	2 920 786
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	4 366 169	65 830 613	105,60%	-3 490 161	48 922 331	78,48%	13 418 121
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	606 052	8 335 501	91,38%	786 614	5 575 547	61,12%	3 546 568
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	480 396	5 495 820	101,62%	-87 453	4 831 637	89,34%	576 730
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	6 228 064	92 308 763	102,41%	-2 169 300	69 677 257	77,30%	20 462 206

Riziká:

- ✖ **Mierne riziko** – Ako riziková bola vyhodnotená PO2 „Kvalitné životné prostredie“ vzhľadom na to, že v rámci prebiehajúceho schvaľovania finančného plánu dôjde k presunu alokácie programu do tejto PO. V tento osi sa nachádzajú projekty schválené v rámci posledných výziev programu, pri ktorých môžu nastať problémy spojené s procesom verejného obstarávania.


Opatrenia v procese implementácie:

- ❖ **Využitie nadkontrahovania**, pričom v súčasnosti je nadkontrahovanie na úrovni 102,72%
- ❖ **Využitie možnosti presunov alokácií v rámci revízie OP do 9/2023**
- ❖ **Vyhlásenie „rýchlobrátkovej“ výzvy (02/2023), následne prebehol proces hodnotenia a o projektoch v objeme cca 2,1 mil. eur sa bude rozhodovať na zasadnutí MV 14.6.2023** (časovo a technicky nenáročné projektové aktivity na drobný mobiliár a propagáciu), čo zabezpečí vyššie nadkontrahovanie až na úroveň **103,64%**
- ❖ **V predložených žiadostiach o platbu a zoznamoch deklarovaných výdavkov v rámci monitorovacieho systému ITMS je 4,7 mil. eur, ktoré vstúpia do čerpania v nasledujúcich mesiacoch**
- ❖ **Dôsledný monitoring projektov zo strany MIRRI**
- ❖ **Využitie možnosti 15 % flexibility čerpania medzi PO pri finálnom vyúčtovaní OP** (plánujú sa projekty v rámci PO4 „Technická pomoc“)

OP Rybné hospodárstvo – riadiaci orgán MPRV SR

Alokácia:	7,7 mil. EUR – po odpočítaní dekomitmentu za 2022
Kontrahovanie:	3,1 mil. EUR (40,26 %)
Čerpanie k 31.05.2023:	2,5 mld. EUR (32,47 %)
Potrebné vyčerpať:	5,3 mil. EUR
Pokrytie čerpania:	0,2 mil. EUR
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	0,2 mil. EUR

(k 31.05.2023 je v realizácii ešte **12 projektov** so zazmluvnenou sumou 1,18 mil. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 0,20 mil. EUR na projektoch)

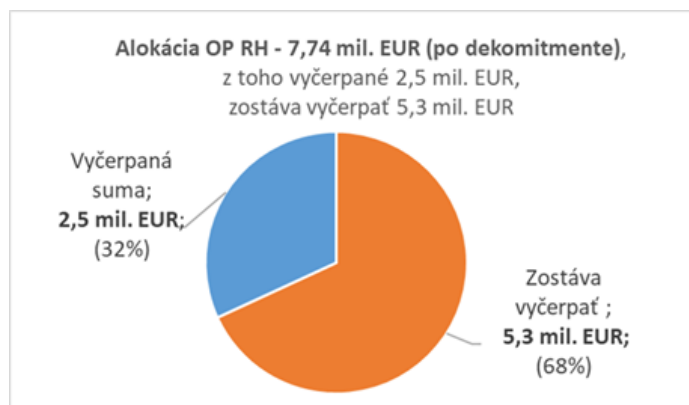

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie	
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	ENFR	5 321 319	1 773 774	1 529 845	28,75%	3 791 474	1 034 913	19,45%	4 286 406
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	ENFR	780 644	139 343	78 918	10,11%	701 726	40 743	5,22%	739 901
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	ENFR	2 481 071	827 025	682 058	27,49%	1 799 013	605 891	24,42%	1 875 180
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	267 898	806 798	100,39%	-3 104	801 777	99,76%	1 917
	CELKOM OP RH:			9 386 728	3 008 040	3 097 619	33,00%	6 289 109	2 483 325	26,46%	6 903 403

Riziká:

- ✗ **Vysoké riziko** - dlhodobá problémová implementácia (dekomitment každý rok a aj strata výkonnostnej rezervy) – **odhadované nedočerpanie zvyšku alokácie je 2 – 5 mil. EUR**
- ✗ V prípade, že 12 prijatých ŽoNFP nebude v dostatočnej kvalite a nedôjde k ich schváleniu a zazmluvneniu, môže byť maximálne odhadované nedočerpanie programu na konci PO až vo výške 5 mil. EUR
- ✗ Nesplnenie plánovaných hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca na konci PO môže viesť k ďalším korekciám pri ukončovaní programu.

Navrhované opatrenia:

- ❖ **Včasný vyhodnotenie 12 ŽoNFP s predpokladom čerpania 2,1 mil. EUR tak, aby sa ukončila realizácia aktivít projektov do 31.12.2023**
- ❖ **Dočerpanie ešte neukončených projektov vo výške 204,5 tis. EUR.**

Tento OP patrí medzi najhoršie implementované programy v EÚ.

1.2 Stav implementácie podľa jednotlivých rezortov bez prioritných osí technickej pomoci

Viaceré rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov podieľajú a sú zodpovedné, či už ako RO alebo SO, za implementáciu celého, resp. časti OP. Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad o stave kontrahovania a čerpania celej alokácie, ktorej implementáciu zabezpečuje príslušný rezort, ako aj prehľad objemov finančných prostriedkov, ktorých čerpanie je potrebné zabezpečiť za jednotlivé rezorty do konca programového obdobia 2014 – 2020.

Tabuľka č. 3: Stav implementácie v rozdelení po rezortoch k 31.05.2023 - súhrnne za rezorty

Rezort/OP	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj) (bez SAFE)	Alokácia SAFE	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (EÚ zdroj)	% kontrahovania (bez SAFE)	% čerpania (bez SAFE)	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (bez SAFE) (alokácia - čerpanie)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	834 458 095		926 516 479	613 153 272	111,03%	73,48%	221 304 823
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP EVS, OP KŽP)	931 935 962		893 065 512	672 716 928	95,83%	72,18%	259 219 034
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 042 579 124		2 152 176 737	1 773 212 837	105,37%	86,81%	269 366 287
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 098 017 357	76 366 735	2 546 309 824	1 280 253 902	121,37%	61,02%	817 763 455
Ministerstvo dopravy SR (OP II)	3 105 676 947	574 818 551	3 693 246 204	2 303 991 958	118,92%	74,19%	801 684 989
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 160 489 587		2 236 322 057	1 876 500 313	103,51%	86,86%	283 989 274
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 361 217 081	387 885 361	1 506 924 249	999 935 042	110,70%	73,46%	361 282 039
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (OP RH)	8 583 034		2 290 821	1 681 547	26,69%	19,59%	6 901 487
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	355 882 489		317 046 718	233 415 887	89,09%	65,59%	122 466 602
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	108 240 612		125 560 647	30 993 811	116,00%	28,63%	77 246 801


Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Tabuľka č. 4: Prehľad čerpania jednotlivých rezortov k 31.05.2023 (bez prioritných osí TP a alokácie na SAFE) – zoradené podľa % čerpania

Rezort	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj) (bez SAFE)	Alokácia SAFE	čerpanie k 31.05.2023	% čerpania alokácie (bez SAFE)	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (bez SAFE)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 160 489 587		1 876 500 313	86,86%	283 989 274
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 042 579 124		1 773 212 837	86,81%	269 366 287
Ministerstvo dopravy SR (OP II)	3 105 676 947	574 818 551	2 303 991 958	74,19%	801 684 989
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	834 458 095		613 153 272	73,48%	221 304 823
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 361 217 081	387 885 361	999 935 042	73,46%	361 282 039
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	931 935 962		672 716 928	72,18%	259 219 034
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	355 882 489		233 415 887	65,59%	122 466 602
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 098 017 357	76 366 735	1 280 253 902	61,02%	817 763 455
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	108 240 612		30 993 811	28,63%	77 246 801
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (OP RH)	8 583 034		1 681 547	19,59%	6 901 487

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

Graf č. 4: Zostáva vyčerpať podľa rezortov k 31.05.2023 – zoradené podľa objemu zdrojov, ktoré zostáva vyčerpať (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE)

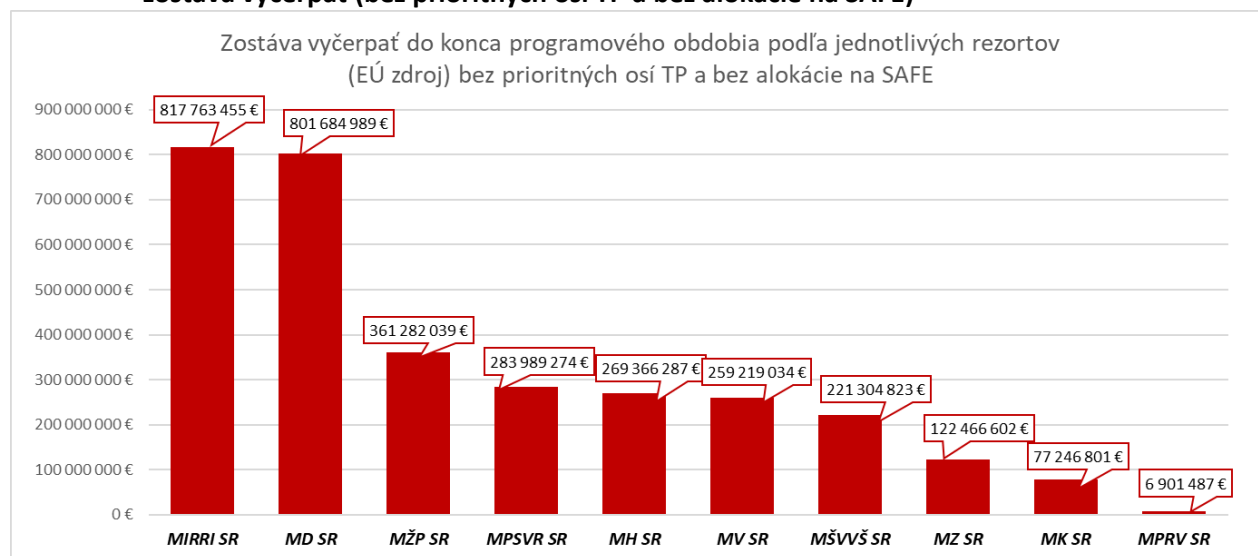

Do konca programového obdobia zostáva rezortom vyčerpať ešte **3,22 mld. EUR** (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE).

Najviac zostáva vyčerpať (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE) za rezorty:

- **MIRRI SR (817,76 mil. EUR)**, čo predstavuje 38,98 % alokácie,
- **MD SR (801,68 mil. EUR)**, čo predstavuje 25,81 % alokácie,
- **MŽP SR (361,28 mil. EUR)**, čo predstavuje 26,54 % alokácie.

2. Využitie nových iniciatív Európskej komisie – stav k 31.05.2023

2.1 Implementácia opatrení na eliminovanie dopadov pandémie COVID-19

Na zabezpečenie financovania výdavkov súvisiacich s pandemiou COVID-19 Európska komisia spracovala dva balíky legislatívnych opatrení, tzv. Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) z 30.03.2020 a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) z 23.04.2020. MIRR SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandemiou koronavírusu COVID-19, vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandemiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov** a v tejto súvislosti **naplánovalo realokáciu 1,25 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF. Na základe negociácií s EK bol objem finančných prostriedkov znížený na **1,105 mld. EUR**.

Uznesením vlády SR č. 257/2020 z 28.04.2020 bol schválený materiál *“Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandemiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov”*, ktorý vo významnej miere prispel k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a k jej opätovnému naštartovaniu.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP ĽZ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP ĽZ)**

Z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,338 mld. EUR (121,09 %), zazmluvnených 1,280 mld. EUR (115,81 %) a vyčerpaných 1,038 mld. EUR (93,97 %).

Tabuľka č.5: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 31.05.2023

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Fond	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Podpora udržania zamestnanosti	OP IZ	ESF	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	405 949 429	98,95%	405 949 429	98,95%
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	EFRR	117 300 000	6	131 866 238	112,42%	84	112 678 009	96,06%	60 436 970	51,52%
	OPII	EFRR	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	33	97 255 618	111,79%	43 113 227	49,56%
	Celkom:	EFRR	204 300 000	9	238 806 238	116,89%	117	209 933 627	102,76%	103 550 197	50,69%
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	EFRR	330 200 000	1	480 323 000	145,46%	3	480 323 000	145,46%	379 155 250	114,83%
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	EFRR	51 000 000	1	62 937 210	123,41%	4	56 566 474	110,91%	53 447 486	104,80%
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP IZ	ESF	109 300 000	5	95 772 496	87,62%	5	127 016 977	116,21%	96 339 832	88,14%
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)			1 105 062 575	18	1 338 101 520	121,09%	131	1 279 789 507	115,81%	1 038 442 194	93,97%
z toho EFRR			585 500 000	11	782 066 448	133,57%	124	746 823 101	127,55%	536 152 933	91,57%
z toho ESF			519 562 575	7	556 035 072	107,02%	7	532 966 406	102,58%	502 289 261	96,68%
Ostatné opatrenia	PRV	EPFRV		1	14 780 000		166	2 717 273		2 683 143	
	OP IZ	ESF		3	41 243 563		3	34 871 644		18 684 662	
	OP II	EFRR		4	113 640 340		4	84 378 240		19 380 069	
	IROP	EFRR		1	3 000 000		2	400 000		0	
	Celkom:			9	172 663 903		175	122 367 158		40 747 874	
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)			1 105 062 575	27	1 510 765 423	136,71%	306	1 402 156 665	126,88%	1 079 190 068	97,66%
z toho EFRR				16	898 706 788	153,49%	130	831 601 341	142,03%	555 533 002	94,88%
z toho ESF				10	597 278 635	114,96%	10	567 838 051	109,29%	520 973 923	100,27%
z toho EPFRV				1	14 780 000		166	2 717 273		2 683 143	

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.06.2023 o 7:00hod.), RO OP IZ a PRV

2.2 Implementácia REACT-EU

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je **3. balíček podpory EK – REACT-EU v celkovej hodnote 745,18 mil. EUR**, o ktorú sa navýšila finančná obálka programového obdobia 2014 – 2020 (odhadovaná suma v júli 2020 bola vyššia - cca 780 mil. EUR). Zdroje sa členskými krajinami prideliť v dvoch fázach. V prvej fáze v roku 2021 bola SR v zmysle **Vykonávacieho rozhodnutia EK z 12.02.2021** pridelená suma **616 mil. EUR**. V druhej fáze bola SR v zmysle **Vykonávacieho rozhodnutia EK z 23.11.2021** pridelená suma **129 mil. EUR** (oproti pôvodne odhadovaným 164 mil. EUR). V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí 23.09.2020, ako aj na základe následných negociácií s Európskou komisiou a riadiacimi orgánmi, je podpora z REACT-EU zameraná najmä na:

v rámci OP IZ:

- ✓ zabezpečenie aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest,
- ✓ poskytovanie sociálnych služieb občanom vrátane terénnej práce a komunitnej starostlivosti,
- ✓ zvyšovanie odolnosti zdravotníckeho systému,
- ✓ podporu dištančného vzdelávania na školách

v rámci IROP:

- ✓ pomoc regiónom pri financovaní zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra),
- ✓ zatepľovanie bytových domov,
- ✓ zvýšenie kapacít základných škôl,
- ✓ zvýšenie kvality odborného vzdelávania

v rámci OP EVS:

- ✓ finančná podpora zamestnancov v prvej línii ako sú zdravotníci, policajti a hasiči

v rámci OP FEAD:

- ✓ distribúcia potravinových balíčkov na pomoc najodkázanejším osobám.

Z dostupnej alokácie 722,25 mil. EUR bolo vo výzvach a výzvaniach REACT-EU sprístupnených 818,39 mil. EUR (113,31 %), zazmluvnených 707,80 mil. EUR (98,00 %) a vyčerpaných 333,77 mil. EUR (46,21 %).

Tabuľka č. 6: Prehľad implementácie REACT-EU k 31.05.2023

Operačný program		Rezort	Fond	Alokácia REACT-EU (navýšenie k 08.07.2022)	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie	
				EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Operačný program Ľudské zdroje	bez TP	MŠVVŠ SR	ESF	26 266 591	2	26 269 197	100,01%	2	26 266 591	100,00%	2 456 846	9,35%
		MPSVR SR		326 081 537	14	365 028 708	111,94%	848	315 287 853	96,69%	156 237 546	47,91%
		MV SR		19 100 000	2	25 192 000	131,90%	215	18 117 266	94,85%	13 278 048	69,52%
		OP IZ bez TP:		371 448 128	18	416 489 905	112,13%	1 065	359 671 709	96,83%	171 972 440	46,30%
	TP	MPSVR SR		11 046 495	1	11 046 495	100,00%	1	11 045 951	100,00%	7 366 051	66,68%
		MV SR		796 030	1	796 030	100,00%	1	795 678	99,96%	479 291	60,21%
		TP OP IZ		11 842 525	2	11 842 525	100,00%	2	11 841 629	99,99%	7 845 341	66,25%
	Celkom	MŠVVŠ SR		26 266 591	2	26 269 197	100,01%	2	26 266 591	100,00%	2 456 846	9,35%
		MPSVR SR		337 128 032	15	376 075 203	111,55%	849	326 333 804	96,80%	163 603 597	48,53%
		MV SR		19 896 030	3	25 988 030	130,62%	216	18 912 943	95,06%	13 757 339	69,15%
		Spolu		383 290 653	20	428 332 430	111,75%	1 067	371 513 338	96,93%	179 817 782	46,91%
Integrovaný regionálny operačný program	bez TP	MIRRI SR	EFRR	213 632 384	12	256 151 406	119,90%	253	223 719 339	104,72%	67 943 578	31,80%
		MK SR		14 850 600	1	21 842 816	147,08%	150	21 844 722	147,10%	210 903	1,42%
		IROP bez TP:		228 482 984	13	277 994 222	121,67%	403	245 564 060	107,48%	68 154 481	29,83%
	TP	MIRRI SR		7 300 000	6	7 523 702	103,06%	28	6 797 604	93,12%	1 879 413	25,75%
	Celkom	MIRRI SR		220 932 384	18	263 675 108	119,35%	281	230 516 943	104,34%	69 822 990	31,60%
		MK SR		14 850 600	1	21 842 816	147,08%	150	21 844 722	147,10%	210 903	1,42%
		Spolu		235 782 984	19	285 517 924	121,09%	431	252 361 665	107,03%	70 033 893	29,70%
Operačný program Efektívna verejná správa		MV SR	ESF	103 178 940	2	104 541 649	101,32%	1	83 921 649	81,34%	83 921 649	81,34%
REACT-EU celkom bez TP				703 110 052	33	799 025 776	113,64%	1 469	689 157 418	98,02%	324 048 570	46,09%
TP REACT-EU:				19 142 525	8	19 366 227	101,17%	30	18 639 233	97,37%	9 724 754	50,80%
REACT-EU Celkom:				722 252 577	41	818 392 003	113,31%	1 499	707 796 651	98,00%	333 773 324	46,21%
z toho EFRR - REACT-EU				235 782 984	19	285 517 924	121,09%	431	252 361 665	107,03%	70 033 893	29,70%
z toho ESF - REACT-EU				486 469 593	22	532 874 079	109,54%	1 068	455 434 987	93,62%	263 739 431	54,21%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.06.2023 o 7:00 hod.), MF SR

2.3 Implementácia FAST-CARE

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. SR plánuje využiť disponibilné zdroje EŠIF v objeme **315,26 mil. EUR** v rámci **3 operačných programov**:

Integrovaný regionálny operačný program (alokácia 244,01 mil. EUR)

- ✓ financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov
- ✓ refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s poskytovaním pomoci utečencom
- ✓ **revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou**

OP Ľudské zdroje (alokácia 41,25 mil. EUR)

- ✓ podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce a poskytovanie sociálnych služieb
- ✓ **revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou**

OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR)

- ✓ podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pomoci pri zmierňovaní dopadov migračnej krízy
- ✓ poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok pre žiakov na nákup IT techniky
- ✓ **revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou**

Z dostupnej alokácie 315,26 mil. EUR bolo vo výzvach a výzvaniach FAST-CARE sprístupnených 317,56 mil. EUR (100,73 %), zazmluvnených 14,18 mil. EUR (4,50 %) a vyplatených 192,34 tis. EUR (0,06 %).

➤ Implementované v rámci OP Ľudské zdroje

1. **NP „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“ (ÚPSVR)** s alokáciou **3,44 mil. EUR** – výzvanie bolo **vyhlásené 02.02.2023**, **ŽoNFP** bola predložená **14.02.2023** a schválená **21.03.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 18.04.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **3,44 mil. EUR** za **EÚ zdroj**.
2. **NP „Pomáhame odídencom – poradenstvo“ (ÚPSVR)** zameraný na začlenenie a integráciu na trh práce prostredníctvom poskytovania poradenských služieb s **alokáciou 5,67 mil. EUR** – výzvanie bolo **vyhlásené 02.02.2023**, **ŽoNFP** bola predložená **02.02.2023** a schválená **22.03.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 15.04.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **5,67 mil. EUR** za **EÚ zdroj**. Z tejto sumy bolo už vyplatených **192 347 EUR**.
3. **NP „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“ (MPSVR SR)** zameraný na aktívne začlenenie odídencom z Ukrajiny do slovenskej spoločnosti s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie ich zamestnateľnosti s **alokáciou 849 000 EUR** – výzvanie bolo **vyhlásené 08.02.2023**, **ŽoNFP** vo výške **769 927** bola predložená **21.03.2023**.
4. **NP „Pomáhame odídencom“ (ÚPSVR)** zameraný na poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávanie, podporu mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie odídencom z Ukrajiny s alokáciou po navýšení **8,28 mil. EUR** – výzvanie bolo **vyhlásené 08.02.2023**, **ŽoNFP** bola

predložená **13.02.2023** a schválená **22.03.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **15.04.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **5,06 mil. EUR** za **EÚ zdroj**.

5. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ zameraný na poradenstvo zo strany mimovládnych organizácií, týkajúce sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti a zabezpečovanie rôznych aktivít a programov **s alokáciou 13 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 27.03.2023**, **ŽoNFP** bola predložená **31.03.2023** a schválená **03.05.2023**.
6. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“ - zameraný na poskytovanie finančných prostriedkov pre samosprávy na zrealizované humanitárne a integračné aktivity v prospech odídencom z Ukrajiny **s alokáciou 12,69 mil. EUR** – vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023, **ŽoNFP** bola predložená **27.04.2023** a schválená **24.05.2023**.

➤ Implementované v rámci **Integrovaného regionálneho OP**

1. Výzva „Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine“ určená **pre 1 463 miest a obcí** a zameraná na refundáciu zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s indikatívnou alokáciou **126,92 mil. EUR** bola **vyhlásená 14.03.2023**. Na túto výzvu bolo prijatých **1 409 ŽoNFP** v sume NFP **125,93 mil. EUR**, z toho je schválených 642 ŽoNFP v objeme 90 mil. EUR. 40 zmlúv v objeme 43 mil. EUR bolo odoslaných na podpis prijímateľom.
2. NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ zameraný na zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky s indikatívnou alokáciou **117,10 mil. EUR**. Vyzvanie na NP bolo vyhlásené 27.04.2023, **ŽoNFP** bola predložená **09.05.2023**.

➤ Implementované v rámci **OP Integrovaná infraštruktúra**

1. NP „Digitálny príspevok pre žiakov UA“ zameraný na zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov utekajúcich z Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia s indikatívnou alokáciou **8,61 mil. EUR**. Vyzvanie na NP bolo **vyhlásené 27.04.2023**. **ŽoNFP** bola predložená **28.05.2023**.
2. NP „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ zameraný na podporu odborných kapacít poskytujúcich odborné služby osobám utekajúcim z Ukrajiny s indikatívnou alokáciou **21,00 mil. EUR**. Vyzvanie na NP bolo vyhlásené 27.04.2023, **ŽoNFP** bola predložená **02.05.2023** a schválená **18.05.2023**.

Tabuľka č. 7: Prehľad implementácie FAST-CARE k 31.05.2023

Operačný program	Rezort	Fond	Alokácia		Platné výzvy/vyzvania - alokácia		Kontrahovanie			Čerpanie	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	ESF	11 245 000	2	13 956 535	124,11%	2	10 735 754	95,47%	192 347	1,71%
		EFRR	30 000 000	4	29 983 763	99,95%	1	3 443 573	11,48%	0	0,00%
			41 245 000	6	43 940 298	106,53%	3	14 179 327	34,38%	192 347	0,47%
OP Integrovaná infraštruktúra	MIRRI SR	EFRR	30 000 000	2	29 610 000	98,70%			0,00%		0,00%
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	EFRR	244 014 456	2	244 014 456	100,00%			0,00%		0,00%
Celkom			315 259 456	10	317 564 754	100,73%	3	14 179 327	4,50%	192 347	0,06%
z toho EFRR			304 014 456	8	303 608 219	99,87%	1	3 443 573	1,13%	0	0,00%
z toho ESF			11 245 000	2	13 956 535	124,11%	2	10 735 754	95,47%	192 347	1,71%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.06.2023 o 7:00 hod), MF SR

2.4 Implementácia SAFE

Na riešenie problémov spojených s extrémnym nárastom cien energií prijala EK **iniciatívu SAFE** (schválená Nariadením EP a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023). EK umožňuje poskytnúť **pomoc pri úhrade nákladov na spotrebu energie v prípade zraniteľných domácností** a využiť tak zostávajúce nevyčerpané zdroje EŠIF.

Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými cenami a regulovanými cenami pri dodávkach plynu zraniteľným domácnostiam prostredníctvom Iniciatívy SAFE bola vypracovaná v spolupráci MIRRI SR, MF SR, MPSVR SR a MH SR a po konzultácii s Orgánom auditu 05.05.2023 bola oficiálne predložená EK. **EK zaslala 24.05.2023 MIRRI SR stanovisko, že súhlasí s predloženou metodikou.** Metodika bude formálne vydaná po aktualizácii štatistických údajov zo zisťovania Rodinné účty za r. 2022.

Alokácie na energokrízu boli aktualizované zo strany dotknutých RO a RO OP II, RO OP KŽP a RO IROP avizujú aktuálne vyčleniť 1,04 mld. EUR. Legislatíva EK umožňuje presunúť nevyčerpané zdroje až do výšky **1,45 mld. EUR**, čo v prípade potreby vytvára priestor presunúť ešte dodatočných 410 mil. EUR.

Po zohľadnení presunov finančných prostriedkov na energokrízu (1,04 mld. EUR) predstavuje suma, ktorú je potrebné vyčerpať **3,25 mld. EUR** (t. j. 22 % z alokácie EŠIF). Objem fin. prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať po zohľadnení presunu časti finančných prostriedkov na energokrízu za jednotlivé OP je nasledovný:

Tabuľka č. 8: Prehľad realokácií na energokrízu

Operačný program	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (alokácia - čerpanie)	Plánovaná realokácia na energokrízu	Zostáva vyčerpať po realokácii na energokrízu
OP Integrovaná infraštruktúra	1 918 933 936	574 818 551	1 344 115 385
OP Kvalita životného prostredia	969 350 871	387 885 361	581 465 510
Integrovaný regionálny OP	798 149 036	76 366 735	721 782 301
OP Ľudské zdroje	486 120 997	-	486 120 997
OP Efektívna verejná správa	62 089 692		62 089 692
PS Interreg V-A SK-AT	21 814 301		21 814 301
PS Interreg V-A SK-CZ	20 462 206		20 462 206
OP Technická pomoc	6 724 178		6 724 178
OP Rybné hospodárstvo	6 903 403		6 903 403
Program spolupráce INTERACT III	277 213		277 213
EŠIF bez PRV:	4 290 825 833	1 039 070 647	3 251 755 186

Aktuálne prebieha pod koordináciou MIRRI SR príprava revízií 3 OP, z ktorých sú vyčleňované zdroje na SAFE. 30.03.2023 bola monitorovacím výborom schválená revízia OP KŽP, 29.05.2023 revízia OP II. Predpoklad predloženia revízie IROP na rokovanie monitorovacím výborom je v priebehu júna. Cieľom je **predložiť revízie OP na schválenie EK do konca júna 2023** (s výnimkou OP KŽP, kde je potrebné počkať na ukončenie procesu SEA). Podľa vyjadrenia EK je potrebné revízie OP v súvislosti s iniciatívou SAFE predložiť na schválenie EK najneskôr 30.09.2023.

3. Plány čerpania na roky 2023 a 2024 podľa rezortov

Jednotlivé RO a SO v januári 2023 zaslali plán mesačného kontrahovania a čerpania na roky 2023 až 2024 (t.j. do konca programového obdobia) po jednotlivých prioritných osiach (a gestoroch).

Tabuľka č. 7 sumarizuje plány čerpania jednotlivých rezortov na roky 2023 – 2024.

V zmysle usmernenia MF SR k ukončeniu programového obdobia 2014 – 2020 „Prijímateľ môže uhradiť výdavky v období oprávnenosti, a to najneskôr do 31. decembra 2023. Riadiaci orgán pristúpi k úprave termínov spracovania žiadostí o platbu prijímateľa tak, aby boli zaradené do poslednej súhrnnej žiadosti o platbu a predložené certifikačnému orgánu najneskôr v druhom marcovom termíne v roku 2024.“

- Plán čerpania v roku 2023 je na úrovni 3,17 mld. EUR.
- Plán čerpania v roku 2024 (do marca) je na úrovni 924,61 mil. EUR.
- Plán čerpania SAFE je spolu 1,04 mld. EUR.

Tabuľka č. 9: Plán čerpania jednotlivých rezortov na roky 2023 a 2024 (bez prioritných osí technickej pomoci)

Rezort	Program	Prioritná os/SO	Alokácia (EÚ zdroj)	čerpanie k 31.12.2022	plán čerpania v roku 2023	plán čerpania v roku 2024 (do marca)	plán čerpania spolu 2023+2024
			EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
			A	B	C	D	E=C+D
MŠVVŠ SR	OP IZ	SO - MŠVVŠ SR (PO1+PO8)	373 762 595	269 500 453	97 825 895	3 484 513	101 310 409
	OP II	SO - MŠVVŠ SR (PO9+PO10)	460 695 500	262 805 431	189 315 705	22 580 071	211 895 776
		MŠVVŠ SR celkom (bez TP)	834 458 095	532 305 884	287 141 601	26 064 584	313 206 185
MV SR	OP IZ	SO - MV SR (PO5+PO6+PO8)	371 762 462	215 432 829	113 259 245	31 000 000	144 259 245
	OP KŽP	SO - MV SR (PO3)	191 546 962	151 927 006	28 668 168	10 951 788	39 619 956
	OP EVS	RO - MV SR (bez TP)	341 517 465	273 990 968	46 996 574	19 924 241	66 920 815
		MV SR celkom (bez TP)	904 826 889	641 350 803	188 923 987	61 876 029	250 800 016
MH SR	OP II	SO - MH SR (PO9+PO10+PO11+PO12)	1 254 806 311	1 134 380 304	287 515 177	89 536 691	377 051 867
	OP KŽP	SO - MH SR (PO4)	814 881 886	596 880 235	200 044 124	17 957 526	218 001 651
		MH SR celkom (bez TP)	2 069 688 197	1 731 260 539	487 559 301	107 494 217	595 053 518
MIRRI SR	OP II	SO - MIRRI SR (PO7)	456 940 302	155 860 406	232 258 739	73 643 866	305 902 605
	IROP	RO - MIRRI SR vrátane 7 VUC a 8 KM ako SO (PO1+PO2+PO4+PO6)	1 359 642 252	756 069 887	523 798 994	79 773 371	603 572 365
	SAFE IROP		76 366 735	0	76 366 735	0	76 366 735
	OP TP	RO - MIRRI SR	159 071 912	148 449 117	7 585 356	3 037 439	10 622 795
	SK-CZ	RO - MIRRI SR (bez TP)	84 731 096	58 635 509	16 138 447	9 957 140	26 095 587
	SK-AT	RO - MIRRI SR (bez TP)	71 339 121	45 320 667	11 597 170	14 421 284	26 018 454
		MIRRI SR celkom (bez TP)	2 208 091 418	1 164 335 586	867 745 442	180 833 099	1 048 578 540
MD SR	OP II	RO - MD SR (PO1+PO2+PO3+PO4+PO5+PO6)	3 105 676 947	2 125 283 834	764 338 664	215 527 168	979 865 832
	SAFE OP II	SAFE OP II	574 818 551	0	250 000 000	324 818 551	574 818 551
		MD SR celkom (bez TP)	3 680 495 498	2 125 283 834	1 014 338 664	540 345 719	1 554 684 383
MPSVR SR	OP IZ	RO - MPSVR SR (PO2+PO3+PO4+PO8+PO10+PO11+PO12)	2 160 489 587	1 802 601 184	273 152 114	95 139 149	368 291 263
		MPSVR SR celkom (bez TP)	2 160 489 587	1 802 601 184	273 152 114	95 139 149	368 291 263
MŽP SR	OP KŽP	RO - MŽP SR (PO1+PO2+PO3+PO6)	1 361 217 081	970 402 668	247 133 567	143 680 846	390 814 413
	SAFE KŽP	SAFE KŽP	387 885 361	0	108 124 642	279 760 719	387 885 361
		MŽP SR celkom (bez TP)	1 749 102 442	970 402 668	355 258 209	423 441 566	778 699 774
MPRV SR	OP RH	RO - MPRV SR (bez TP)	8 583 034	1 681 547	893 846	0	893 846
		MPRV SR celkom (bez TP)	8 583 034	1 681 547	893 846	0	893 846
MZ SR	IROP	SO - Ministerstvo zdravotníctva SR (PO2)	340 477 489	200 813 029	82 672 593	56 991 867	139 664 460
		MZ SR celkom (bez TP)	340 477 489	200 813 029	82 672 593	56 991 867	139 664 460
MK SR	IROP	SO - Ministerstvo kultúry SR (PO3+PO7)	89 938 286	25 245 403	49 811 871	37 006 871	86 818 742
		MK SR celkom (bez TP)	89 938 286	25 245 403	49 811 871	37 006 871	86 818 742
SAFE spolu			1 039 070 647	0	434 491 377	604 579 270	1 039 070 647
EŠIF	EŠIF celkom (bez TP, bez SAFE)		14 046 150 935	9 195 280 477	3 173 006 249	924 613 831	4 097 620 080
	EŠIF celkom (bez TP)		14 046 150 935	9 195 280 477	3 607 497 626	1 529 193 101	5 136 690 727

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), RO/SO, Certifikačný orgán (MF SR)

Plán čerpania za celý EŠIF na rok 2023 je vo výške 3 173 006 249 EUR.

Plnenie plánu čerpania za EŠIF k 31.05.2023 je nasledovné:

- skutočné čerpanie v roku 2023 je **609,65 mil. EUR**, t. j. **19,21 %** z ročného plánu
- **plán čerpania za prvých päť mesiacov 2023 bol vo výške 731,35 mil. EUR**
- plnenie plánu čerpania **za prvých päť mesiacov 2023** bolo vo výške **83,36 %**
- **plnenie** kumulatívneho plánu čerpania za celý EŠIF bolo **k 31.05.2023 nižšie** oproti plánu o **121,70 mil. EUR.**

Z pohľadu plnenia **ročného plánu čerpania od 01.01.2023 do 31.12.2023** si podľa rezortov **do 31.05.2023** najlepšie/najhoršie viedli v plnení ročného plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MŠVVŠ SR	32,70 %
2. MPSVR SR	28,75 %
3. MD SR	23,38 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	0,00 %
2. MH SR	8,41 %
3. MK SR	11,97 %

Z pohľadu plnenia **plánu čerpania od 01.01.2023 do 31.05.2023** si podľa rezortov **k 31.05.2023** najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania za týchto päť mesiacov nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MZ SR	140,29 %
2. MD SR	102,14 %
3. MIRRI SR	101,11 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	0,00 %
2. MH SR	39,98 %
3. MK SR	54,07 %

Príloha č. 1: Stav implementácie EŠIF podľa prioritných osí OP (k 31.05.2023, so zohľadnením SAFE presunov) - semafor

Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		MATEMATICKY Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKY Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj		Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MŠVVŠ SR	ESF	347 496 004		374 519 551	107,78%	-27 023 547		308 272 782	88,71%	39 223 222
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MPSVR SR	ESF+IZM	172 270 942		195 691 668	113,60%	-23 420 726		166 769 091	96,81%	5 501 851
	PO 3 - Zamestnanosť	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MPSVR SR	ESF	1 326 222 796		1 362 487 922	102,73%	-36 265 126		1 269 482 599	95,72%	56 740 197
	PO 4 - Sociálne začlenenie	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MPSVR SR	ESF	294 669 312		348 675 288	118,33%	-54 005 976		284 272 979	96,47%	10 396 333
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MV SR	ESF	161 954 885		162 732 607	100,48%	-777 722		140 553 486	86,79%	21 401 399
	PO 6 - Technická vybavenosť v obciach s príľomnosťou MRK	●	obmedzený presun alokácie do inej PO; veľa malých infraštruktúrnych projektov v obciach s MRK, v rámci ktorých je vysoká chybovosť VO a problém s navýšením cien stavebných materiálov; mimoriadna ukončovanie projektov (EK odmieta presun na SAFE, čo by znížilo riziko dekomitmentu) – uvedené môže byť čiastočne riešené prostredníctvom finančných nástrojov implementovaných SIH cez projekt DoDo do výšky 25 mil. EUR, za predpokladu súhlasného stanoviska SIH a spoločnosti Dostupný Domov j.s.a	SO: MV SR	EFRR	190 707 577		188 424 607	98,80%	2 282 970		81 702 321	42,84%	109 005 256
	PO 7 - Technická pomoc	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000		79 011 978	100,52%	-411 978		78 764 328	100,21%	-164 328
	PO 8 - REACT-EU	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	371 448 128		359 671 709	96,83%	11 776 419		172 215 366	46,36%	199 232 762
	PO 9 - Technická pomoc REACT-EU	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525		11 841 629	99,99%	896		8 110 874	68,49%	3 731 651
	PO 10 - CARE - ESF	●	refundácia výdavkov na pomoc utečencom pre MPSVR SR, ÚPSVR, NGO a samosprávu	RO: MPSVR SR	ESF	11 245 000		10 735 754	95,47%	509 246		192 347	1,71%	11 052 653
	PO 11 - CARE - EFRR	●	refundácia výdavkov na pomoc utečencom pre MPSVR SR, ÚPSVR, NGO a samosprávu	RO: MPSVR SR	EFRR	30 000 000		3 443 573	11,48%	26 556 427		0	0,00%	30 000 000
CELKOM OP LZ						2 996 457 169		3 097 236 284	103,36%	-100 779 115	43 658 794	2 510 336 172	83,78%	486 120 997
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (po zohľadnení SAFE a vnútorných presunov medzi PO revízia 16.0 v príprave)		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKY Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj		Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	●	zazmluvnené projekty v realizácii, zásobníky projektov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	KF	775 839 166		984 561 147	126,90%	-208 721 981		651 403 633	83,96%	124 435 533
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	●	zazmluvnené projekty v realizácii, zásobníky projektov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	KF	1 052 500 000		1 144 218 922	108,71%	-91 718 922		970 204 863	92,18%	82 295 137
	PO 3 - Verejná osobná doprava	●	zazmluvnené projekty v realizácii (plánované dodávky električiek a trolejbusov pre BA, refundácia výdavkov na VP Električka do Petržalky), zásobníky projektov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	KF	399 337 000		474 266 378	118,76%	-74 929 378		220 816 919	55,30%	178 520 081
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	●	nedávno zazmluvnené projekty v realizácii, v rámci ktorých sa budú refundovať už zrealizované aktivity (modernizácia plaveb. komôr v Gabčíkove a rehabilitačné opatrenia na Dunaji); zásobníky projektov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	KF	39 463 000		51 422 747	130,31%	-11 959 747		3 100 408	7,86%	36 362 592
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	●	zazmluvnené projekty v realizácii, zásobníky projektov, skokové čerpanie sa očakáva v roku 2023 po dodávkach vozňov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	EFRR	343 951 749		351 122 085	102,08%	-7 170 336		159 651 947	46,42%	184 299 802
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	●	zazmluvnené projekty v realizácii, zásobníky projektov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	EFRR	494 586 032		687 654 925	139,04%	-193 068 893		298 814 187	60,42%	195 771 845
	PO 7 - Informačná spoločnosť	●	pomalá a meškajúca implementácia projektov na strane prijímateľov, suma, ktorú je potrebné vyčerpať, prevyšuje doterajšie čerpanie	SO: MIRRI SR	EFRR	426 940 302		658 567 081	154,25%	-231 626 779		201 553 964	47,21%	225 386 338
	PO 8 - Technická pomoc	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MD SR	EFRR	86 915 000		83 752 138	96,36%	3 162 862		72 560 134	83,48%	14 354 866
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	●	riziková realizácia projektov biobanky – problémy so stavbou; ostáva vyčerpať ešte 21,5 mil. EUR (82 %), pripravuje sa fázaovanie oboch projektov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	776 862 395		945 598 081	121,72%	-168 735 686		653 697 513	84,15%	123 164 882
	PO 10 - Podpora výskum, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	●	riziková realizácia veľkého projektu ACCORD v gescii MŠVVŠ SR – ostáva vyčerpať ešte 26,8 mil. EUR (48 %) a aktuálne je prešetrovaná kauza prijatia úplatku koordinátorom projektu na UK (pozastavené platby zo strany EK), MŠVVŠ zároveň rieši s EK možné navýšenie alokácie z dôvodu navýšenia cien – projekt má byť ukončený do 2023; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	106 915 015		106 558 286	99,67%	356 729		75 039 861	70,19%	31 875 154
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	●	čerpanie finančných nástrojov antikrizová záruka	SO: MH SR	EFRR	723 537 672		725 377 766	100,25%	-1 840 094		599 201 595	82,82%	124 336 077
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	●	čerpanie finančných nástrojov antikrizová záruka	SO: MH SR	EFRR	108 186 729		104 534 753	96,62%	3 651 976		117 444 899	108,56%	-9 258 170
	PO 13 - Technická pomoc Val	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	70 085 000		67 496 384	96,31%	2 588 616		67 513 751	96,33%	2 571 249
	PO 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE)	●	- refundácia miezd zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pri pomoci pri zmierňovaní dopadov migračnej krízy - poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukázok pre žiakov na nákup IT techniky	SO: MIRRI SR	EFRR	30 000 000		0	0,00%	30 000 000		0	0,00%	30 000 000
	PO 15 - SAFE	●	refundácia výdavkov ŠR na kompenzáciu cien energií	RO: MD SR		574 818 551		0	0,00%	574 818 551		0	0,00%	574 818 551
CELKOM OP II						6 009 937 611		6 385 130 693	106,24%	-375 193 082	14 596 360	4 091 003 675	68,07%	1 918 933 936
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKY Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj		Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	●	nie je možný presun alokácie do inej PO s absorpčnou kapacitou (EFRR); implementácia je postavená na veľkom množstve menších investičných projektov, ktorú sú ovplyvnené COVIDom a nárastom cien stavebných materiálov; problémová implementácia projektov rezortných organizácií; dlhotrvajúci proces VO	SO: SAŽP	KF	1 212 742 900		1 330 471 539	109,71%	-117 728 639		915 440 882	75,49%	297 302 018
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	●	nie je možný presun alokácie do inej PO s absorpčnou kapacitou (EFRR); implementácia je postavená na veľkom množstve menších investičných projektov, ktorú sú ovplyvnené COVIDom a nárastom cien stavebných materiálov; problémy v procese prípravy projektov (vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov); problémová implementácia projektov rezortných organizácií; dlhotrvajúci proces VO	SO: SAŽP	KF	123 234 000		154 949 724	125,74%	-31 715 724		73 803 921	59,89%	49 430 079
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	●	zazmluvnené projekty v realizácii; možnosť presunu alokácie do PO 4 a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216		213 105 285	87,38%	30 790 931		166 191 570	68,14%	77 704 646
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	●	zazmluvnené projekty v realizácii (NP Zelená domácnosti); veľká absorpčná kapacita, možnosť presunu alokácie z PO 3 a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: SIEA	EFRR	787 772 813		795 838 189	101,02%	-8 065 376		630 185 743	80,00%	157 587 070
	PO 5 - Technická pomoc	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	SO: SAŽP, MV SR, SIEA, RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000		75 563 472	98,13%	1 436 528		77 558 303	100,73%	-558 303
	PO 6 - Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE	●	refundácia výdavkov ŠR na kompenzáciu cien energií	SO: SAŽP	KF	387 885 361		0	0,00%	387 885 361		0	0,00%	387 885 361
CELKOM OP KŽP:						2 832 531 290		2 569 928 209	90,73%	262 603 081	262 603 081	1 863 180 419	65,78%	969 350 871

Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj			EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch		zazmluvnené projekty v realizácii	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	281 428 710	533 831 452	189,69%	-252 402 742			205 181 684	72,91%	76 247 026
	PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám		zazmluvnené projekty v realizácii; NP na refundáciu vakcín vo výške 26 mil. EUR	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	646 726 551	718 231 632	111,06%	-71 505 081			490 740 311	75,88%	155 986 240
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch		veľa projektov s veľkým počtom VO - neukončené kontroly VO a zmenové konania – zmeny v projektoch v enormných objemoch kvôli cenám a nedostupnosti viacerých tovarov na trhu, nezáujem prijímateľov pokračovať v projekte po skončení kovidovej doby, vysoký počet mimoriadnych ukončení projektov v REACT-EU a to najmä z dôvodu vysokej chybovosti vo VO a ďalej sa očakáva rozsiahle mimoriadne ukončovanie už zazmluvnených projektov zo strany prijímateľov, otvorenie zásobníka projektov a prístupenie k nadkontrahovaniu	SO: MK SR	EFRR	93 390 012	103 715 926	111,06%	-10 325 914			30 789 404	32,97%	62 600 608
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP		zazmluvnené projekty v realizácii	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	301 028 764	332 509 920	110,46%	-31 481 156			252 528 546	83,89%	48 500 218
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou		množstvo malých projektov, problémy s VO, niektoré sú ešte len v posudzovaní/ opatrením je nadkontrahovanie a realokácie a využitie 15 % flexibility medzi PO	RO: MIRRI SR	EFRR	71 353 285	82 402 551	115,49%	-11 049 266			29 162 444	40,87%	42 190 841
	PO 6 - Technická pomoc		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	62 333 950	100,54%	-333 950			59 752 051	96,37%	2 247 949
	PO 7 - REACT-EU		dodatčný balík, ktorý bol zazmluvnený v projektoch len koncom roka 2022 - ide o projekty realizované v roku 2023/opatrením je nadkontrahovanie	RO: MIRRI SR SO: MK SR	EFRR REACT-EU	152 116 249	245 564 512	161,43%	-93 448 263			67 541 883	44,40%	84 574 366
	PO 8 - Technická pomoc REACT-EU		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MIRRI SR	EFRR REACT-EU	7 300 000	6 797 153	93,11%	502 847			1 879 405	25,75%	5 420 595
	PO 9 - FAST CARE		refundácia výdavkov na pomoc utečencom pre štátnu správu a samosprávu/administratívne náročná implementácia cca 1500 projektov	RO: MIRRI SR	EFRR	244 014 456	0	0,00%	244 014 456			0	0,00%	244 014 456
	PO 10 - SAFE REACT EU		refundácia výdavkov SR na kompenzáciu cien energií/ revízia OP v procese aj s prípravou NP	RO: MIRRI SR		76 366 735	0	0,00%	76 366 735			0	0,00%	76 366 735
	CELKOM IROP:					1 935 724 762	2 085 387 096	107,73%	-149 662 334	14 160 394	1 137 575 726	58,77%	798 149 036	
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)	
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj	
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS		zazmluvnené projekty v realizácii, prevažne národné projekty ÚOŠS, ale aj DOP pre VÚC/mestá/obce	RO: MV SR	ESF	200 892 184	217 584 872	108,31%	-16 692 688			169 153 060	84,20%	31 739 124
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva		ešte nenakontrahovaná celá alokácia - v príprave ešte zazmluvnenie 1 NP vo výške 6,24 mil. EUR (vyhlásené vyzvanie)	RO: MV SR	ESF	37 446 341	30 682 213	81,94%	6 764 128			27 976 732	74,71%	9 469 609
	PO 3 - Technická pomoc		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MV SR	ESF	13 137 972	12 559 636	95,60%	578 336			11 514 304	87,64%	1 623 668
	PO 4 - REACT EU		v príprave ešte zazmluvnenie 1 NP na 2. tranžu REACT-EU vo výške 19,25 mil. EUR, ktorým sa budú refundovať mzdy zamestnancov MV SR (vyzvanie je v príprave)	RO: MV SR	ESF REACT-EU	103 178 940	83 921 649	81,34%	19 257 291			83 921 649	81,34%	19 257 291
	CELKOM OP EVS:					354 655 437	344 748 369	97,21%	9 907 068	19 576 286	292 565 745	82,49%	62 089 692	
	Program	Priorita Únie	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach		ukončené prijímanie ŽoNFP, aktuálne sa vyhodnocuje 10 prijatých ŽoNFP s potenciálnym čerpaním vo výške 1,46 mil. EUR + dočerpanie realizovaných projektov už len vo výške cca 150 tis. EUR	RO: MPRV SR	ENFR	5 321 319	1 529 845	28,75%	3 791 474			1 034 913	19,45%	4 286 406
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP		ukončené prijímanie ŽoNF, žiadne projekty v procese hodnotenia a žiadny potenciál ďalšieho čerpania tejto PÚ	RO: MPRV SR	ENFR	780 644	78 918	10,11%	701 726			40 743	5,22%	739 901
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania		ukončené prijímanie ŽoNFP, aktuálne sa vyhodnocujú 4 prijaté ŽoNFP s potenciálnym čerpaním vo výške 1,35 mil. EUR	RO: MPRV SR	ENFR	2 481 071	682 058	27,49%	1 799 013			605 891	24,42%	1 875 180
	PÚ 7 - Technická pomoc		už vyčerpaná celá alokácia na TP	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	806 798	100,39%	-3 104			801 777	99,76%	1 917
	CELKOM OP RH:					9 386 728	3 097 619	33,00%	6 289 109	6 288 060	2 483 325	26,46%	6 903 403	
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)	
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj	
Intereg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu		zazmluvňovanie projektov aj v roku 2023, krátky čas na dokončenie projektov/opatrením je realokácia a využitie 15 % flexibility medzi PO	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	12 646 829	95,31%	621 700			10 347 743	77,99%	2 920 786
	2. Kvalitné životné prostredie		zazmluvnenie projektov, nová výzva v roku 2023, kde dopyt je 3,2 mil. eur	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	65 830 613	105,60%	-3 490 161			48 922 331	78,48%	13 418 121
	3. Rozvoj miestnych iniciatív		zazmluvňovanie projektov aj v roku 2023, krátky čas na dokončenie projektov/opatrením je realokácia a využitie 15 % flexibility medzi PO	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	8 335 501	91,38%	786 614			5 575 547	61,12%	3 546 568
	4. Technická pomoc		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	5 495 820	101,62%	-87 453			4 831 637	89,34%	576 730
	CELKOM Intereg V-A SK-CZ:					90 139 463	92 308 763	102,41%	-2 169 300	0	69 677 257	77,30%	20 462 206	
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)	
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj	
Intereg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu		najrizikovejšia je PO 2 - v danej osi sa nachádza podstatný počet projektov, ktoré nie sú finančne ukončené alebo sú v implementácii a ešte budú v roku 2023 generovať výdavky/opatreniami sú nadkontrahovanie, využité 15 % flexibility čerpania v rámci OP, možnosť navýšenia intenzity EFRR na 85%	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	19 583 359	99,49%	99 783			16 789 505	85,30%	2 893 637
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity			RO: MIRRI SR	EFRR	29 376 079	30 343 627	103,29%	-967 548			17 382 265	59,17%	11 993 814
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení			RO: MIRRI SR	EFRR	8 098 921	8 098 921	100,00%	0			5 703 219	70,42%	2 395 702
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce			RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	13 828 802	97,52%	352 177			10 097 023	71,20%	4 083 956
	5. Technická pomoc			RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	4 473 529	98,24%	80 031			4 106 369	90,18%	447 191
	CELKOM Intereg V-A SK-AT:						75 892 681	76 328 239	100,57%	-435 558	0	54 078 380	71,26%	21 814 301

Príloha č. 2: Predbežná sumarizácia fázovaných projektov z PO 2014 – 2020 do PO 2021 – 2027 – stav k 15.05.2023

Operačný program	Rezort	Počet projektov	Zazmluvnený objem (EÚ zdroj)	Čerpanie k 30.04.2023 (EÚ zdroj)	Zostáva vyčerpať do konca PO 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Plánované čerpanie do konca PO 2014 - 2020, t.j. 1. fáza projektu (EÚ zdroj)	Objem, ktorý sa bude fázovať, t.j. 2. fáza projektu (EÚ zdroj)	Plánované čerpanie 1. + 2. fáza (EÚ zdroj)
OP Integrovaná infraštruktúra	MD SR	10	597 540 897,95	99 547 875,00	497 993 022,95	217 530 881,36	360 826 830,40	578 357 711,76
	MIRRI SR	1	30 949 774,09	3 267 113,19	27 682 660,90	22 434 654,90	8 515 119,19	30 949 774,09
	MH SR	4	57 833 786,12	1 081 397,92	56 752 388,20	analyzuje sa	51 100 000,00	51 100 000,00
	MŠVVŠ SR	2	26 294 411,40	4 788 083,59	21 506 327,81	analyzuje sa	analyzuje sa	analyzuje sa
	Spolu OP II	17	712 618 869,56	108 684 469,70	603 934 399,86	239 965 536,26	420 441 949,59	660 407 485,85
OP Kvalita životného prostredia	MŽP SR	19	223 970 715,00	28 135 974,00	195 834 741,00	63 394 181,62	160 127 375,78	223 521 557,40
	MV SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIEA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu OP KŽP	19	223 970 715,00	28 135 974,00	195 834 741,00	63 394 181,62	160 127 375,78	223 521 557,40
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	13	60 478 024,00	448 120,50	60 029 903,50	analyzuje sa	analyzuje sa	analyzuje sa
	MK SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MZ SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu IROP	13	60 478 024,00	448 120,50	60 029 903,50	analyzuje sa	analyzuje sa	analyzuje sa
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŠVVŠ SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MV SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu OP ĽZ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP Efektívna verejná správa	MV SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP Technická pomoc	MIRRI SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP Rybné hospodárstvo	MPRV SR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:		49	997 067 608,56	137 268 564,20	859 799 044,36	303 359 717,87	580 569 325,37	883 929 043,24

Pozn.:

OP II - MH SR - plánované čerpanie do konca PO 2014-2020 (1. fáza projektu) je aktuálne predmetom analýzy a komunikuje sa s prijímateľmi. Očakáva sa výrazný nárast čerpania oproti aktuálnemu stavu.

OP II - MŠVVŠ SR - v súčasnosti nevedia poskytnúť informácie, nakoľko prijímatelia definitívne nestanovili aktivity, ktoré budú spadať do prvej resp. druhej fázy. Akonáhle budú mať k dispozícii všetky požadované informácie, budú informovať. S prijímateľmi sa realizujú pravidelné pracovné stretnutia ohľadne fázovania projektov. Pravidelných stretnutí sa zúčastňujú všetky zainteresované strany, t.j. prijímatelia, MŠVVAŠ SR ako SO, VA ako poskytovateľ a MZ SR ako budúci poskytovateľ.

OP KŽP - MŽP SR - v tabuľke sa uvádza alternatíva minimálneho čerpania za 1. fázu a maximálneho za 2. fázu (maximálne čerpanie za 1. fázu: 75 061 805 € a minimálne čerpanie za 2.fázu: 148 459 755 €)

IROP – MIRRI SR - plánované čerpanie do konca PO 2014-2020, t.j. 1. fáza projektu a objem EÚ zdroja, ktorý sa bude fázovať, t.j. 2. fáza projektu, sú zatiaľ len indikatívne, keďže dosiaľ prijímatelia vyhodnocujú stav implementácie, pričom budú postupovať aj podľa Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty.

OP ĽZ - MV SR - aktuálne nevedia určiť projekty na fázovanie, nakoľko tie, ktoré by pripadali do úvahy, nemajú schválené VO. Zároveň, rizikové projekty MŠ nebudú podporované v programovom období 2021 -2027. Presnejšie informácie ohľadom reálnej potreby fázovania budú mať uprostred stavebnej sezóny počas letných mesiacov.

Príloha č. 3: "Spiace projekty" v delení na OP a rezorty - stav k 31.05.2023

(spiace projekty = projekty s čerpaním 0 % a dátumom účinnosti zmluvy do 31.12.2020;
zoznam neobsahuje projekty plánované na fázovanie)

OP/rezort/zameranie projektu	Počet projektov	Zazmluvnená suma = ostáva vyčerpať (EÚ zdroj)
Integrovaný regionálny OP	171	98 584 189,51
MIRRI SR	139	94 245 740,36
DOP	139	94 245 740,36
MK SR	32	4 338 449,15
DOP	32	4 338 449,15
OP Kvalita životného prostredia	23	16 527 054,76
MV SR	5	1 294 678,08
DOP	5	1 294 678,08
MŽP SR	5	11 367 636,65
DOP	5	11 367 636,65
SIEA	13	3 864 740,03
DOP	13	3 864 740,03
OP Ľudské zdroje	97	28 312 932,57
MPSVR	31	4 533 047,58
DOP	31	4 533 047,58
MŠVVŠ SR	5	554 380,16
DOP	5	554 380,16
MV SR	61	23 225 504,83
DOP	61	23 225 504,83
OP Integrovaná infraštruktúra	234	120 798 969,89
MD SR	1	78 370,00
NP	1	78 370,00
MH SR	67	31 228 865,64
DOP	67	31 228 865,64
MIRRI SR	166	89 491 734,25
DOP	159	29 093 959,42
NP	7	60 397 774,83
SPOLU	525	264 223 146,72

Príloha č. 4: Stanovenie rizík na úrovni RO a SO

vysoké riziko (platí kritérium a) a zároveň kritérium b) alebo c))

- a) **nemožnosť presunúť alokáciu v rámci OP** (týka sa PO6 OP LŽ; OP RH; PO1 a PO2 OP KŽP – možnosť presunúť len do SAFE)
- b) **vysoký objem, ktorý je ešte potrebné vyčerpať** v porovnaní s celkovou vyčerpanou sumou (viac ako 30 % doteraz vyčerpanej sumy)
- c) **nízka alebo žiadna rezerva na čerpanie v zazmluvnených projektoch (tzv. buffer)** so zohľadnením plánovanej výšky 2. fáz projektov, oproti sume, ktorá zostáva vyčerpať

riziko (platí minimálne jedno kritérium alebo kombinácia)

- a) **auditné zistenia**, ktoré môžu znížiť úroveň čerpania, bez možnosti nahradenia výdavkov
- b) **vysoký objem, ktorý je ešte potrebné vyčerpať** v porovnaní s celkovou vyčerpanou sumou (minimálne na úrovni doterajšieho čerpania a vyšší)
- c) **nízka alebo žiadna rezerva na čerpanie v zazmluvnených projektoch (tzv. buffer)** so zohľadnením plánovanej výšky 2. fáz projektov, oproti sume, ktorá zostáva vyčerpať

mierne riziko (platí minimálne jedno kritérium)

- a) **vysoký objem, ktorý je ešte potrebné vyčerpať v absolútnom vyjadrení, avšak je vytvorená dostatočná rezerva na čerpanie** v zazmluvnených projektoch (tzv. buffer) so zohľadnením plánovanej výšky 2. fáz projektov, oproti sume, ktorá zostáva vyčerpať **a prijímajú sa ďalšie opatrenia na zvýšenie tejto rezervy** (napr. využitie SIH: MD SR - nákup repasovaných vozňov a MIRRI SR - úvery pre mestá a VÚC)
- b) **rizikové projekty, avšak prijímajú sa opatrenia na vytvorenie rezervy (nadkontrahovanie)**

bez rizika

- **predpoklad vyčerpania celej alokácie** - v prípade samostatných SO a ich PO v rámci OP môžu tieto PO potiahnuť čerpanie aj ostatných v rámci OP.

Príloha č. 5: Zoznam rizikových projektov PO7 podľa rezortov so stavom hlavného verejného obstarávania

Nadriadená org.a rezorty								
ALL	Prijímateľ	Názov projektu	Suma ERDF	Počet	Čerpanie ERDF	% čerpania	Dátum	Stav VO
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky			9 295 500,82	6	398 583,48	2%		
	Dopravný úrad		3 808 202,18	2	-	0%		
		Kybernetická bezpečnosť Dopravného úradu	46 944,82	1	-	0%	26.3.2021	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
		Manažment údajov Dopravného úradu	3 761 257,36	1	-	0%	20.6.2022	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky			2 155 885,15	2	-	0%		
		Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS - Ministerstvo dopravy a výstavby SR	90 796,93	1	-	0%	11.11.2020	A/ v príprave
		Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MDV SR	2 065 088,22	1	-	0%	4.3.2022	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl			3 331 413,49	2	398 583,48	6%		
		2021/11 Kybernetická bezpečnosť	124 043,61	1	-	0%	25.4.2022	E/ pred podpisom DZ
		Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ	3 207 369,88	1	398 583,48	12%	9.9.2019	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo financií Slovenskej republiky			20 251 769,07	2	5 416 077,42	17%		
Ministerstvo financií Slovenskej republiky			20 251 769,07	2	5 416 077,42	17%		
		Centrálny ekonomický systém	18 408 076,64	1	5 303 438,30	29%	2.7.2021	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
		Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR	1 843 692,43	1	112 639,12	6%	23.2.2018	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo kultúry SR			572 240,65	1	13 280,48	2%		
Národné osvetové centrum			572 240,65	1	13 280,48	2%		
		Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia - jednoduchý projekt pre manažment údajov	572 240,65	1	13 280,48	2%	27.11.2019	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky			1 369 869,63	4	126 779,79	6%		
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky			49 215,39	1	-	0%		
		Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MPRV SR	49 215,39	1	-	0%	8.4.2022	E/ pred podpisom DZ
Národné lesnícke centrum			1 320 654,24	3	126 779,79	8%		
		Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre - komplexný projekt pre manažment údajov	519 383,00	1	126 779,79	24%	15.6.2022	C1/ vyhlásené: pred predložením ponúk
		Manažment údajov lesných pozemkov NLC	744 628,19	1	-	0%	5.9.2019	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
		Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Národné lesnícke centrum	56 643,05	1	-	0%	21.12.2020	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky			7 448 276,17	2	-	0%		
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky			7 448 276,17	2	-	0%		
		Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce	3 851 529,56	1	-	0%	30.10.2020	A/ v príprave
		Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	3 596 746,61	1	-	0%	15.10.2019	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky			19 644 833,73	4	3 759 543,97	5%		
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže			18 522 219,56	2	3 759 543,97	11%		
		Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže	641 554,64	1	-	0%	23.9.2019	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
		Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže	17 880 664,92	1	3 759 543,97	21%	17.3.2020	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky			1 122 614,17	2	-	0%		
		Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky	752 230,44	1	-	0%	25.3.2022	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
		Manažment údajov RESS	370 383,73	1	-	0%	15.11.2022	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky			8 978 460,89	3	28 553,79	0%		
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky			7 024 355,76	2	-	0%		
		Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR	5 161 553,23	1	-	0%	27.12.2019	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
		Manažment údajov v rezorte školstva	1 862 802,53	1	-	0%	24.1.2020	A/ v príprave
Národné športové centrum			1 954 105,13	1	28 553,79	1%		
		Manažment údajov pre Národné športové centrum	1 954 105,13	1	28 553,79	1%	22.3.2021	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			19 692 912,58	2	-	0%		
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			19 692 912,58	2	-	0%		
		Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia	689 319,28	1	-	0%	11.1.2022	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
		Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1	19 003 593,30	1	-	0%	25.11.2020	C2/ vyhlásené: po predložení ponúk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky			3 365 831,46	1	-	0%		
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky			3 365 831,46	1	-	0%		
		Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ	3 365 831,46	1	-	0%	18.11.2020	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky			12 059 952,54	3	-	0%		
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky			134 560,71	1	-	0%		
		Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	134 560,71	1	-	0%	30.3.2022	E/ pred podpisom DZ
Národné centrum zdravotníckych informácií			11 925 391,83	2	-	0%		
		Online procesy eZdravia	5 302 697,89	1	-	0%	16.10.2019	E/ pred podpisom DZ
		Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického	6 622 693,94	1	-	0%	23.12.2019	N/A (bude zrušený projekt)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky			9 015 501,36	6	144 651,21	4%		
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky			1 824 825,51	4	-	0%		
		Malé zlepšenia eGOV služieb IS Fluórované skleníkové plyny	511 446,07	1	-	0%	11.5.2022	A/ v príprave
		Malé zlepšenia eGOV služieb IS Register CITES	636 564,22	1	-	0%	11.5.2022	A/ v príprave
		Manažment údajov IS CITES	369 984,44	1	-	0%	30.11.2022	A/ v príprave
		Manažment údajov IS Register fluórovaných skleníkových plynov	306 830,78	1	-	0%	15.11.2022	A/ v príprave
Slovenská agentúra životného prostredia			615 149,54	1	144 651,21	24%		
		Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia	615 149,54	1	144 651,21	24%	1.4.2022	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Slovenská inšpekcia životného prostredia			6 575 526,31	1	-	0%		
		Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie	6 575 526,31	1	-	0%	8.11.2019	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Úrad vlády Slovenskej republiky			2 882 760,62	2	-	0%		
Úrad vlády Slovenskej republiky			2 882 760,62	2	-	0%		
		Manažment údajov Úradu vlády SR	2 147 200,96	1	-	0%	22.2.2021	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
		Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR	735 559,66	1	-	0%	18.1.2021	F/ Dodávateľská zmluva podpísaná
Celkový súčet			114 577 909,52	36	9 887 470,14			
