

Informácia o stave implementácie
európskych štrukturálnych a investičných fondov
k 30.06.2023

Obsah

1.	Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 30.06.2023	3
1.1	Stav implementácie podľa operačných programov	8
1.2	Stav implementácie podľa jednotlivých rezortov bez prioritných osí technickej pomoci	23
2.	Využitie nových iniciatív Európskej komisie – stav k 30.06.2023.....	25
2.1	Implementácia opatrení na eliminovanie dopadov pandémie COVID-19	25
2.2	Implementácia REACT-EU.....	26
2.3	Implementácia FAST-CARE	28
2.4	Implementácia SAFE	30
3.	Plány čerpania na roky 2023 a 2024 podľa rezortov	33
	Príloha č. 1: Stav implementácie EŠIF podľa prioritných osí OP (k 30.06.2023, so zohľadnením SAFE presunov) - semafor	35
	Príloha č. 2: Predbežná sumarizácia fázovaných projektov z PO 2014 – 2020 do PO 2021 – 2027 – stav k 19.07.2023	37
	Príloha č. 3: "Spiace projekty" v delení na OP a rezorty - stav k 30.06.2023 a zmena od 31.05.2023..	38
	Príloha č. 4: Stanovenie rizík na úrovni RO a SO	40

1. Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 30.06.2023

V programovom období 2014 – 2020 sa implementujú fondy EÚ prostredníctvom 11 operačných programov, pričom za implementáciu každého operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán.

Informácia je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31.12.2025.

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR na realizáciu operačného programu. RO je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 plne zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.

Rok 2023 je pre RO kľúčový na zabezpečenie riadneho ukončovania programov. RO v tejto fáze implementácie finalizujú prípravy posledných žiadostí o zmenu programu, zabezpečujú zvýšený počet administratívnych kontrol žiadostí o platbu, ukončovanie projektov, prípravu fázovania niektorých projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí a zabezpečujú všetky potrebné postupy pre úspešné ukončovanie programov.

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie EŠIF, ktorý je na úrovni 104,71 %, je zároveň kľúčové, aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023. Efektívne čerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli.

Z celkovej alokácie 14,50 mld. EUR je k 30.06.2023 vyčerpaných 10,67 mld. EUR a zostáva vyčerpať ešte 3,83 mld. EUR (EÚ zdroj).

Pokrok od 31.05.2023 do 30.6.2023: nárast kontrahovania o 335,61 mil. EUR a čerpania o 458,47 mil. EUR (zo 70,41 % na 73,58 %).

Pokrok od 01.07. do 21.07.2023: nárast čerpania o 134,26 mil. EUR (zo 73,58 % na 74,51 %).

Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na certifikačný orgán MF SR.

Kľúčové opatrenia na vyčerpanie 3,83 mld. EUR sú:

1. ukončovanie implementácie projektov zo strany prijímateľov do 31.12.2023 a dočerpanie zostávajúcich alokácií jednotlivých programov;
2. **SAFE** (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) **v súčasnosti RO avizujú vyčleniť 1,04 mld. EUR**, s možnosťou navýšenia až do výšky 1,45 mld. EUR, a to na pomoc zraniteľným domácnostiam prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP;
3. **FAST CARE** (pomoc UA utečencom) – **315,26 mil. EUR** je presmerovaných na výdavky súvisiace s prvotným prijatím **UA utečencov** a ich integráciou do spoločnosti prostredníctvom 3 OP, a to: IROP, OP IŽ a OP II. **K 30.06.2023 bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 317,56 mil. EUR (100,73 %), zazmluvnených 266,61 mil. EUR (84,57 %) a vyplatených 131,17 mil. EUR (41,61 %).**
4. **využívanie 15 % flexibility** čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci operačného programu/fondu bez potreby realokácie;
5. **analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní** vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK;
6. **využívanie fázovania – možné rozdelenie projektov na 2 fázy**, z ktorých druhá bude ukončená v programovom období 2021 – 2027. Jednotlivé RO a SO aktualizovali 19.7.2023 menný zoznam projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia alokácií na 1. a 2. fázu;

7. sfunkčnenie projektov najneskôr do 15. februára 2027, ktoré nebudú do 31. decembra 2023 finančne ukončené (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa);
8. využívanie dodatočného príspevku, teda využitie prostriedkov získaných uplatnením 100 % financovania výdavkov zo strany EK za 7. a 8 účtovný rok na dofinancovania zvýšených výdavkov projektov.

Tabuľka č. 1: Prehľad opatrení na vyčerpanie 3,83 mld. EUR


Operačný program	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (alokácia - čerpanie)	Plánovaná realokácia na energokrízu	Realokácia na migračnú krízu (zostatok)	Zostáva vyčerpať po realokácii na energo a migračnú krízu
OP Integrovaná infraštruktúra	1 712 353 376	574 818 551	30 000 000	1 107 534 825
OP Kvalita životného prostredia	947 336 495	387 885 361		559 451 134
Integrovaný regionálny OP	588 260 380	76 366 735	113 039 456	398 854 189
OP Ľudské zdroje	471 756 800	-	41 245 000	430 511 800
OP Efektívna verejná správa	60 650 255			60 650 255
PS Interreg V-A SK-AT	21 069 003			21 069 003
PS Interreg V-A SK-CZ	18 837 279			18 837 279
OP Technická pomoc	4 911 791			4 911 791
OP Rybné hospodárstvo	5 253 271			5 253 271
Program spolupráce INTERACT III	277 213			277 213
EŠIF bez PRV:	3 830 705 863	1 039 070 647	184 284 456	2 607 350 760

Z objemu 3,83 mld. EUR je plánovaných na:

- ✓ **SAFE**, t.j. riešenie energokrízy: 1,04 mld. EUR
- ✓ **FAST CARE**, podpora UA utečencov: 184 mil. EUR (131,17 mil. EUR už bolo vyčerpaných)
- ✓ **realizácia zazmluvnených projektov EŠIF: 2,61 mld. EUR (t.j. 18 % z alokácie)**

K 30.06.2023 je v realizácii ešte 6 927 projektov (okrem projektov **FAST CARE**) so zazmluvnenou sumou 9,67 mld. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 5,00 mld. EUR (EÚ zdroj), z toho spiace projekty (t.j. projekty s dátumom účinnosti zmluvy do 31.12.2021 a nulovým čerpaním) predstavujú 514 mil. EUR a druhé fázy projektov 512 mil. EUR. Po zohľadnení spiacich projektov a 2. fáz projektov predstavuje potenciál čerpania z projektov 3,97 mld. EUR.

Graf č. 1 Plánované použitie zostávajúcej alokácie programového obdobia 2014 – 2024

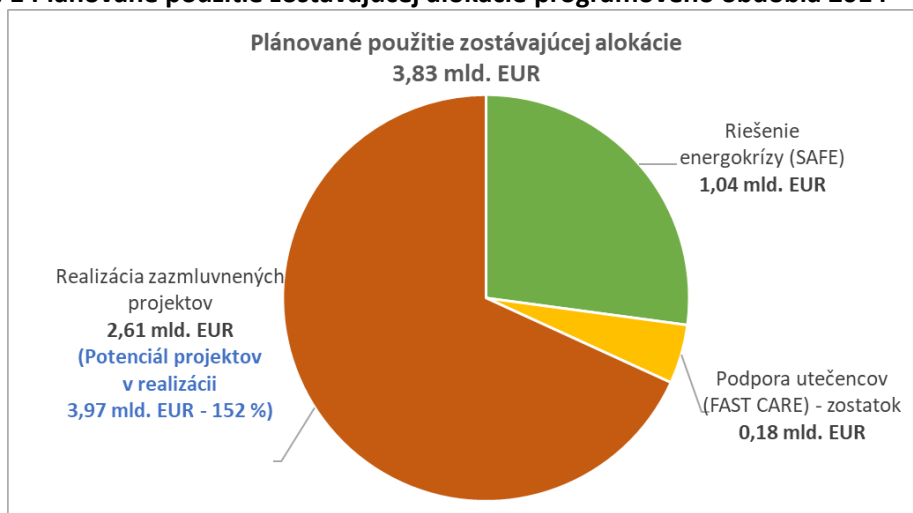

Za predpokladu úspešnej realizácie **SAFE** a **FAST CARE** sa zníži zostávajúca suma potrebná pre vyčerpanie celej alokácie do marca 2024 zo zazmluvnených projektov na 2,61 mld. EUR, ktoré sú kryté ešte nevyčerpanými projektami v objeme 5,00 mld. EUR, čo predstavuje 192 % z potrebnej sumy 2,61 mld. EUR. Aj po zohľadnení spiacich projektov v objeme 0,514 mld. EUR a 2. fáz projektov, ktoré sú v súčasnosti v objeme 0,512 mld. EUR, zostáva potenciál čerpania v zazmluvnených projektoch

v objeme **3,97 mld. EUR**, čo predstavuje 152 % z potrebnej sumy 2,61 mld. EUR a rezerva na čerpanie z projektov predstavuje **1,36 mld. EUR**. Z uvedeného je zrejmé, že kľúčovým hráčom v implementácii eurofondov PO 2014 – 2020 v súčasnom období sú prijímatelia, s ktorými sú uzatvorené zmluvy.

Suma na dočerpanie:	5,00 mld. EUR
Fázovanie - 2. fáza:	-0,512 mld. EUR
<u>Spiace projekty:</u>	<u>-0,514 mld. EUR</u>
Potenciál čerpania:	3,97 mld. EUR
<u>Potrebné čerpať :</u>	<u>-2,61 mld. EUR</u>
Rezerva na čerpanie:	1,36 mld. EUR

Materiál ďalej poskytuje informáciu o rizikách jednotlivých operačných programov a ich riadiacich a sprostredkovateľských orgánov v zmysle stanovenia rizík v prílohe č. 4.

Ako vysoko rizikové a rizikové boli identifikované tieto RO a SO:



- × **MŽP SR (SAŽP) - OP KŽP – vysoké riziko (hrozba dekomitmentu)** – problematické PO 1 a PO 2 financované z KF, čo znamená, že **nie je možný presun alokácie do inej PO**; implementácia je postavená na veľkom množstve menších investičných projektov, ktorú sú ovplyvnené COVIDom a nárastom cien stavebných materiálov; problémová implementácia projektov rezortných organizácií; zostáva vyčerpať ešte pomerne vysoký objem finančných prostriedkov vo výške 351 mil. EUR.
- × **MPRV SR – OP RH - vysoké riziko (hrozba dekomitmentu)** - dlhodobá problémová implementácia (dekomitment každý rok a aj strata výkonnostnej rezervy).
- × **MV SR – OP ĽZ - PO6 MRK - vysoké riziko (hrozba dekomitmentu)** - problematická je **PO 6 MRK** financovaná z EFRR, čo znamená, že **je obmedzený presun alokácie do inej PO**; veľa malých infraštruktúrnych projektov v obciach s MRK, v rámci ktorých je vysoká chybovosť VO a problém s navýšením cien stavebných materiálov; mimoriadne ukončovanie projektov (EK odmietla presun na SAFE, čo by zmiernilo riziko dekomitmentu) – **uvedené môže byť čiastočne riešené prostredníctvom finančných nástrojov implementovaných SIH cez projekt DoDo vo výške min. 25 mil. EUR, za predpokladu súhlasného stanoviska SIH a spoločnosti Dostupný Domov j.s.a.**
- × **MK SR – IROP - riziko** – veľa projektov s veľkým počtom VO - neukončené kontroly VO a zmenové konania – zmeny v projektoch v enormných objemoch kvôli cenám a nedostupnosti viacerých tovarov na trhu; nezáujem prijímateľov pokračovať v projekte po skončení covidovej doby, vysoký počet mimoriadnych ukončení projektov v REACT-EU a to najmä z dôvodu vysokej chybovosti vo VO a ďalej sa očakáva rozsiahle mimoriadne ukončovanie už zazmluvnených projektov zo strany prijímateľov; otvorenie zásobníka projektov a pristúpenie k nadkontrahovaniu. Vzhľadom na stav implementácie **bola k 30.6.2023 presunutá alokácia v objeme 18,30 mil. EUR zo SO MK SR do PO1 IROP.**
- × **MŠVVŠ SR - OP II - riziko** - realizácie veľkého projektu **ACCORD** v gescii **MŠVVŠ SR** – ostáva vyčerpať ešte 26,35 mil. EUR (47,50 %) a aktuálne je prešetrovaná kauza prijatia úplatku koordinátorom projektu na UK (pozastavené platby zo strany EK boli s výnimkou identifikovaného problematického VO opäť uvoľnené). MŠVVŠ zároveň rieši s EK možné navýšenie alokácie z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov. Projekt má v súčasnosti problémy s cash flow.

Prehľad nevyčerpanej alokácie jednotlivých programov k 30.06.2023

OP Integrovaná infraštruktúra



Revízie OP II: ✓ FAST CARE - revízia schválená EK 04.04.2023,

SAFE - revízia predložená EK 30.06.2023

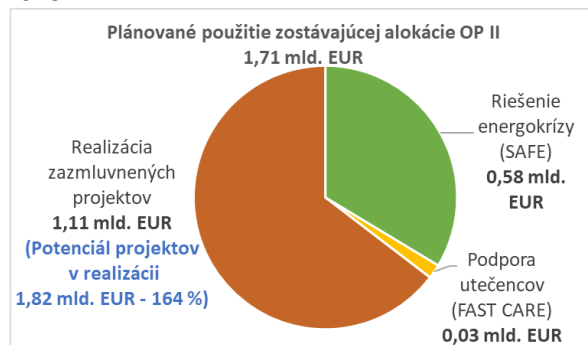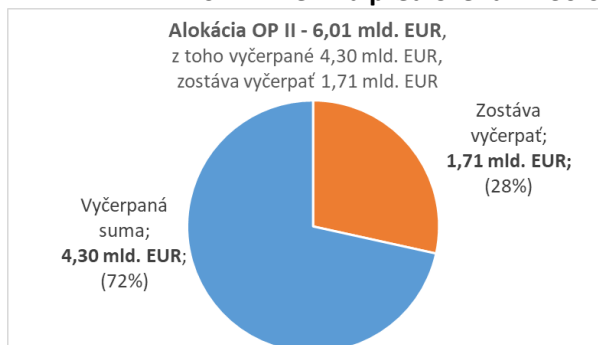

OP Kvalita životného prostredia



Revízia OP KŽP: SAFE - revízia schválená MV 30.03.2023, EK bude zaslaná po konaní SEA v 9/2023

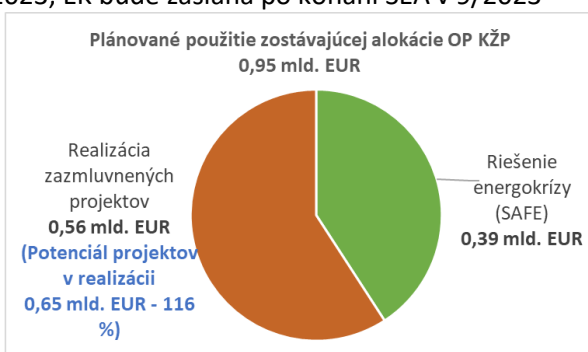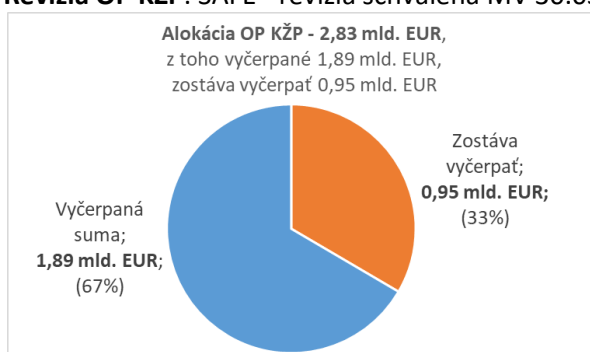

Integrovaný regionálny OP

Revízie IROP: ✓ FAST CARE - revízia schválená EK 12.05.2023



SAFE – revízia predložená EK 30.06.2023

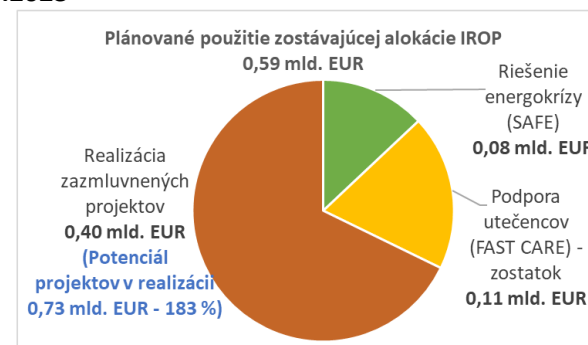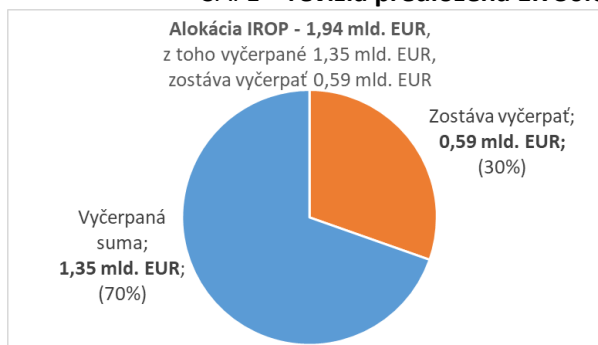


OP Ľudské zdroje

Revízie OP ĽZ: ✓ FAST CARE - revízia schválená EK 19.12.2022


✗ SAFE - nesúhlas EK s presunom z PO 6 MRK

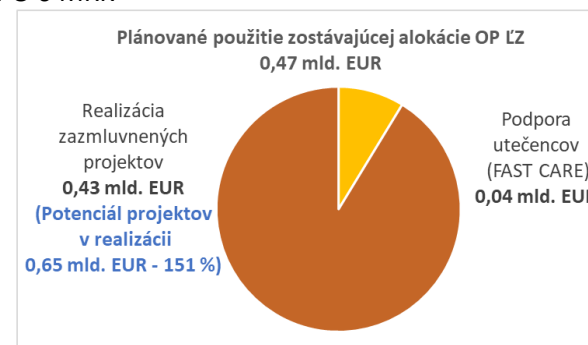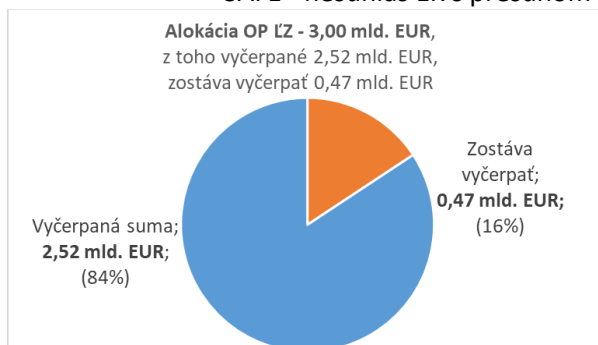


OP Efektívna verejná správa

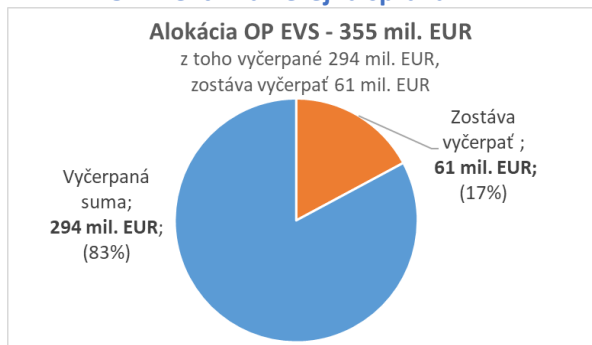


OP Technická pomoc

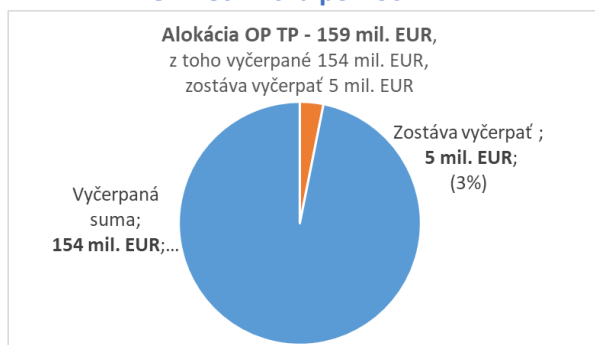


Interreg V-A SK-CZ

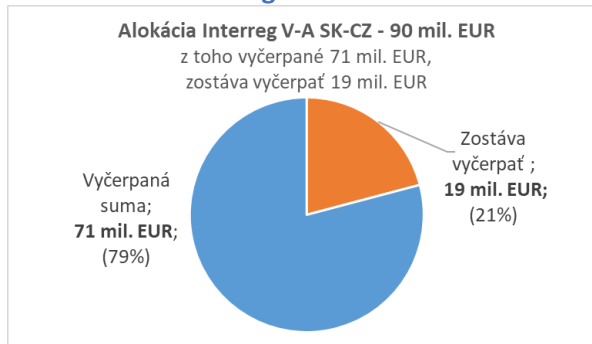


Interreg V-A SK-AT

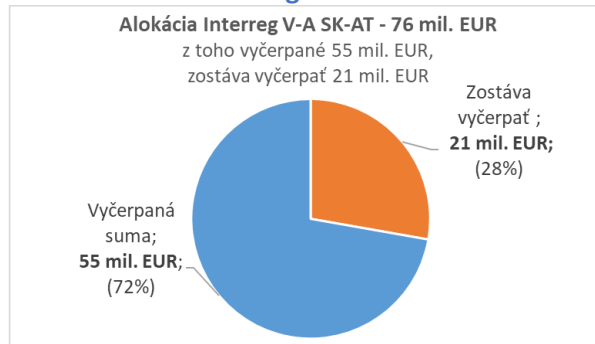

OP Rybné hospodárstvo

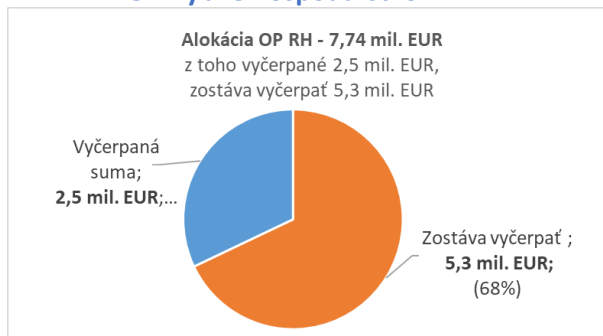

INTERACT III

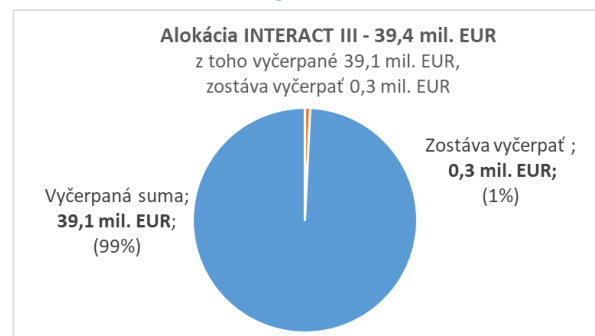

1.1 Stav implementácie podľa operačných programov

Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 14,50 mld. EUR (oproti pôvodnej alokácii vo výške 13,78 mld. EUR došlo v rokoch 2021 – 2022 k navýšeniu o zdroje REACT-EU vo výške 722,25 mil. EUR).

➤ Výzvy/vyzvania

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 sprístupnili riadiace orgány v **836 výzvach a vyzvaniach** pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 30.06.2023 finančné prostriedky vo výške **21,80 mld. EUR**, čo predstavuje **150,73 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

➤ Kontrahovanie

Úroveň **kontrahovania** všetkých fondov alokovaných pre SR (okrem EPFRV) v rámci programového obdobia 2014 – 2020 dosiahla k 30.06.2023 hodnotu **15,18 mld. EUR**, čo predstavuje **104,71 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

➤ Čerpanie

K 30.06.2023 dosiahla SR za všetky fondy (okrem EPFRV) alokované pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni **10,67 mld. EUR**, čo predstavuje **73,58 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Do konca programového obdobia je ešte potrebné vyčerpať 3,83 mld. EUR. Čerpanie je možné až do marca 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania záverečných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na MF SR.

Pokrok od 31.05.2023 do 30.6.2023: nárast kontrahovania o 335,61 mil. EUR a čerpania o 458,47 mil. EUR (zo 70,41 % na 73,58 %).

Tabuľka č. 2: Stav implementácie jednotlivých OP k 30.06.2023

Operačný program	Zodpovedný rezort/orgán	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (EÚ zdroj)	% kontrahovania	% čerpania	Ostáva vyčerpať do 3/2024 (rozdiel alokácie a aktuálneho čerpania)	Ostáva vyčerpať do 3/2024 (rozdiel alokácie a aktuálneho čerpania) bez SAFE
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	2 996 457 169	3 103 299 392	2 524 700 369	103,57%	84,26%	471 756 800	471 756 800
OP Integrovaná infraštruktúra	MD SR	6 009 937 611	6 458 424 860	4 297 584 235	107,46%	71,51%	1 712 353 376	1 137 534 825
OP Kvalita životného prostredia	MŽP SR	2 832 531 290	2 596 220 217	1 885 194 795	91,66%	66,56%	947 336 495	559 451 134
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	1 935 724 762	2 311 403 163	1 347 464 382	119,41%	69,61%	588 260 380	511 893 645
OP Efektívna verejná správa	MV SR	354 655 437	349 923 063	294 005 182	98,67%	82,90%	60 650 255	60 650 255
OP Technická pomoc	MIRRI SR	159 071 912	155 467 937	154 160 121	97,73%	96,91%	4 911 791	4 911 791
OP Rybné hospodárstvo	MPRV SR	7 736 596	3 095 366	2 483 325	40,01%	32,10%	5 253 271	5 253 271
PS Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	91 171 040	71 302 184	101,14%	79,10%	18 837 279	18 837 279
PS Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	76 151 039	54 823 678	100,34%	72,24%	21 069 003	21 069 003
Program spolupráce INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	39 115 381	100,00%	99,30%	277 213	277 213
EŠIF bez PRV		14 501 539 515	15 184 548 670	10 670 833 652	104,71%	73,58%	3 830 705 863	2 791 635 216

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)


Tabuľka č. 3: Pokrok v implementácii od 31.05.2023 po jednotlivých OP

Program	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie zmena od 31.05.2023		Čerpanie EŠIF zmena od 31.05.2023	
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	p.b.	EÚ zdroj /za 7. a 8. ÚR za všetky zdroje bez pro-rata pre niektoré OP	p.b.
OP Ľudské zdroje	0	0	6 063 107	0,20%	14 364 198	0,48%
OP Integrovaná infraštruktúra	0	0	73 294 167	1,22%	206 580 560	3,44%
OP Kvalita životného prostredia	0	0	26 292 008	0,93%	22 014 376	0,78%
Integrovaný regionálny OP	0	0	226 016 067	11,68%	209 888 655	10,84%
OP Efektívna verejná správa	0	0	5 174 693	1,46%	1 439 437	0,41%
OP Technická pomoc	0	0	41 473	0,03%	1 812 387	1,14%
OP Rybné hospodárstvo	-1 650 132	-520 872	-2 253	7,01%	0	5,64%
Interreg V-A SK-CZ	0	0	-1 137 723	-1,26%	1 624 927	1,80%
Interreg V-A SK-AT	0	0	-135 116	-0,18%	745 298	0,98%
PS INTERACT III	0		0	0,00%	0	0,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	-1 650 132	-520 872	335 606 425	2,33%	458 469 838	3,17%


Pozn. mínusové položky v tabuľke - v priebehu júna bola oficiálne uplatnená úprava alokácie OP RH v nadväznosti na dekomitment v roku 2022 a naďalej pokračovalo „upratovanie“ v rámci zazmluvnených projektov (mimoriadne ukončenie projektov, zohľadnenie nevyčerpania celej zazmluvnenej sumy, uzatvorenie dodatkov znižujúcich zazmluvnenú sumu,...).

Porovnanie stavu a zostatkov čerpania k 30.06.2023 podľa jednotlivých OP

Graf č. 2: Stav čerpania podľa OP k 30.06.2023

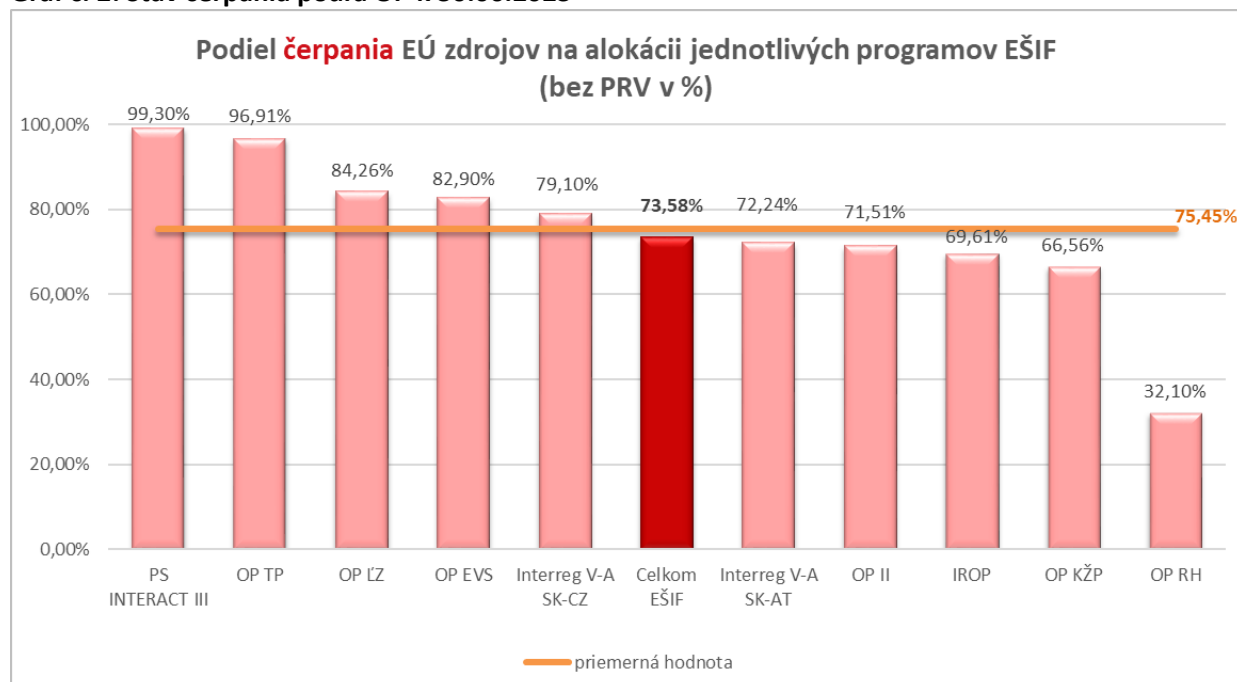

Graf č. 3: Zostáva vyčerpať do konca programového obdobia podľa OP k 30.06.2023

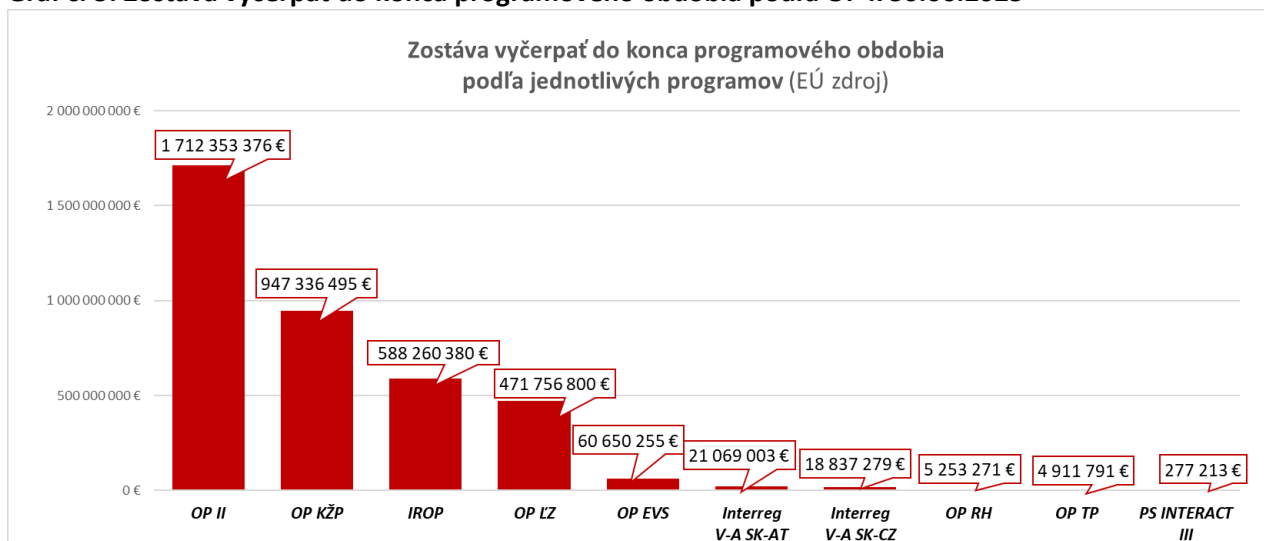

Do konca programového obdobia (najneskôr do marca 2024) zostáva vyčerpať ešte **3,83 mld. EUR**

Najviac zostáva vyčerpať za:


- **OP II (1,71 mld. EUR)**, čo predstavuje 28,49 % alokácie,
- **OP KŽP (947,34 mil. EUR)**, čo predstavuje 33,44 % alokácie,
- **IROP (588,26 mil. EUR)**, čo predstavuje 30,39 % alokácie.

OP Integrovaná infraštruktúra - riadiaci orgán MD SR

Alokácia:	6,01 mld. EUR
Kontrahovanie:	6,46 mld. EUR (107,46 %)
Čerpanie k 30.06.2023:	4,30 mld. EUR (71,51 %)
Nárast čerpania za jún 2023:	0,21 mld. EUR (3,44 p.b.)
Potrebné vyčerpať:	1,71 mld. EUR, z toho:
✓ FAST CARE:	30 mil. EUR (revízia schválená EK 04.04.2023)
✓ SAFE:	575 mil. EUR (revízia predložená EK 30.06.2023)
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	1,11 mld. EUR – potenciál čerpania 1,82 mld. EUR

	Zazmluvnené projekty v realizácii			z toho spiace projekty			z toho fázované projekty			Potenciál čerpania z projektov po zohľadnení spiacich projektov a 2. fáz projektov
	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať 2. fáza	
OP II	1 423	4 726 000 135	2 417 676 062	363	181 263 308	181 263 308	17	712 706 073	410 919 537	1 825 493 217
MD SR	117	2 607 366 894	1 432 355 966	3	6 720 309	6 720 309	10	597 540 898	341 489 294	1 084 146 363
MH SR	553	1 074 792 909	343 309 492	184	70 462 803	70 462 803	4	57 833 786	51 100 000	221 746 688
MIRRI SR	657	601 918 737	435 399 966	176	104 080 196	104 080 196	1	31 036 978	8 602 323	322 717 448
MŠVVŠ SR	96	441 921 595	206 610 638	-	-	-	2	26 294 411	9 727 920	196 882 718

Pozn.: Spiace projekty= projekty s dátumom účinnosti do 31.12.2021 a čerpaním 0 %

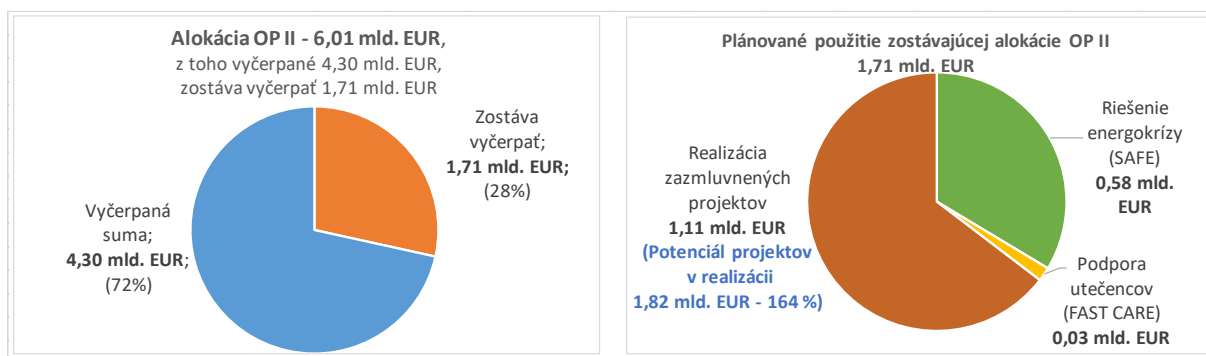

Program	Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024	Nárast čerpania za jún 2023
OP Integrovaná infraštruktúra	Zodpovedný rezort - Ministerstvo dopravy SR	3 105 676 947	3 745 699 139	2 372 146 535	120,61%	76,38%	733 530 412	68 154 577
	SO - Ministerstvo hospodárstva SR	1 254 806 311	1 357 786 151	1 250 470 434	108,21%	99,65%	4 335 877	107 443 340
	SO - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	456 940 302	680 377 400	217 226 841	148,90%	47,54%	239 713 461	15 672 877
	SO - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	460 695 500	523 367 938	317 315 736	113,60%	68,88%	143 379 764	14 958 962
	SAFE	574 818 551						-
	OP Integrovaná infraštruktúra (bez TP)	5 852 937 611	6 307 230 628	4 157 159 545	107,76%	71,03%	1 695 778 066	206 229 756
	OP Integrovaná infraštruktúra (s TP)	6 009 937 611	6 458 424 860	4 297 584 235	107,46%	71,51%	1 712 353 376	206 580 560

Pozn.: Alokácie sú znížené o zdroje na SAFE

Riziká:

- ✗ **MD SR – mierne riziko** – veľký objem nevyčerpanej alokácie
- ✗ **MH SR - bez rizika**
- ✗ **MIRRI SR – mierne riziko - implementácia PO 7** – zostáva vyčerpať ešte viac ako 49 % alokácie. Na základe monitorovania projektov zo strany MIRRI SR prijali prijímatelia reálne opatrenia na akceleráciu implementácie projektov, vrátane aktívnej práce na eliminovaní rizík, čo vytvára potenciál na vyčerpanie alokácie a úplnú elimináciu rizika dekomitmentu;
- ✗ **MŠVVŠ SR - riziko - realizácie veľkého projektu ACCORD v gescii MŠVVŠ SR** – ostáva vyčerpať ešte 26,35 mil. EUR (47,50 %) a aktuálne je prešetrovaná kauza prijatia úplatku koordinátorom projektu na UK (pozastavené platby zo strany EK boli s výnimkou identifikovaného problematického VO opäť uvoľnené), MŠVVŠ zároveň rieši s EK možné navýšenie alokácie z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov – projekt má byť ukončený do 2023;

Realizované opatrenia:

- ❖ **Využitie iniciatív EK – FAST CARE a SAFE – plní sa**

- ❖ Využitie nadkontrahovania - **plní sa**
- ❖ Plné využitie finančných nástrojov v rámci MH SR - **plní sa**
- ❖ Využitie inštitútov EK - fázovanie a nefunkčné projekty (najmä veľké projekty dopravy) - **plní sa**
- ❖ Využitie možnosti presunov alokácie medzi PO toho istého fondu a kategórie regiónov prostredníctvom revízie OP do 9/2023, najmä v prípade MIRRI SR a MŠVVŠ SR - **v príprave**
- ❖ Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP - **v príprave**
- ❖ Analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgency vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK - **plní sa**
- ❖ Analýza spiacich projektov a na základe jej výsledkov určenie, ktoré projekty a v akej výške sa nebudú realizovať - **plní sa**
- ❖ Využitie možnosti preplácať zvýšené ceny stavebných materiálov (valorizácia) pri národných projektoch PO1-6 OPII – **plní sa**
- ❖ Pravidelná komunikácia s prijímateľmi dopravných prioritných osí za účelom maximalizácie čerpania a plnenia plánu čerpania - **plní sa**

Nové opatrenia:


- ❖ Zabezpečenie financovania navýšených cien stavebných materiálov v rámci VP Accord s cieľom dokončenia projektu v plnej miere.
- ❖ Zabezpečiť zdroje v rámci OP II na implementáciu zásobníkových projektov výzvy č. 35 vyhlasovateľa MH SR.

OP Kvalita životného prostredia - riadiaci orgán MŽP SR

Alokácia:	2,83 mld. EUR
Kontrahovanie:	2,60 mld. EUR (91,66 %)
Čerpanie k 30.06.2023:	1,89 mld. EUR (66,56 %)
Nárast čerpania za jún 2023:	22 mil. EUR (0,78 p.b.)
Potrebné vyčerpať:	947 mil. EUR, z toho:
✓ SAFE:	388 mil. EUR (revízia schválená MV 30.03.2023, EK bude zaslaná po konaní SEA v 9/2023)
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	559 mil. EUR – potenciál čerpania 647 mil. EUR

	Zazmluvnené projekty v realizácii			z toho spiace projekty			z toho fázované projekty			Potenciál čerpania z projektov po zohľadnení spiacich projektov a 2. fáz projektov
	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať 2. fáza	
OP KŽP	997	1 463 591 162	791 537 744	96	60 608 719	60 608 719	10	140 283 625	83 432 142	647 496 883
MŽP SR	515	973 466 244	555 455 396	29	35 940 536	35 940 536	10	140 283 625	83 432 142	436 082 719
MH SR	464	355 310 069	189 356 800	62	17 899 429	17 899 429	-	-	-	171 457 371
MV SR	18	134 814 849	46 725 548	5	6 768 755	6 768 755	-	-	-	39 956 793

Pozn.: Spiace projekty= projekty s dátumom účinnosti do 31.12.2021 a čerpaním 0 %

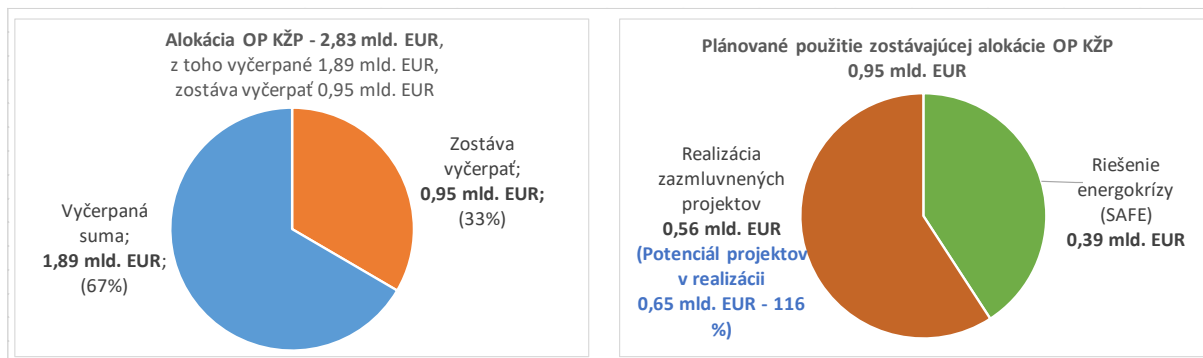

Program	Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024	Nárast čerpania za jún 2023
OP Kvalita životného prostredia	Zodpovedný rezort - Ministerstvo životného prostredia SR	1 361 217 081	1 530 794 214	1 010 642 463	112,46%	74,25%	350 574 618	10 707 420
	SO - Ministerstvo hospodárstva SR	787 772 813	798 472 267	639 690 189	101,36%	81,20%	148 082 624	9 504 446
	SO - Ministerstvo vnútra SR	218 656 035	191 365 701	156 705 776	87,52%	71,67%	61 950 259	1 204 444
	SAFE	387 885 361						-
	OP Kvalita životného prostredia celkom (bez TP)	2 755 531 290	2 520 632 182	1 807 038 427	91,48%	65,58%	948 492 863	21 416 311
	OP Kvalita životného prostredia (s TP)	2 832 531 290	2 596 220 217	1 885 194 795	91,66%	66,56%	947 336 495	22 014 376

Pozn.: Alokácie sú znížené o zdroje na SAFE

Riziká:

- ✗ **MŽP SR (SAŽP) – vysoké riziko** – problematické PO 1 a PO 2 financované z KF, čo znamená, že nie je možný presun alokácie do inej PO; implementácia je postavená na veľkom množstve menších investičných projektov, ktorú sú ovplyvnené COVIDom a nárastom cien stavebných materiálov; problémová implementácia projektov rezortných organizácií; zostáva vyčerpať ešte pomerne vysoký objem finančných prostriedkov vo výške 350 mil. EUR.
- ✗ **MH SR (SIEA) - bez rizika** (prebieha ešte zazmluvňovanie projektov; nadčerpá svoju alokáciu a využije 15 % flexibilitu z PO 3 časť MV SR aj MŽP SR vo výške spolu 30,8 mil. EUR)
- ✗ **MV SR - bez rizika** (čerpanie časti alokácie vo výške 27,1 mil. EUR bude pokryté projektami PO 4 SIEA)

Realizované opatrenia:

- ❖ Využitie iniciatívy EK – SAFE - **plní sa**
- ❖ Využitie nadkontrahovania - **plní sa**

- ❖ Využitie absorpčnej kapacity SIEA v rámci EFRR - **plní sa**
- ❖ Plné využitie finančných nástrojov (MŽP SR a SIEA) - **plní sa**
- ❖ Využitie inštitútov EK - fázovanie a nefunkčné projekty - **plní sa**
- ❖ Využitie možnosti presunov alokácie medzi PO toho istého fondu a kategórie regiónov prostredníctvom revízie OP do 9/2023 - **v príprave**
- ❖ Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP - **plní sa**
- ❖ Analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK - **plní sa**
- ❖ Zvýšený dohľad nad implementáciou rizikových projektov, v rámci ktorých je prijímateľom organizácia v riadiacej pôsobnosti MŽP SR - **plní sa**
- ❖ Analýza spiacich projektov a na základe jej výsledkov určenie, ktoré projekty a v akej výške sa nebudú realizovať – **plní sa**

Nové opatrenie:

- ❖ V rámci procesu prebiehajúcej revízie OP KŽP navýšiť sumy presunu zdrojov na podporu iniciatívy SAFE. Navýšenie uskutočniť na základe analýzy dočerpania zdrojov Kohézneho fondu OP KŽP a o ohrozený objem nedočerpania navýšiť už vyčlenenú alokáciu 387 mil. EUR na podporu iniciatívy SAFE.

Integrovaný regionálny operačný program - riadiaci orgán MIRRI SR

Alokácia:	1,94 mld. EUR (REACT-EU v objeme 235 mil. EUR)
Kontrahovanie:	2,31 mld. EUR (119,41 %)
Čerpanie k 30.06.2023:	1,35 mld. EUR (69,61 %)
Nárast čerpania za jún 2023:	210 mil. EUR (10,84 p.b.)
Potrebné vyčerpať:	588 mil. EUR, z toho:
✓ FAST CARE	113 mil. EUR (z 244 mil. EUR už čerpaných 130 mil. EUR)
✓ SAFE:	76 mil. EUR (revízia predložená EK 30.06.2023)
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	400 mil. EUR – potenciál čerpania 730 mil. EUR

	Zazmluvnené projekty v realizácii			z toho spiace projekty			z toho fázované projekty			Potenciál čerpania z projektov po zohľadnení spiacich projektov a 2. fáz projektov
	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať 2. fáza	
IROP	1 633	1 597 267 516	972 488 850	207	225 215 707	225 215 707	12	58 446 471	17 652 449	729 620 693
MIRRI SR	1 274	1 287 409 951	796 411 329	173	200 519 803	200 519 803	12	58 446 471	17 652 449	578 239 077
MK SR	263	106 653 546	90 228 175	29	21 033 842	21 033 842	-	-	-	69 194 333
MZ SR	96	203 204 019	85 849 345	5	3 662 063	3 662 063	-	-	-	82 187 283

Pozn.: Spiace projekty= projekty s dátumom účinnosti do 31.12.2021 a čerpaním 0 %



Program	Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia 3/2024	Nárast čerpania za jún 2023
Integrovaný regionálny OP	Zodpovedný rezort - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 344 237 252	1 798 725 481	1 014 349 096	133,81%	75,46%	329 888 156	202 814 524
	SO - Ministerstvo zdravotníctva SR	355 882 489	315 958 702	236 537 536	88,78%	66,47%	119 344 953	3 121 649
	SO - Ministerstvo kultúry SR	89 938 286	125 403 161	34 894 495	139,43%	38,80%	55 043 791	3 900 684
	SAFE	76 366 735						-
	Integrovaný regionálny operačný program (bez TP)	1 866 424 762	2 240 087 344	1 285 781 127	120,02%	68,89%	580 643 635	209 836 856
	Integrovaný regionálny operačný program (s TP)	1 935 724 762	2 311 403 163	1 347 464 382	119,41%	69,61%	588 260 380	209 888 655

Pozn.: Alokácie sú znížené o zdroje na SAFE

Riziká:

- ✗ **MIRRI SR - mierne riziko** – veľký objem nevyčerpanej alokácie
- ✗ **MZ SR – bez rizika**
- ✗ **MK SR – riziko** – veľa projektov s veľkým počtom VO - neukončené kontroly VO a zmenové konania – zmeny v projektoch v enormných objemoch kvôli nárastu cien a nedostupnosti viacerých tovarov na trhu; nezáujem prijímateľov pokračovať v projekte po skončení kovidovej doby, vysoký počet mimoriadnych ukončení projektov v REACT-EU a to najmä z dôvodu vysokej chybovosti vo VO a ďalej sa očakáva rozsiahle mimoriadne ukončovanie už zazmluvnených projektov zo strany prijímateľov; otvorenie zásobníka projektov a pristúpenie k nadkontrahovaniu. Vzhľadom na pomalú implementáciu bola k 30.6.2023 presunutá alokácia v objeme 18,30 mil. EUR do PO1 IROP.

Opatrenia v procese implementácie :

- ❖ **Využitie iniciatív EK – FAST CARE a SAFE** (podrobnejšie informácie v kap. 2.3 a 2.4) - **plní sa**

Iniciatíva FAST CARE sa implementuje prostredníctvom:

- Národného projektu, kde sa financujú výdavky štátneho sektora v súvislosti s poskytovaním pomoci utečencom – zazmluvnená suma 117,10 mil. EUR.

2. Dopytovo-orientovanej výzvy pre mestá a obce na financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov – alokácia 126,92 mil. EUR.

SAFE - úhrada energií zraniteľným domácnostiam vo výške 76 mil. EUR; revízia IROP bola odoslaná na EK 30.06.2023.

- ❖ **Využitie nového FN cez SIH vo výške 51,4 mil. EUR** (úvery pre VÚC a mestá na financ. projektov) - **opatrenie zrealizované, čerpanie zrealizované**
- ❖ **Refundácia výdavkov na vakcíny vo výške 26 mil. EUR** - pripravovaný NP MZ SR - **plní sa**
26.06.2023 bolo vyhlásené vyzvanie na národný projekt.
- ❖ **Využitie nadkontrahovania, využitie zásobníka vo výzvach (ak relevantné)** - **plní sa**
- ❖ **Využitie inštitútov EK - fázovanie a nefunkčné projekty** - **plní sa**
- ❖ **Dodatočný príspevok (SUR+) - plní sa**
Obce a VÚC ako prijímatelia projektov IROP môžu požiadať o dodatočný príspevok s podmienkou, že projekt bol zazmluvnený po 20.03.2020.
Celkovo na SUR+ je k dispozícii 66 mil. EUR, zatiaľ bolo predložených 103 žiadostí o SUR+ v objeme 36 mil. EUR.
K 30.6.2023 bolo schválených 78 dodatočných príspevkov v objeme 27,2 mil. EUR.
Kompenzáciou rastu stavebných materiálov a surovín boli do konca júna 2023 zachránené rozvojové projekty obcí a VÚC v objeme 209,69 mil. EUR. Posúdením zvyšných 25 žiadostí o SUR+ v objeme 8,7 mil. EUR bude zachránených ďalších 37,8 mil. EUR. Zároveň sa na pokrytie rastu cien stavebných materiálov a surovín podarilo mobilizovať úspory v ďalších 26 projektoch v objeme 3,8 mil. EUR.
V prípade mobilizovania celej čiastky na SUR+ môžu byť zachránené projekty v celkovom objeme cca 515 mil. EUR.
- ❖ **Zjednodušenie a sprehľadnenie metodických usmernení v rámci operačného programu pre prijímateľov a žiadateľov** - **plní sa**
- ❖ **Optimalizovanie a stabilizácia administratívnych kapacít sekcie IROP, v náročnom období prelínania dvoch programových období ukončovania programového obdobia 2014-2020 a rozbehnutia programového obdobia 2021-2027** - **plní sa**
- ❖ **Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP** - **v príprave**
- ❖ **Usmernenie RO pre IROP pre prijímateľov k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP** - **plní sa**
- ❖ **Analýza spiacich projektov a projektov s rizikami implementácie a na základe jej výsledkov určenie, ktoré projekty a v akej výške sa nebudú realizovať** - **plní sa**

Nové opatrenie:


- ❖ Vzhľadom na vývoj implementácie, vykonanie rizikovej analýzy PO 3 a v prípade potreby uskutočnenie dodatočného presunu alokácie z PO 3 do prioritných osí IROP s absorpčnou kapacitou.

OP Ľudské zdroje – riadiaci orgán MPSVR SR

Alokácia:	2,99 mld. EUR (REACT-EU v objeme 383 mil. EUR)
Kontrahovanie:	3,10 mld. EUR (103,57 %)
Čerpanie k 30.06.2023:	2,52 mld. EUR (84,26 %)
Nárast čerpania za jún 2023:	14 mil. EUR (0,48 p.b.)
Potrebné vyčerpať:	472 mil. EUR, z toho:
✓ FAST CARE	41 mil. EUR (revízia schválená EK 19.12.2022)
✓ SAFE	0 mil. EUR (nesúhlas EK s presunom z PO 6 MRK)
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	431 mil. EUR – potenciál čerpania 649 mil. EUR

	Zazmluvnené projekty v realizácii			z toho spiace projekty			z toho fázované projekty			Potenciál čerpania z projektov po zohľadnení spiacich projektov a 2. fáz projektov
	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať 2. fáza	
OP ĽZ	2 698	1 603 817 696	696 040 288	190	46 886 141	46 886 141	-	-	-	649 154 147
MPSVR	1 574	1 040 017 209	451 255 753	33	5 107 815	5 107 815	-	-	-	446 147 938
MŠVVŠ SR	456	308 167 195	107 780 487	4	551 200	551 200	-	-	-	107 229 287
MV SR	668	255 633 292	137 004 048	153	41 227 126	41 227 126	-	-	-	95 776 922

Pozn.: Spiace projekty= projekty s dátumom účinnosti do 31.12.2021 a čerpaním 0 %

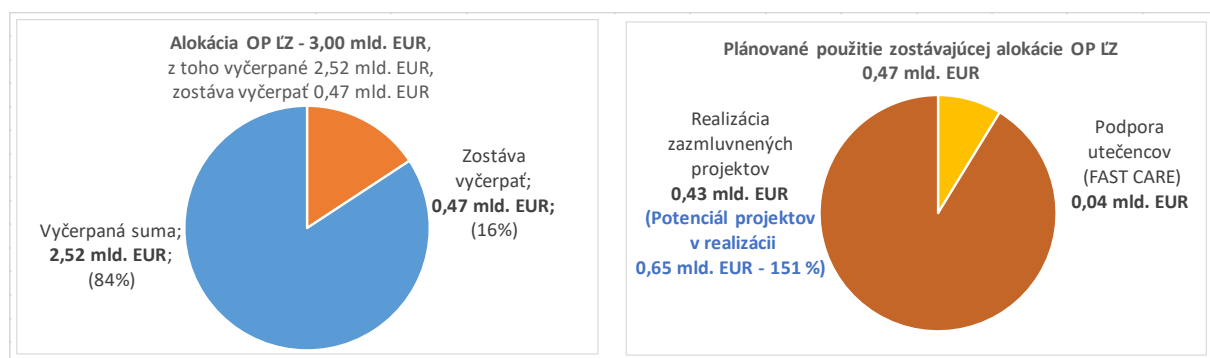

Program	Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024	Nárast čerpania za jún 2023
OP Ľudské zdroje	Zodpovedný rezort - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	2 160 489 587	2 244 535 989	1 876 645 852	103,89%	86,86%	283 843 735	145 539
	SO - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	373 762 595	400 541 603	315 385 724	107,16%	84,38%	58 376 871	4 589 225
	SO - Ministerstvo vnútra SR	371 762 462	367 368 193	244 560 151	98,82%	65,78%	127 202 311	8 395 994
	OP Ľudské zdroje (bez TP)	2 906 014 644	3 012 445 785	2 436 591 728	103,66%	83,85%	469 422 916	13 130 758
	OP Ľudské zdroje (s TP)	2 996 457 169	3 103 299 392	2 524 700 369	103,57%	84,26%	471 756 800	14 364 198

Riziká:

- ❖ **MPSVR SR – bez rizika**
- ❖ **MŠVVŠ SR – bez rizika**
- ❖ **MV SR – PO 5,8 bez rizika, PO6 MRK - vysoké riziko - problematická je PO 6 MRK financovaná z EFRR, čo znamená, že je obmedzený presun alokácie do inej PO; veľa malých infraštruktúrnych projektov v obciach s MRK, v rámci ktorých je vysoká chybovosť VO a problém s navýšením cien stavebných materiálov; mimoriadna ukončovanie projektov (EK odmietla presun na SAFE, čo by zmiernilo riziko dekomitmentu) – uvedené môže byť čiastočne riešené prostredníctvom finančných nástrojov implementovaných SIH cez projekt DoDo vo výške min. 25 mil. EUR, za predpokladu súhlasného stanoviska SIH a spoločnosti Dostupný Domov j.s.a.**

Realizované opatrenia:

- ❖ **Využitie iniciatívy EK FAST CARE - plní sa**
- ❖ **Využitie nadkontrahovania - plní sa**
- ❖ **Využitie finančných nástrojov na projekt DoDo v rámci PO 6 MRK vo výške minimálne 25 mil. EUR – v príprave**
- ❖ **Využitie inštitútov EK - fázovanie a nefunkčné projekty - plní sa**

- ❖ Využitie možnosti presunov alokácie medzi PO toho istého fondu a kategórie regiónov prostredníctvom revízie OP do 9/2023 - **v príprave**
- ❖ Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP - **v príprave**
- ❖ Analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK- **plní sa**
- ❖ Analýza spiacich projektov a na základe jej výsledkov určenie, ktoré projekty a v akej výške sa nebudú realizovať - **plní sa**


Nové opatrenie:

- ❖ Po zanalyzovaní maximálnej absorpčnej kapacity využitia finančných nástrojov na projekt DoDo v rámci PO 6 MRK (v spolupráci s ÚV SR, ÚSVRK, MPSVaR SR a SIH) a v prípade nevyužitia tohto nástroja, navrhnuť realokáciu finančných prostriedkov z PO 6 do iniciatívy SAFE, alebo FAST CARE v rámci revízie OP ĽZ.

OP Efektívna verejná správa – riadiaci orgán MV SR

Alokácia:	354 mil. EUR (REACT-EU v objeme 103 mil. EUR)
Kontrahovanie:	350 mil. EUR (98,67 %)
Čerpanie k 30.06.2023:	294 mil. EUR (82,80 %)
Nárast čerpania za jún 2023:	1,44 mil. EUR (0,41 p.b.)
Potrebné vyčerpať:	60,65 mil. EUR, z toho:
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	60,65 mil. EUR – potenciál čerpania 64,83 mil. EUR

	Zazmluvnené projekty v realizácii			z toho spiace projekty			z toho fázované projekty			Potenciál čerpania z projektov
	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať 2. fáza	
OP EVS	58	171 945 897	64 826 278	-	-	-	-	-	-	64 826 278

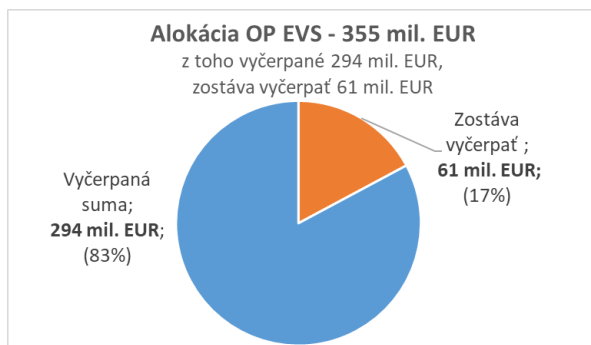

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		MATEMATICKÝ Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	37 730 586	216 577 040	107,81%	-15 684 856	170 109 817	84,68%	30 782 367
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	7 533 343	36 864 738	98,45%	581 603	27 957 265	74,66%	9 489 076
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	2 691 739	12 559 636	95,60%	578 336	12 016 451	91,46%	1 121 521
	PO 4 - REACT EU	RO: MV SR	ESF REACT-EU	103 178 940	0	83 921 649	81,34%	19 257 291	83 921 649	81,34%	19 257 291
	CELKOM OP EVS:			354 655 437	47 955 668	349 923 063	98,67%	4 732 374	294 005 182	82,90%	60 650 255

Riziká:

- ✖ **bez rizika** - 1 národný projekt (NP) z PO2 vo výške 6,24 mil. EUR bol v priebehu júna zazmluvnený, 1 NP z PO4 vo výške 19,25 mil. EUR je v štádiu prípravy (vyzvanie vyhlásené 15.05.2023). Sú to NP, pri ktorých nie je žiadne verejné obstarávanie a v rámci naplnenia cieľov projektov ide o spätnú refundáciu vzniknutých nákladov. Zaradenie schválených ŽoP do čerpania je naplánované v 3. a 4. kvartáli roku 2023. Kontrahovanie bude následne vo výške cca 104,4 %.


Realizované opatrenia:

- ❖ Využitie nadkontrahovania - **v príprave**
- ❖ Využitie 2. tranže REACT-EU cez národný projekt - **v príprave**
- ❖ Využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP - **v príprave**
- ❖ Analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK - **plní sa**
- ❖ Zvýšený dohľad nad implementáciou rizikových projektov, v rámci ktorých je prijímateľom ÚOŠS - **plní sa.**

PCS SK-AT – riadiaci orgán MIRRI SR

Alokácia:	76 mil. EUR
Kontrahovanie:	76 mil. EUR (100,34 %)
Čerpanie k 30.06.2023:	55 mil. EUR (72,24 %)
Nárast čerpania za jún 2023:	0,75 mil. EUR (0,98 p.b.)
Potrebné vyčerpať:	21 mil. EUR
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	21 mil. EUR – potenciál čerpania 28,93 mil. EUR

	Zazmluvnené projekty v realizácii			z toho spiace projekty			z toho fázované projekty			Potenciál čerpania z projektov
	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať 2. fáza	
SK-AT	37	58 502 444	28 927 422	-	-	-	-	-	-	28 927 422

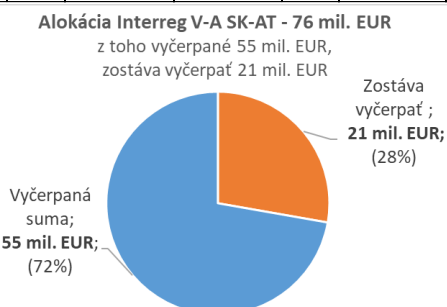

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	722 402	19 583 359	99,49%	17 333 925	88,06%
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	29 376 079	1 806 594	30 237 383	102,93%	17 514 681	59,62%
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	8 098 921	403 708	8 070 050	99,64%	5 703 219	70,42%
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	590 791	13 786 718	97,22%	10 097 023	71,20%
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	457 680	4 473 529	98,24%	4 174 830	91,68%
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	3 981 175	76 151 039	100,34%	54 823 678	72,24%

Riziká:

- ✗ **mierne riziko** - nízka úroveň čerpania v PO 2 (59,62 %) - v danej osi sa nachádza podstatný počet projektov, ktoré nie sú finančne ukončené alebo sú v implementácii a ešte budú v roku 2023 generovať výdavky; auditné zistenia na AT strane.


Opatrenia v procese implementácie:

- ❖ **Možnosť navýšenia intenzity EFRR na 85% - ako nástroj na maximálnu absorpciu v programe bolo zavedené, že nie všetky projekty boli zazmluvnené s maximálnou intenzitou.** V PO1 ide o 1 projekt, kde je potenciál absorpcie 928 tis. EUR. V PO2 ide o 4 projekty, kde je potenciál absorpcie 960 tis. EUR. RO iniciuje písomnú procedúru k navýšeniu intenzity EFRR
- ❖ **Využitie nadkontrahovania** - nadkontrahovanie na SK stane v rámci 4 projektov v PO2 (v súčasnosti 100,34%), kde ide o sumu 754 tis. EUR.
- ❖ **V predložených žiadostiach o platbu a zoznamoch deklarovaných výdavkov je potenciál čerpania 18 mil. EUR.** Okrem toho je 8 projektov stále v realizácii s potenciálom čerpania do 9,5 mil. EUR.
- ❖ **Dôsledný monitoring projektov zo strany Riadiaceho orgánu**
- ❖ **Využitie možnosti 15 % flexibility čerpania v rámci OP** (680 tis. EUR sa plánuje presunúť do PO5 „Technická pomoc“)
- ❖ **Odoslanie námietok zo strany AT k návrhu správy z auditu, ktorej finálna verzia sa očakáva 9-10/2023.**

PCS SK-CZ– riadiaci orgán MIRRI SR

Alokácia:	90 mil. EUR
Kontrahovanie:	91 mil. EUR (101,14 %)
Čerpanie k 30.06.2023:	71 mil. EUR (79,10 %)
Nárast čerpania za jún 2023:	1,62 mil. EUR (0,98 p.b.)
Potrebné vyčerpať:	19 mil. EUR
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	19 mil. EUR – potenciál čerpania 26,74 mil. EUR

	Zazmluvnené projekty v realizácii			z toho spiace projekty			z toho fázované projekty			Potenciál čerpania z projektov
	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať 2. fáza	
SK-CZ	53	44 555 742	26 735 875	-	-	-	-	-	-	26 735 875

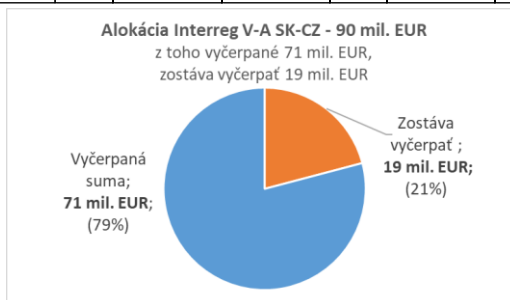

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	12 842 129	885 955	12 646 829	98,48%	10 679 832	83,16%
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	64 360 938	4 185 882	65 676 613	102,04%	50 015 168	77,71%
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	7 528 029	501 295	7 477 883	99,33%	5 775 546	76,72%
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	697 186	5 369 715	99,29%	4 831 637	89,34%
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	6 270 318	91 171 040	101,14%	71 302 184	79,10%

Riziká:

- ✖ **bez rizika** – zazmluvnenie schválených ŽoNFP vo výzve v PO2 zabezpečí nadkontrahovanie na úrovni približne **103,86%**, čo vytvára predpoklad vyčerpania alokácie programu. V rámci týchto nových projektov sa budú realizovať časovo a technicky nenáročné projektové aktivity, pričom prijímatelia už vo fáze zazmluvňovania realizujú VO.


Opatrenia v procese implementácie:

- ❖ **Využitie nadkontrahovania**, pričom v súčasnosti je nadkontrahovanie na úrovni 101,14 % (predpoklad navýšenia na 104 %)
- ❖ **Využitie možnosti presunov alokácií v rámci revízie OP do 9/2023**. Zmena finančného plánu už bola schválená MV 14.6.2023 a bude súčasťou pripravovanej revízie na EK (presun 2,52 mil. eur z PO1 a PO3 do PO2).
- ❖ **Vyhlásenie „rýchloobrátkovej“ výzvy (02/2023), schvaľovanie projektov sa uskutočnilo na zasadnutí MV 14.6.2023** (časovo a technicky nenáročné projektové aktivity na drobný mobiliár a propagáciu), čo zabezpečí vyššie nadkontrahovanie až na úroveň **103,86%**. MV schválil **navýšenie finančných prostriedkov na výzvu č. SK-CZ/2023/15** do sumy rovnakej celkovej výšky navrhnutých ŽoNFP na schválenie – schválené boli projekty v sume 2,3 mil. eur (EÚ zdroj)
- ❖ **V predložených žiadostiach o platbu a zoznamoch deklarovaných výdavkov v rámci ITMS2014+ je 4,7 mil. EUR**, ktoré vstúpia do čerpania v nasledujúcich mesiacoch
- ❖ **Plánované je vyhlásenie výzvy v rámci technickej pomoci**
- ❖ **Dôsledný monitoring projektov zo strany MIRRI**
- ❖ **Využitie možnosti 15 % flexibility čerpania medzi PO pri finálnom vyúčtovaní OP** (plánujú sa projekty v rámci PO4 „Technická pomoc“).

OP Rybné hospodárstvo – riadiaci orgán MPRV SR

Alokácia:	7,7 mil. EUR
Kontrahovanie:	3,1 mil. EUR (40,26 %)
Čerpanie k 30.06.2023:	2,5 mld. EUR (32,10 %)
Nárast čerpania za jún 2023:	0 EUR
Potrebné vyčerpať:	5,3 mil. EUR
✓ Realizácia zazmluvnených projektov:	5,3 mil. EUR – potenciál čerpania len 0,2 mil. EUR

	Zazmluvnené projekty v realizácii			z toho spiace projekty			z toho fázované projekty			Potenciál čerpania z projektov
	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať	Počet	Zazmluvnená suma	Ostáva vyčerpať 2. fáza	
OP RH	9	1 053 330	202 281	-	-	-	-	-	-	202 281

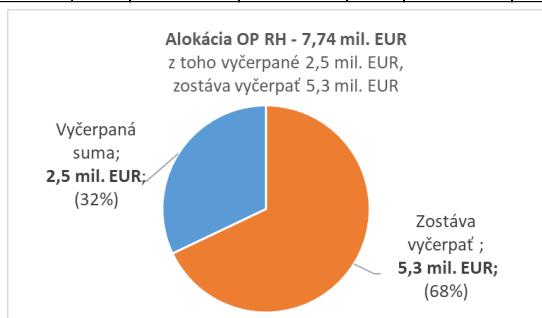

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inováčná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	ENFR	4 030 730	1 343 577	1 527 592	37,90%	2 503 138	1 034 913	25,68%
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	ENFR	589 680	104 862	78 918	13,38%	510 762	40 743	6,91%
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	ENFR	2 312 492	770 831	682 058	29,49%	1 630 434	605 891	26,20%
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	267 898	806 798	100,39%	-3 104	801 777	99,76%
	CELKOM OP RH:			7 736 596	2 487 168	3 095 366	40,01%	4 641 230	2 483 325	32,10%

Riziká:

- ✗ **vysoké riziko** - dlhodobá problémová implementácia (dekomitment každý rok a aj strata výkonnostnej rezervy) – **odhadované nedočerpanie zvyšku alokácie je 2,5 – 5 mil. EUR**
- ✗ V prípade, že 14 prijatých ŽoNFP nebude v dostatočnej kvalite a nedôjde k ich schváleniu a zazmluvneniu, môže byť maximálne odhadované nedočerpanie programu na konci PO až vo výške 5 mil. EUR (**k 17.7.2023 bolo už pri 4 zo 14 prijatých ŽoNFP zastavené konanie**). Pri 3 ŽoNFP bolo vydané Rozhodnutie o schválení, zvyšné ŽoNFP sú v odbornom hodnotení.
- ✗ Nesplnenie plánovaných hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca na konci PO môže viesť k ďalším korekciám pri ukončovaní programu.
- ✗ Pretrvávajúci problém s neobsadenými administratívnymi kapacitami, nevyhnutnými na efektívnejšiu implementáciu aj s výhľadom na nové programové obdobie.

Realizované opatrenia:

- ❖ **Včasný vyhodnotenie prijatých ŽoNFP s predpokladom čerpania 1,5 mil. EUR tak, aby sa ukončila realizácia aktivít projektov do 31.12.2023 - plní sa**
- ❖ **Dočerpanie ešte neukončených projektov vo výške cca 150 tis. EUR.- plní sa**

Navrhované opatrenie:

- ❖ **Stabilizácia a posilnenie administratívnych kapacít.**

Tento OP patrí medzi najhoršie implementované programy v EÚ.

1.2 Stav implementácie podľa jednotlivých rezortov bez prioritných osí technickej pomoci

Viaceré rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov podieľajú a sú zodpovedné, či už ako RO alebo SO, za implementáciu celého, resp. časti OP. Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad o stave kontrahovania a čerpania celej alokácie, ktorej implementáciu zabezpečuje príslušný rezort, ako aj prehľad objemov finančných prostriedkov, ktorých čerpanie je potrebné zabezpečiť za jednotlivé rezorty do konca programového obdobia 2014 – 2020.

Tabuľka č. 4: Stav implementácie v rozdelení po rezortoch k 30.06.2023 - súhrnne za rezorty

Rezort/OP	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj) (bez SAFE)	Alokácia SAFE	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (EÚ zdroj)	% kontrahovania (bez SAFE)	% čerpania (bez SAFE)	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (bez SAFE) (alokácia - čerpanie)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	834 458 095		923 909 540	632 701 460	110,72%	75,82%	201 756 635
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP EVS, OP KŽP)	931 935 962		896 097 321	683 254 658	96,15%	73,32%	248 681 304
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 042 579 124		2 156 258 417	1 890 160 623	105,57%	92,54%	152 418 501
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 116 319 683	76 366 735	2 792 049 653	1 502 855 454	131,93%	71,01%	613 464 229
Ministerstvo dopravy SR (OP II)	3 105 676 947	574 818 551	3 745 699 139	2 372 146 535	120,61%	76,38%	733 530 412
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 160 489 587		2 244 535 989	1 876 645 852	103,89%	86,86%	283 843 735
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 361 217 081	387 885 361	1 530 794 214	1 010 642 463	112,46%	74,25%	350 574 618
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (OP RH)	6 932 902		2 288 568	1 681 547	33,01%	24,25%	5 251 355
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	355 882 489		315 958 702	236 537 536	88,78%	66,47%	119 344 953
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	89 938 286		125 403 161	34 894 495	139,43%	38,80%	55 043 791


Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Tabuľka č. 5: Prehľad čerpania jednotlivých rezortov k 30.06.2023 (bez prioritných osí TP a alokácie na SAFE) – zoradené podľa % čerpania

Rezort	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj) (bez SAFE)	Alokácia SAFE	čerpanie k 30.06.2023	% čerpania alokácie (bez SAFE)	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (bez SAFE)
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 042 579 124		1 890 160 623	92,54%	152 418 501
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LŽ)	2 160 489 587		1 876 645 852	86,86%	283 843 735
Ministerstvo dopravy SR (OP II)	3 105 676 947	574 818 551	2 372 146 535	76,38%	733 530 412
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LŽ)	834 458 095		632 701 460	75,82%	201 756 635
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 361 217 081	387 885 361	1 010 642 463	74,25%	350 574 618
Ministerstvo vnútra SR (OP LŽ, OP KŽP, OP EVS)	931 935 962		683 254 658	73,32%	248 681 304
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 116 319 683	76 366 735	1 502 855 454	71,01%	613 464 229
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	355 882 489		236 537 536	66,47%	119 344 953
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	89 938 286		34 894 495	38,80%	55 043 791
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (OP RH)	6 932 902		1 681 547	24,25%	5 251 355

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

Graf č. 4: Zostáva vyčerpať podľa rezortov k 30.06.2023 – zoradené podľa objemu zdrojov, ktoré zostáva vyčerpať (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE)

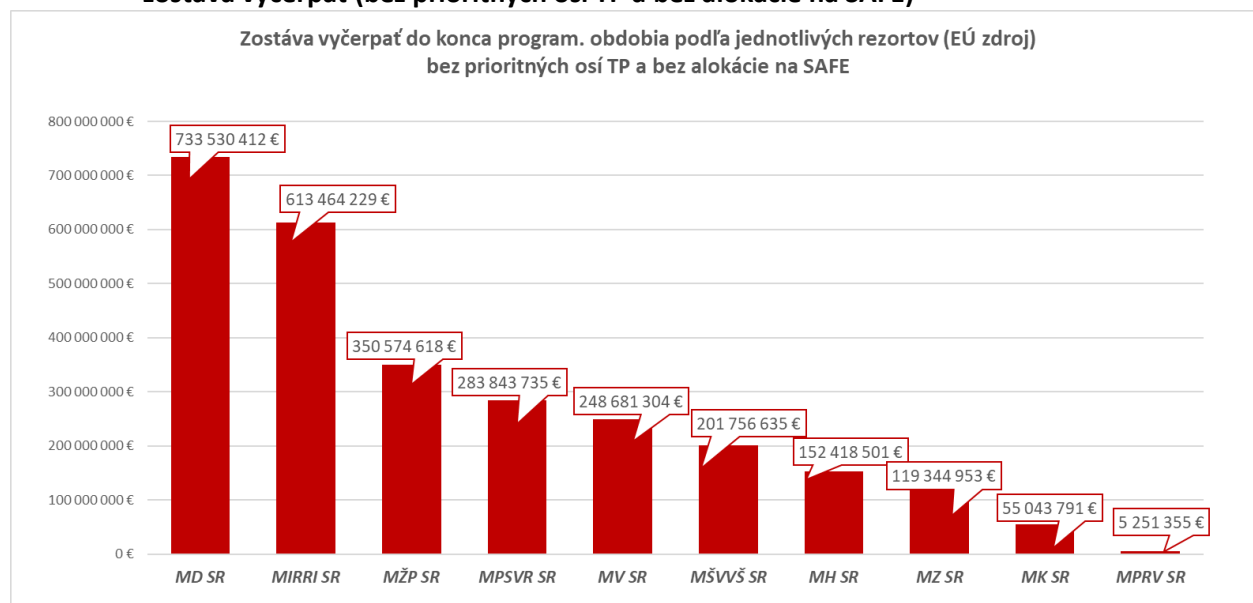

Do konca programového obdobia zostáva rezortom vyčerpať ešte **2,76 mld. EUR** (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE).

Najviac zostáva vyčerpať (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE) za rezorty:

- **MD SR (733,53 mil. EUR)**, čo predstavuje 23,62 % alokácie,
- **MIRRI SR (613,46 mil. EUR)**, čo predstavuje 28,99 % alokácie,
- **MŽP SR (350,57 mil. EUR)**, čo predstavuje 25,75 % alokácie.

2. Využitie nových iniciatív Európskej komisie – stav k 30.06.2023

2.1 Implementácia opatrení na eliminovanie dopadov pandémie COVID-19

Na zabezpečenie financovania výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 Európska komisia spracovala dva balíky legislatívnych opatrení, tzv. Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) z 30.03.2020 a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) z 23.04.2020. MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19, vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov** a v tejto súvislosti **naplánovalo realokáciu 1,25 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF. Na základe negociácií s EK bol objem finančných prostriedkov znížený na **1,105 mld. EUR**.

Uznesením vlády SR č. 257/2020 z 28.04.2020 bol schválený materiál *“Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov”*, ktorý vo významnej miere prispel k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a k jej opätovnému naštartovaniu.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP IZ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP IZ)**

Z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,338 mld. EUR (121,09 %), zazmluvnených 1,290 mld. EUR (116,72 %) a vyčerpaných 1,150 mld. EUR (104,09 %).

Tabuľka č.6: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 30.06.2023

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Fond	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Podpora udržania zamestnanosti	OP IZ	ESF	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	405 870 548	98,93%	406 005 668	98,96%
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	EFRR	117 300 000	6	131 866 238	112,42%	84	111 857 122	95,36%	62 403 911	53,20%
	OPII	EFRR	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	33	97 222 152	111,75%	52 114 326	59,90%
	Celkom:	EFRR	204 300 000	9	238 806 238	116,89%	117	209 079 274	102,34%	114 518 237	56,05%
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	EFRR	330 200 000	1	480 323 000	145,46%	4	491 339 000	148,80%	477 241 000	144,53%
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	EFRR	51 000 000	1	62 937 210	123,41%	4	56 566 474	110,91%	54 640 597	107,14%
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP IZ	ESF	109 300 000	5	95 772 496	87,62%	5	127 016 977	116,21%	97 892 792	89,56%
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)			1 105 062 575	18	1 338 101 520	121,09%	132	1 289 872 273	116,72%	1 150 298 294	104,09%
z toho EFRR			585 500 000	11	782 066 448	133,57%	125	756 984 748	129,29%	646 399 833	110,40%
z toho ESF			519 562 575	7	556 035 072	107,02%	7	532 887 525	102,56%	503 898 461	96,99%
Ostatné opatrenia	PRV	EPFRV		1	14 780 000		166	2 717 273		2 683 143	
	OP IZ	ESF		3	41 243 563		3	34 991 373		19 594 768	
	OP II	EFRR		4	113 640 340		4	84 378 240		23 799 909	
	IROP	EFRR		1	3 000 000		2	400 000		0	
	Celkom:			9	172 663 903		175	122 486 887		46 077 820	
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)			1 105 062 575	27	1 510 765 423	136,71%	307	1 412 359 160	127,81%	1 196 376 114	108,26%
z toho EFRR				16	898 706 788	153,49%	131	841 762 989	143,77%	670 199 742	114,47%
z toho ESF				10	597 278 635	114,96%	10	567 878 898	109,30%	523 493 229	100,76%
z toho EPFRV				1	14 780 000		166	2 717 273		2 683 143	

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 03.07.2023 o 7:00hod.), RO OP IZ a PRV

2.2 Implementácia REACT-EU

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je **3. balíček podpory EK – REACT-EU v celkovej hodnote 745,18 mil. EUR**, o ktorú sa navýšila finančná obálka programového obdobia 2014 – 2020 (odhadovaná suma v júli 2020 bola vyššia - cca 780 mil. EUR). Zdroje sa členským krajinám prideliť v dvoch fázach. V prvej fáze v roku 2021 bola SR **v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia EK z 12.02.2021 pridelená suma 616 mil. EUR**. V druhej fáze bola SR **v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia EK z 23.11.2021 pridelená suma 129 mil. EUR** (oproti pôvodne odhadovaným 164 mil. EUR).

V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí 23.09.2020, ako aj na základe následných negácií s Európskou komisiou a riadiacimi orgánmi, je podpora z REACT-EU zameraná najmä na:

v rámci OP IZ:

- ✓ zabezpečenie aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest,
- ✓ poskytovanie sociálnych služieb občanom vrátane terénnej práce a komunitnej starostlivosti,
- ✓ zvyšovanie odolnosti zdravotníckeho systému,
- ✓ podporu dištančného vzdelávania na školách

v rámci IROP:

- ✓ pomoc regiónom pri financovaní zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra),
- ✓ zateplňovanie bytových domov,
- ✓ zvýšenie kapacít základných škôl,
- ✓ zvýšenie kvality odborného vzdelávania
- ✓ presun časti alokácie na iniciatívu SAFE

v rámci OP EVS:

- ✓ finančná podpora zamestnancov v prvej línii ako sú zdravotníci, policajti a hasiči

v rámci OP FEAD:

- ✓ distribúcia potravinových balíčkov na pomoc najodkázanejším osobám.

Z dostupnej alokácie 722,25 mil. EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach REACT-EU sprístupnených 818,39 mil. EUR (113,31%), zazmluvnených 707,36 mil. EUR (97,94%) a vyčerpaných 351,13 mil. EUR (48,62 %).

Tabuľka č. 7: Prehľad implementácie REACT-EU k 30.06.2023

Operačný program		Rezort	Fond	Alokácia REACT-EU (navýšenie k 08.07.2022)	Platné výzvy/vyzvania - alokácia				Kontrahovanie			Čerpanie		Zostáva nakontrahovať	Zostáva vyčerpať
				EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	
Operačný program Ľudské zdroje	bez TP	MŠVVŠ SR	ESF	26 266 591	2	26 269 197	100,01%	2	26 266 591	100,00%	3 654 572	13,91%	0	22 612 019	
		MPSVR SR		326 081 537	14	365 028 708	111,94%	851	315 557 910	96,77%	165 811 998	50,85%	10 523 627	160 269 539	
		MV SR		19 100 000	2	25 192 000	131,90%	215	18 096 643	94,75%	14 134 466	74,00%	1 003 357	4 965 534	
		OP IZ bez TP:		371 448 128	18	416 489 905	112,13%	1 068	359 921 144	96,90%	183 601 036	49,43%	11 526 984	187 847 092	
	TP	MPSVR SR		11 046 495	1	11 046 495	100,00%	1	11 045 951	100,00%	7 463 231	67,56%	544	3 583 264	
		MV SR		796 030	1	796 030	100,00%	1	795 678	99,96%	590 505	74,18%	352	205 525	
	Celkom	TP OP IZ		11 842 525	2	11 842 525	100,00%	2	11 841 629	99,99%	8 053 736	68,01%	896	3 788 789	
		MŠVVŠ SR		26 266 591	2	26 269 197	100,01%	2	26 266 591	100,00%	3 654 572	13,91%	0	22 612 019	
		MPSVR SR		337 128 032	15	376 075 203	111,55%	852	326 603 861	96,88%	173 275 230	51,40%	10 524 171	163 852 802	
		MV SR		19 896 030	3	25 988 030	130,62%	216	18 892 321	94,96%	14 724 970	74,01%	1 003 709	5 171 060	
				Spolu	383 290 653	20	428 332 430	111,75%	1 070	371 762 772	96,99%	191 654 772	50,00%	11 527 881	191 635 881
	Integrovaný regionálny operačný program	bez TP		MIRRI SR	EFRR	137 265 649	12	256 151 406	186,61%	269	223 055 776	162,50%	73 148 054	53,29%	-85 790 127
MIRRI SR - presun na SAFE			76 366 735												
MK SR			14 850 600	1		21 842 816	147,08%	150	21 778 260	146,65%	292 897	1,97%	-6 927 660	14 557 703	
IROP bez TP:			228 482 984	13		277 994 222	121,67%	419	244 834 035	107,16%	73 440 951	32,14%	-16 351 051	155 042 033	
TP		MIRRI SR	7 300 000	6		7 523 702	103,06%	31	6 837 503	93,66%	2 115 270	28,98%	462 497	5 184 730	
		MIRRI SR	220 932 384	18		263 675 108	119,35%	300	229 893 279	104,06%	75 263 324	34,07%	-8 960 895	145 669 060	
Celkom		MK SR	14 850 600	1		21 842 816	147,08%	150	21 778 260	146,65%	292 897	1,97%	-6 927 660	14 557 703	
		Spolu	235 782 984	19		285 517 924	121,09%	450	251 671 539	106,74%	75 556 221	32,04%	-15 888 555	160 226 763	
Operačný program Efektívna verejná správa		MV SR	ESF	103 178 940		2	104 541 649	101,32%	1	83 921 649	81,34%	83 921 649	81,34%	19 257 291	19 257 291
REACT-EU celkom bez TP				703 110 052	33	799 025 776	113,64%	1 488	688 676 828	97,95%	340 963 635	48,49%	14 433 224	362 146 417	
TP REACT-EU:				19 142 525	8	19 366 227	101,17%	33	18 679 132	97,58%	10 169 006	53,12%	463 393	8 973 519	
REACT-EU Celkom:				722 252 577	41	818 392 003	113,31%	1 521	707 355 960	97,94%	351 132 642	48,62%	14 896 617	371 119 935	
z toho EFRR - REACT-EU				235 782 984	19	285 517 924	121,09%	450	251 671 539	106,74%	75 556 221	32,04%	-15 888 555	160 226 763	
z toho ESF - REACT-EU				486 469 593	22	532 874 079	109,54%	1 071	455 684 421	93,67%	275 576 421	56,65%	30 785 172	210 893 172	

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 03.07.2023 o 7:00 hod.), MF SR

2.3 Implementácia FAST-CARE

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

SR plánuje využiť disponibilné zdroje EŠIF v objeme **315,26 mil. EUR** v rámci **3 operačných programov**:

Integrovaný regionálny operačný program (alokácia 244,01 mil. EUR)

- ✓ financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov
- ✓ refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s poskytovaním pomoci utečencom
- ✓ **revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou**

OP Ľudské zdroje (alokácia 41,25 mil. EUR)

- ✓ podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce a poskytovanie sociálnych služieb
- ✓ **revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou**

OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR)

- ✓ podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pomoci pri zmierňovaní dopadov migračnej krízy
- ✓ poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok pre žiakov na nákup IT techniky
- ✓ **revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou**

Z dostupnej alokácie 315,26 mil. EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 317,56 mil. EUR (100,73 %), zazmluvnených 266,61 mil. EUR (84,57 %) a vyplatených 131,17 mil. EUR (41,61 %). Od 31.05.2023 sa zvýšilo kontrahovanie o 252,43 mil. EUR a čerpanie o 130,98 mil. EUR.

➤ Implementované v rámci OP Ľudské zdroje

1. **NP „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“ (ÚPSVR)** s alokáciou **3,44 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 02.02.2023**, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **18.04.2023**. Zazmluvnená suma predstavuje **3,44 mil. EUR** za EÚ zdroj.
2. **NP „Pomáhame odídencom – poradenstvo“ (ÚPSVR)** zameraný na začlenenie a integráciu na trh práce prostredníctvom poskytovania poradenských služieb s alokáciou **5,67 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 02.02.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **15.04.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **6,87 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo už vyplatených **192 347 EUR**.
3. **NP „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“ (MPSVR SR)** zameraný na aktívne začlenenie odídencom z Ukrajiny do slovenskej spoločnosti s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie ich zamestnateľnosti s alokáciou **849 000 EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 08.02.2023**. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **13.06.2023**, zazmluvnená suma predstavuje **769 926 EUR** za EÚ zdroj.
4. **NP „Pomáhame odídencom“ (ÚPSVR)** zameraný na poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávanie, podporu mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie odídencom z Ukrajiny s alokáciou po navýšení **8,28 mil. EUR** – vyzvanie bolo **vyhlásené 08.02.2023**. Zmluva o

poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 15.04.2023, zazmluvnená suma predstavuje 8,28 mil. EUR za EÚ zdroj.

5. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ zameraný na poradenstvo zo strany mimovládnych organizácií, týkajúce sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti a zabezpečovanie rôznych aktivít a programov s alokáciou 13 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023. Zazmluvnená suma predstavuje 13 mil. EUR za EÚ zdroj.
6. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“ - zameraný na poskytovanie finančných prostriedkov pre samosprávy na zrealizované humanitárne a integračné aktivity v prospech odídencom z Ukrajiny s alokáciou 12,69 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 15.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 12,69 mil. EUR za EÚ zdroj.

➤ Implementované v rámci Integrovaného regionálneho OP

1. Výzva „Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine“ určená pre 1 463 miest a obcí a zameraná na refundáciu zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s indikatívnou alokáciou 126,92 mil. EUR bola vyhlásená 14.03.2023. Na túto výzvu bolo prijatých 1 438 ŽoNFP v sume NFP 126,34 mil. EUR. Uzavretých je 181 zmlúv v objeme 74,85 mil. EUR. Z tejto sumy bolo už vyplatených 15,45 mil. EUR.
2. NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ zameraný na zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky s indikatívnou alokáciou 117,10 mil. EUR - vyzvanie bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 117,10 mil. EUR. Z tejto sumy bolo už vyplatených 115, 53 mil. EUR.

➤ Implementované v rámci OP Integrovaná infraštruktúra

1. NP „Digitálny príspevok pre žiakov UA“ zameraný na zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov utekajúcich z Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia s indikatívnou alokáciou 8,61 mil. EUR. Vyzvanie na NP bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 24.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 8,61 mil. EUR za EÚ zdroj.
2. NP „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ zameraný na podporu odborných kapacít poskytujúcich odborné služby osobám utekajúcim z Ukrajiny s indikatívnou alokáciou 21,00 mil. EUR - vyzvanie bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 21 mil. EUR.

Tabuľka č. 8: Prehľad implementácie FAST-CARE k 30.06.2023

Operačný program	Rezort	Fond	Alokácia FAST-CARE	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	ESF	11 245 000	2	13 956 535	124,11%	2	15 153 001	134,75%	192 347	1,71%
		EFRR	30 000 000	4	29 983 763	99,95%	4	29 904 684	99,68%	0	0,00%
			41 245 000	6	43 940 298	106,53%	6	45 057 685	109,24%	192 347	0,47%
OP Integrovaná infraštruktúra	MIRRI SR	EFRR	30 000 000	2	29 610 000	98,70%	2	29 610 000	98,70%		0,00%
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	EFRR	244 014 456	2	244 014 456	100,00%	182	191 944 256	78,66%	130975000	53,68%
Celkom			315 259 456	10	317 564 754	100,73%	190	266 611 941	84,57%	131 167 347	41,61%
z toho EFRR			304 014 456	8	303 608 219	99,87%	188	251 458 940	82,71%	130 975 000	43,08%
z toho ESF			11 245 000	2	13 956 535	124,11%	2	15 153 001	134,75%	192 347	1,71%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 03.07.2023 o 7:00 hod), MF SR

2.4 Implementácia SAFE

Na riešenie problémov spojených s extrémnym nárastom cien energií prijala EK **iniciatívu SAFE** (schválená Nariadením EP a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023). EK umožňuje poskytnúť **pomoc pri úhrade nákladov na spotrebu energie v prípade zraniteľných domácností** a využiť tak zostávajúce nevyčerpané zdroje EŠIF.

Na základe analýzy bola ako najvhodnejšie opatrenie pre podporu v rámci iniciatívy SAFE identifikovaná kompenzácia zvýšených nákladov na dodávky plynu, prípadne elektriny pre zraniteľné domácnosti. Zdroje SAFE budú použité na **preplatenie kompenzácií** rozdielu medzi trhovou cenou energie a limitom určeným vládou Slovenskej republiky, ktoré sú poskytované **dodávateľom energií** aktuálne zo štátneho rozpočtu.

Keďže legislatíva SR stanovuje len definíciu zraniteľného odberateľa bol v podmienkach Slovenska pripravený návrh **definície zraniteľnej domácnosti**. Návrh bol spracovaný na podklade štatistického zisťovania Rodinné účty, ktoré realizuje ŠÚ SR v súlade s metodológiou a odporúčaniami Eurostatu.

Za zraniteľnú je považovaná domácnosť, ktorej ekvivalentný čistý príjem

- a) nepresahuje hranicu 80. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských domácností, alebo
- b) nepresahuje hranicu 85. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských domácností a aspoň jeden člen domácnosti patrí do niektorej z nasledujúcich kategórií zraniteľných skupín:
 1. nezaopatrené dieťa,
 2. osoba neschopná pracovať z dôvodu dlhodobých zdravotných ťažkostí,
 3. starobný dôchodca,
 4. osoba vo veku 65 rokov alebo vyššom.

Na základe zisťovania Rodinné účty dosiahol 80. percentil rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských domácností v roku 2020 hodnotu 1 061 EUR a 85. percentil hodnotu 1 142 EUR.

Definícia zraniteľnej domácnosti, ktorá bude aplikovaná v rámci iniciatívy SAFE, bola **prekonzultovaná s Európskou komisiou a schválená uznesením vlády SR č. 217/2023** z 12. mája 2023.

V zmysle uvedenej definície dosahuje **podiel zraniteľných domácností** na výdavkoch všetkých slovenských domácností **79,2 % v prípade výdavkov na plyn a 79,5 % v prípade výdavkov na elektrinu**. Tieto hodnoty budú použité na identifikovanie podielu kompenzácií oprávnených na financovanie prostredníctvom Iniciatívy SAFE.

Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými cenami a regulovanými cenami pri dodávkach plynu zraniteľným domácnostiam prostredníctvom Iniciatívy SAFE bola vypracovaná v spolupráci MIRRI SR, MF SR, MPSVR SR a MH SR a po konzultácii s Orgánom auditu 05.05.2023 bola oficiálne predložená EK. **EK zaslala 24.05.2023 MIRRI SR stanovisko, že súhlasí s predloženou metodikou**. Metodika bude formálne vydaná po aktualizácii štatistických údajov zo zisťovania Rodinné účty za r. 2022.

Opatrenia SAFE budú realizované prostredníctvom **národných projektov** prijímateľa – MH SR, ktorý bude jediným prijímateľom pre všetky OP. Kompenzácie budú vyplatené v 2. fázach. **Prvá platba sa uskutoční v priebehu r. 2023** na základe spotreby zaslanej MH SR od dodávateľov energií. **Druhá (zúčtovacia) platba sa uskutoční v r. 2024** na základe skutočnej spotreby energií podľa vykonaných mimoriadnych odpočtov prevádzkovateľov distribučných sústav (pre plyn aj elektrinu), určenej pre každé odberné miesto.

Alokácie na energokrízu boli aktualizované zo strany dotknutých RO a RO OP II, RO OP KŽP a RO IROP avizujú aktuálne vyčleniť 1,04 mld. EUR. Legislatíva EK umožňuje presunúť nevyčerpané zdroje až do výšky **1,45 mld. EUR**, čo v prípade potreby vytvára priestor presunúť ešte dodatočných 410 mil. EUR.

V zmysle úlohy C.5 uznesenia vlády SR č. 806/2022 aktualizácia finančnej alokácie EŠIF vyčlenenej na opatrenia SAFE bola uskutočnená k 21.07.2023.

Po zohľadnení presunov finančných prostriedkov na energokrízu (1,04 mld. EUR) predstavuje suma, ktorú je potrebné vyčerpať 2,79 mld. EUR (t. j. 19,2 % z alokácie EŠIF). Objem fin. prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať po zohľadnení presunu časti finančných prostriedkov na energokrízu za jednotlivé OP je nasledovný:

Tabuľka č. 9: Prehľad realokácií na energokrízu podľa jednotlivých OP

Operačný program	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024 (alokácia - čerpanie)	Plánovaná realokácia na energokrízu	Zostáva vyčerpať po realokácii na energokrízu
OP Integrovaná infraštruktúra	1 712 353 376	574 818 551	1 137 534 825
OP Kvalita životného prostredia	947 336 495	387 885 361	559 451 134
Integrovaný regionálny OP	588 260 380	76 366 735	511 893 645
OP Ľudské zdroje	471 756 800	-	471 756 800
OP Efektívna verejná správa	60 650 255		60 650 255
PS Interreg V-A SK-AT	21 069 003		21 069 003
PS Interreg V-A SK-CZ	18 837 279		18 837 279
OP Technická pomoc	4 911 791		4 911 791
OP Rybné hospodárstvo	5 253 271		5 253 271
Program spolupráce INTERACT III	277 213		277 213
EŠIF bez PRV:	3 830 705 863	1 039 070 647	2 791 635 216

Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR), RO

Tabuľka č. 10: Prehľad realokácií na energokrízu podľa rezortov

Rezort	Plánovaná realokácia na energokrízu
MŽP SR	387 885 361
MIRRI SR	276 366 735
MD SR	150 000 000
MH SR	150 000 000
MŠVVaŠ SR	74 818 551
MPSVR SR	0
MV SR	0
MZ SR	0
MK SR	0
Rezorty spolu	1 039 070 647

Zdroj: RO

Pod koordináciou MIRRI SR sa v rámci pracovnej skupiny SAFE uskutočnila príprava revízií 3 OP, z ktorých sú vyčleňované zdroje na SAFE. 30.03.2023 bola monitorovacím výborom schválená revízia OP KŽP, 30.6.2023 bola zverejnená správa o hodnotení v rámci procesu strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. SEA na pripomienkové konanie a verejné prerokovanie. Po ukončení procesu SEA bude OP KŽP predložený na schválenie EK najneskôr **do 30.9.2023**, čo je v zmysle legislatívy EU hraničný termín. Dňa 30.06.2023 boli oficiálne prostredníctvom SFC systému odoslané Európskej komisii revízie OP II a IROP (schválené MV 29.5.2023 a 30.6.2023) **s vytvorenými prioritnými osami pre implementáciu iniciatívy SAFE a vyčlenenými alokáciami v prospech iniciatívy SAFE vo výške 574 818 551 EUR z OP II a 76 366 735 EUR z IROP.**

V priebehu júna prebiehala neformálna komunikácia s EK ohľadom pripravených revízií pred ich oficiálnym predložením. V dňoch **29.06.2023** sa uskutočnilo v poradí **13.** a **20.07.2023** už **14.**

zasadnutie Pracovnej skupiny SAFE (PS SAFE), ktorá bola vytvorená za účelom koordinácie implementácie SAFE v SR. PS SAFE je koordinovaná MIRRI SR, pričom sú v nej zastúpené RO/SO vyčleňujúce zdroje na SAFE, ako aj zástupcovia MF SR, SZEÚ a ÚRSO. Boli vypracované **zábery národných projektov a vzorový model hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie projektov SAFE**.

Riadiace orgány OP KŽP (13.07.2023) a OP II (17.07.2023) spustili proces pripomienkovania a následne schvaľovania národných projektov „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ a „ Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE)“ s alokáciami 387 885 348 EUR a 574 818 539 EUR prostredníctvom relevantných monitorovacích výborov.

Metodika SAFE bola rozšírená o možnosť kompenzácie výdavkov na elektrinu pre prípad, ak by zdroje vyčlenené na SAFE prevyšovali objem potrebný na kompenzáciu výdavkov na plyn a v súčasnosti prebieha konzultácia s orgánom auditu k metodike. Taktiež boli pripravené návrhy podrobného harmonogramu implementácie SAFE od vyhlásenia vyzvaní národných projektov pre 3 poskytujúce RO cez ich schválenie, zazmluvnenie, až po predloženie žiadostí o platbu, ku ktorým aktuálne prebiehajú trilaterálne stretnutia za účasti všetkých riadiacich orgánov (MD SR, MŽP SR, MIRRI SR a CO).

3. Plány čerpania na roky 2023 a 2024 podľa rezortov

Jednotlivé RO a SO v januári 2023 zaslali plán mesačného kontrahovania a čerpania na roky 2023 až 2024 (t.j. do konca programového obdobia) po jednotlivých prioritných osiach (a gestoroch).

Tabuľka č. 11 sumarizuje plány čerpania jednotlivých rezortov na roky 2023 – 2024.

V zmysle usmernenia MF SR k ukončeniu programového obdobia 2014 – 2020 „Prijímateľ môže uhradiť výdavky v období oprávnenosti, a to najneskôr do 31. decembra 2023. Riadiaci orgán pristúpi k úprave termínov spracovania žiadostí o platbu prijímateľa tak, aby boli zaradené do poslednej súhrnnej žiadosti o platbu a predložené certifikačnému orgánu najneskôr v druhom marcovom termíne v roku 2024.“

- Plán čerpania v roku 2023 je na úrovni 3,16 mld. EUR.
- Plán čerpania v roku 2024 (do marca) je na úrovni 935,84 mil. EUR.
- Plán čerpania SAFE je spolu 1,04 mld. EUR.

Tabuľka č. 11: Plán čerpania jednotlivých rezortov na roky 2023 a 2024 (bez prioritných osí technickej pomoci)

Rezort	Program	Prioritná os/SO	Alokácia (EÚ zdroj)	čerpanie k 31.12.2022	plán čerpania v roku 2023	plán čerpania v roku 2024 (do marca)	plán čerpania spolu 2023+2024
			EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
			A	B	C	D	E=C+D
MŠVVŠ SR	OP IZ	SO - MŠVVŠ SR (PO1+PO8)	373 762 595	269 500 453	97 825 895	3 484 513	101 310 409
	OP II	SO - MŠVVŠ SR (PO9+PO10)	460 695 500	262 805 431	189 315 705	22 580 071	211 895 776
		MŠVVŠ SR celkom (bez TP)	834 458 095	532 305 884	287 141 601	26 064 584	313 206 185
MV SR	OP IZ	SO - MV SR (PO5+PO6+PO8)	371 762 462	215 432 829	113 259 245	31 000 000	144 259 245
	OP KŽP	SO - MV SR (PO3)	191 546 962	151 927 006	28 668 168	10 951 788	39 619 956
	OP EVS	RO - MV SR (bez TP)	341 517 465	273 990 968	46 996 574	19 924 241	66 920 815
		MV SR celkom (bez TP)	904 826 889	641 350 803	188 923 987	61 876 029	250 800 016
MH SR	OP II	SO - MH SR (PO9+PO10+PO11+PO12)	1 254 806 311	1 134 380 304	287 515 177	89 536 691	377 051 867
	OP KŽP	SO - MH SR (PO4)	814 881 886	596 880 235	200 044 124	17 957 526	218 001 651
		MH SR celkom (bez TP)	2 069 688 197	1 731 260 539	487 559 301	107 494 217	595 053 518
MIRRI SR	OP II	SO - MIRRI SR (PO7)	456 940 302	155 860 406	232 258 739	73 643 866	305 902 605
	IROP	RO - MIRRI SR vrátane 7 VUC a 8 KM ako SO (PO1+PO2+PO4+P	1 359 642 252	756 069 887	512 568 269	91 004 096	603 572 365
	SAFE IROP	SAFE IROP	76 366 735	0	18 903 571	57 463 164	76 366 735
	OP TP	RO - MIRRI SR	159 071 912	148 449 117	7 585 356	3 037 439	10 622 795
	SK-CZ	RO - MIRRI SR (bez TP)	84 731 096	58 635 509	16 138 447	9 957 140	26 095 587
	SK-AT	RO - MIRRI SR (bez TP)	71 339 121	45 320 667	11 597 170	14 421 284	26 018 454
		MIRRI SR celkom (bez TP)	2 208 091 418	1 164 335 586	799 051 552	249 526 989	1 048 578 540
MD SR	OP II	RO - MD SR (PO1+PO2+PO3+PO4+PO5+PO6)	3 105 676 947	2 125 283 834	764 338 664	215 527 168	979 865 832
	SAFE OP II	SAFE OP II	574 818 551	0	574 818 551	0	574 818 551
		MD SR celkom (bez TP)	3 680 495 498	2 125 283 834	1 339 157 215	215 527 168	1 554 684 383
MPSVR SR	OP IZ	RO - MPSVR SR (PO2+PO3+PO4+PO8+PO10+PO11+PO12)	2 160 489 587	1 802 601 184	273 152 114	95 139 149	368 291 263
		MPSVR SR celkom (bez TP)	2 160 489 587	1 802 601 184	273 152 114	95 139 149	368 291 263
MŽP SR	OP KŽP	RO - MŽP SR (PO1+PO2+PO3+PO6)	1 361 217 081	970 402 668	247 133 567	143 680 846	390 814 413
	SAFE KŽP	SAFE KŽP	387 885 361	0	0	387 885 361	387 885 361
		MŽP SR celkom (bez TP)	1 749 102 442	970 402 668	247 133 567	531 566 207	778 699 774
MPRV SR	OP RH	RO - MPRV SR (bez TP)	8 583 034	1 681 547	893 846	0	893 846
		MPRV SR celkom (bez TP)	8 583 034	1 681 547	893 846	0	893 846
MZ SR	IROP	SO - Ministerstvo zdravotníctva SR (PO2)	340 477 489	200 813 029	82 672 593	56 991 867	139 664 460
		MZ SR celkom (bez TP)	340 477 489	200 813 029	82 672 593	56 991 867	139 664 460
MK SR	IROP	SO - Ministerstvo kultúry SR (PO3+PO7)	89 938 286	25 245 403	49 811 871	37 006 871	86 818 742
		MK SR celkom (bez TP)	89 938 286	25 245 403	49 811 871	37 006 871	86 818 742
SAFE spolu			1 039 070 647	0	593 722 122	445 348 525	1 039 070 647
EŠIF	EŠIF celkom (bez TP, bez SAFE)		14 046 150 935	9 195 280 477	3 161 775 523	935 844 557	4 097 620 080
	EŠIF celkom (bez TP)		14 046 150 935	9 195 280 477	3 755 497 645	1 381 193 082	5 136 690 727

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), RO/SO, Certifikačný orgán (MF SR)

Plán čerpania za celý EŠIF na rok 2023 je vo výške 3 161 775 523 EUR.

Plnenie plánu čerpania za EŠIF k 30.06.2023 je nasledovné:

- skutočné čerpanie v roku 2023 je **1,075 mld. EUR**, t. j. **34,01 %** z ročného plánu
- **plán čerpania za prvých päť mesiacov 2023 bol vo výške 948,53 mil. EUR**
- plnenie plánu čerpania **za prvých šesť mesiacov 2023** bolo vo výške **113,35 %**
- **plnenie kumulatívneho plánu čerpania za celý EŠIF bolo k 30.06.2023 vyššie oproti plánu o 126,66 mil. EUR.**

Z pohľadu plnenia **ročného plánu čerpania od 01.01.2023 do 31.12.2023** si podľa rezortov **do 30.06.2023** najlepšie/najhoršie viedli v plnení ročného plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MIRRI SR	45,74 %
2. MŠVVŠ SR	41,59 %
3. MH SR	33,17 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	0,00 %
2. MŽP SR	16,59 %
3. MK SR	19,80 %

Z pohľadu plnenia **plánu čerpania od 01.01.2023 do 30.06.2023** si podľa rezortov **k 30.06.2023** najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania za týchto šesť mesiacov nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MIRRI SR	212,42 %
2. MH SR	124,54 %
3. MZ SR	117,75 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	0,00 %
2. MK SR	58,06 %
3. MŽP SR	60,57 %

Príloha č. 1: Stav implementácie EŠIF podľa prioritných osí OP (k 30.06.2023, so zohľadnením SAFE presunov) - semafor

Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		MATEMATICKY Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKY Zostáva vyčerpať
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MŠVVŠ SR	ESF	347 496 004	374 275 012	107,71%	-26 779 008			311 652 633	89,69%	35 843 371
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MPSVR SR	ESF+IZM	172 270 942	173 858 171	100,92%	-1 587 229			166 613 609	96,72%	5 657 333
	PO 3 - Zamestnanosť	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MPSVR SR	ESF	1 326 222 796	1 362 182 724	102,71%	-35 959 928			1 255 355 419	94,66%	70 867 377
	PO 4 - Sociálne začlenenie	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MPSVR SR	ESF	294 669 312	347 879 499	118,06%	-53 210 187			289 073 717	98,10%	5 595 595
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MV SR	ESF	161 954 885	162 720 569	100,47%	-765 684			143 830 493	88,81%	18 124 392
	PO 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MŕK	●	obmedzený presun alokácie do inej PO; veľa malých infraštruktúrnych projektov v obciach s MŕK, v rámci ktorých je vysoká chybovosť VO a problém s navýšením cien stavebných materiálov; mimoriadna ukončovanie projektov (EK odmieta presun na SAFE, čo by znížilo riziko dekomitentu) – uvedené môže byť čiastočne riešené prostredníctvom finančných nástrojov implementovaných SIH cez projekt DoDo do výšky 25 mil. EUR,	SO: MV SR	EFRR	190 707 577	186 550 981	97,82%	4 156 596			85 924 263	45,06%	104 783 314
	PO 7 - Technická pomoc	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	79 011 978	100,52%	-411 978			79 886 553	101,64%	-1 286 553
	PO 8 - REACT-EU	●	ESF projekty; nadkontrahovanie, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	371 448 128	359 921 144	96,90%	11 526 984			183 949 246	49,52%	187 498 882
	PO 9 - Technická pomoc REACT-EU	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525	11 841 629	99,99%	896			8 222 088	69,43%	3 620 437
	PO 10 - CARE - ESF	●	refundácia výdavkov na pomoc utečencom pre MPSVR SR, ÚPSVR, NGO a samosprávu	RO: MPSVR SR	ESF	11 245 000	15 153 001	134,75%	-3 908 001			192 347	1,71%	11 052 653
	PO 11 - CARE - EFRR	●	refundácia výdavkov na pomoc utečencom pre MPSVR SR, ÚPSVR, NGO a samosprávu	RO: MPSVR SR	EFRR	30 000 000	29 904 684	99,68%	95 316			0	0,00%	30 000 000
	CELKOM OP LZ					2 996 457 169	3 103 299 392	103,57%	-106 842 223	15 779 792		2 524 700 369	84,26%	471 756 800
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (po zohľadnení SAFE a vnútorných presunov medzi PO, revízia 16.0 v príprave)		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKY Zostáva vyčerpať
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	●	zazmluvnené projekty v realizácii, zásobníky projektov, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	KF	775 839 166	984 561 147	126,90%	-208 721 981			659 643 812	85,02%	116 195 354
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	●	zazmluvnené projekty v realizácii, zásobníky projektov, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	KF	1 052 500 000	1 144 218 922	108,71%	-91 718 922			977 363 843	92,86%	75 136 157
	PO 3 - Verejná osobná doprava	●	zazmluvnené projekty v realizácii (plánované dodávky elektrických a trolejbusov pre BA, refundácia výdavkov na VP Električka do Petržalky), zásobníky projektov, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	KF	399 337 000	528 312 431	132,30%	-128 975 431			232 682 484	58,27%	166 654 516
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	●	nedávno zazmluvnené projekty v realizácii, v rámci ktorých sa budú refundovať už zrealizované aktivity (modernizácia plaveb. komôr v Gabčíkove a rehabilitačné opatrenia na Dunaji); zásobníky projektov, možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	KF	39 463 000	51 415 458	130,29%	-11 952 458			3 308 658	8,38%	36 154 342
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	●	zazmluvnené projekty v realizácii, zásobníky projektov, skokové čerpanie sa očakáva v roku 2023 po dodávkach vozňov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	EFRR	343 951 749	351 122 085	102,08%	-7 170 336			179 915 684	52,31%	164 036 065
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	●	zazmluvnené projekty v realizácii, zásobníky projektov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	RO: MD SR	EFRR	494 586 032	686 069 096	138,72%	-191 483 064			319 232 054	64,55%	175 353 978
	PO 7 - Informačná spoločnosť	●	pomalá a meškajúca implementácia projektov na strane prijímateľov; zostáva vyčerpať ešte viac ako 49 % alokácie	SO: MIRRI SR	EFRR	426 940 302	650 767 400	152,43%	-223 827 098			217 226 841	50,88%	209 713 461
	PO 8 - Technická pomoc	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MD SR	EFRR	86 915 000	83 752 138	96,36%	3 162 862			72 749 774	83,70%	14 165 226
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	●	riziková realizácia projektov; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	776 862 395	946 716 667	121,86%	-169 854 272			678 986 859	87,40%	97 875 536
	PO 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	●	riziková realizácia veľkého projektu ACCORD v gescii MŠVVŠ SR – ostáva vyčerpať ešte 26,35 mil. EUR (48 %) a aktuálne je prešetrovaná kauza prijatia uplatku koordinátorom projektu na UK (pozastavené platby zo strany EK boli s výnimkou identifikovaného problematického VO opäť uvoľnené); MŠVVŠ zároveň rieši s EK možné navýšenie alokácie z dôvodu navýšenia cien – projekt má byť ukončený do 2023; možnosť presunov medzi PO a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MŠVVŠ SR MH SR	EFRR	106 915 015	106 558 286	99,67%	356 729			76 761 963	71,80%	30 153 052
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	●	čerpanie finančných nástrojov antikrizová záruka	SO: MH SR	EFRR	723 537 672	723 344 382	99,97%	193 290			694 153 065	95,94%	29 384 607
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	●	čerpanie finančných nástrojov antikrizová záruka	SO: MH SR	EFRR	108 186 729	104 534 753	96,62%	3 651 976			117 884 282	108,96%	-9 697 553
	PO 13 - Technická pomoc Val	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	SO: MŠVVŠ SR MH SR	EFRR	70 085 000	67 442 094	96,23%	2 642 906			67 674 915	96,56%	2 410 085
	PO 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE)	●	- refundácia miezd zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pri pomoci pri zmiernení dopadov migračnej krízy - poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok pre žiakov na nákup IT techniky	SO: MIRRI SR	EFRR	30 000 000	29 610 000	98,70%	390 000			0	0,00%	30 000 000
	PO 15 - SAFE	●	refundácia výdavkov ŠR na kompenzáciu cien energií	RO: MD SR		574 818 551	0	0,00%	574 818 551			0	0,00%	574 818 551
	CELKOM OP II					6 009 937 611	6 458 424 860	107,46%	-448 487 249	4 098 463		4 297 584 235	71,51%	1 712 353 376
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKY Zostáva vyčerpať
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	UPRAVENÝ I. (zohľadňujú sa len fondy a kat. reg za OP.)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	●	nie je možný presun alokácie do inej PO s absorpčnou kapacitou (EFRR); implementácia je postavená na veľkom množstve menších investičných projektov, ktorú sú ovplyvnené COVIDom a nárastom cien stavebných materiálov; problémová implementácia projektov rezortných organizácií; dlhotrvajúci proces VO	SO: SAŽP	KF	1 212 742 900	1 355 981 363	111,81%	-143 238 463			923 784 312	76,17%	288 958 588
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	●	nie je možný presun alokácie do inej PO s absorpčnou kapacitou (EFRR); implementácia je postavená na veľkom množstve menších investičných projektov, ktorú sú ovplyvnené COVIDom a nárastom cien stavebných materiálov; problémy v procese prípravy projektov (vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov); problémová implementácia projektov rezortných organizácií; dlhotrvajúci proces VO	SO: SAŽP	KF	123 234 000	153 309 866	124,41%	-30 075 866			75 879 114	61,57%	47 354 886
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	●	zazmluvnené projekty v realizácii; možnosť presunu alokácie do PO 4 a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	212 868 686	87,28%	31 027 530			167 684 812	68,75%	76 211 404
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	●	zazmluvnené projekty v realizácii (NP Zelená domácnostiam); veľká absorpčná kapacita, možnosť presunu alokácie z PO 3 a využitia 15 % flexibility medzi PO	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	798 472 267	101,36%	-10 699 454			639 690 189	81,20%	148 082 624
	PO 5 - Technická pomoc	●	mzdy, nákupy a soft aktivity	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	75 588 035	98,17%	1 411 965			78 156 368	101,50%	-1 156 368
	PO 6 - Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE	●	refundácia výdavkov ŠR na kompenzáciu cien energií	SO: SAŽP	KF	387 885 361	0	0,00%	387 885 361			0	0,00%	387 885 361
	CELKOM OP KŽP:					2 832 531 290	2 596 220 217	91,66%	236 311 073	236 311 073		1 885 194 795	66,56%	947 336 495

Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)				EÚ zdroj	EÚ zdroj	
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch		zazmluvnené projekty v realizácii	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	356 304 834	579 433 861	162,62%		-223 129 027		255 567 926	71,73%	100 736 908
	PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám		zazmluvnené projekty v realizácii; NP na refundáciu vakcín vo výške 26 mil. EUR	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	627 996 770	706 220 724	112,46%		-78 223 954		503 689 348	80,21%	124 307 422
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch		veľa projektov s veľkým počtom VO - neukončené kontroly VO a zmenové konania – zmeny v projektoch v enormných objemoch kvôli cenám a nedostupnosti viacerých tovarov na trhu; nezáujem prijímateľov pokračovať v projekte po skončení kovidovej doby, vysoký počet mimoriadnych ukončení projektov v REACT-EU a to najmä z dôvodu vysokej chybovosti vo VO a ďalej sa očakáva rozsiahle mimoriadne ukončovanie už zazmluvnených projektov zo strany prijímateľov, otvorenie zásobníka projektov a prístupenie k nadkontrahovaniu	SO: MK SR	EFRR	75 087 686	103 624 902	138,01%		-28 537 216		34 607 049	46,09%	40 480 637
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP		zazmluvnené projekty v realizácii	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	279 216 512	331 591 460	118,76%		-52 374 948		257 446 054	92,20%	21 770 458
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou		množstvo malých projektov, problémy s VO, niektoré sú ešte len v posudzovaní/ opatrením je nadkontrahovanie a realokácie a využitie 15 % flexibility medzi PO	RO: MIRRI SR	EFRR	55 321 520	82 438 107	149,02%		-27 116 587		30 600 020	55,31%	24 721 500
	PO 6 - Technická pomoc		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	64 478 315	104,00%		-2 478 315		59 567 993	96,08%	2 432 007
	PO 7 - REACT-EU		dodatočný balík, ktorý bol zazmluvnený v projektoch len koncom roka 2022 - ide o projekty realizované v roku 2023/opatrením je nadkontrahovanie	RO: MIRRI SR SO: MK SR	EFRR REACT-EU	152 116 249	244 834 035	160,95%		-92 717 786		72 895 730	47,92%	79 220 519
	PO 8 - Technická pomoc REACT-EU		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MIRRI SR	EFRR REACT-EU	7 300 000	6 837 503	93,66%		462 497		2 115 261	28,98%	5 184 739
	PO 9 - FAST CARE		refundácia výdavkov na pomoc utečencom pre štátnu správu a samosprávu/administratívne náročná implementácia cca 1500 projektov	RO: MIRRI SR	EFRR	244 014 456	191 944 256	78,66%		52 070 200		130 975 000	53,68%	113 039 456
	PO 10 - SAFE REACT EU		refundácia výdavkov ŠR na kompenzáciu cien energií/ revízia OP v procese aj s prípravou NP	RO: MIRRI SR		76 366 735	0	0,00%		76 366 735		0	0,00%	76 366 735
	CELKOM IROP:					1 935 724 762	2 311 403 163	119,41%		-375 678 401	0	1 347 464 382	69,61%	588 260 380
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)				EÚ zdroj	EÚ zdroj	
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS		zazmluvnené projekty v realizácii, prevažne národné projekty ÚOŠS, ale aj DOP pre VÚC/mesta/obce	RO: MV SR	ESF	200 892 184	216 577 040	107,81%		-15 684 856		170 109 817	84,68%	30 782 367
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva		ešte nenakontrahovaná celá alokácia - v príprave ešte zazmluvnenie 1 NP vo výške 6,24 mil. EUR (vyhlásené vyzvanie)	RO: MV SR	ESF	37 446 341	36 864 738	98,45%		581 603		27 957 265	74,66%	9 489 076
	PO 3 - Technická pomoc		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MV SR	ESF	13 137 972	12 559 636	95,60%		578 336		12 016 451	91,46%	1 121 521
	PO 4 - REACT EU		v príprave ešte zazmluvnenie 1 NP na 2. tranžu REACT-EU vo výške 19,25 mil. EUR, ktorým sa budú refundovať mzdy zamestnancov MV SR (vyzvanie bolo vyhlásené)	RO: MV SR	ESF REACT-EU	103 178 940	83 921 649	81,34%		19 257 291		83 921 649	81,34%	19 257 291
	CELKOM OP EVS:					354 655 437	349 923 063	98,67%		4 732 374	19 576 286	294 005 182	82,90%	60 650 255
Program	Priorita Únie	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)				EÚ zdroj	% z alokácie	
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach		ukončené prijímanie ŽoNFP, aktuálne sa vyhodnocuje 10 prijatých ŽoNFP s potenciálnym čerpaním vo výške 1,46 mil. EUR + dočerpanie realizovaných projektov už len vo výške cca 150 tis. EUR	RO: MPRV SR	ENFR	4 030 730	1 527 592	37,90%		2 503 138		1 034 913	25,68%	2 995 817
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP		ukončené prijímanie ŽoNF, žiadne projekty v procese hodnotenia a žiadny potenciál ďalšieho čerpania tejto PÚ	RO: MPRV SR	ENFR	589 680	78 918	13,38%		510 762		40 743	6,91%	548 937
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania		ukončené prijímanie ŽoNFP, aktuálne sa vyhodnocujú 4 prijaté ŽoNFP s potenciálnym čerpaním vo výške 1,35 mil. EUR	RO: MPRV SR	ENFR	2 312 492	682 058	29,49%		1 630 434		605 891	26,20%	1 706 601
	PÚ 7 - Technická pomoc		už vyčerpaná celá alokácia na TP	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	806 798	100,39%		-3 104		801 777	99,76%	1 917
	CELKOM OP RH:					7 736 596	3 095 366	40,01%		4 641 230	4 641 230	2 483 325	32,10%	5 253 271
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)				EÚ zdroj	EÚ zdroj	
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu		zazmluvňovanie projektov aj v roku 2023, krátky čas na dokončenie projektov/opatrením je realokácia a využitie 15 % flexibility medzi PO	RO: MIRRI SR	EFRR	12 842 129	12 646 829	98,48%		195 300		10 679 832	83,16%	2 162 297
	2. Kvalitné životné prostredie		zazmluvnenie projektov, nová výzva v roku 2023, kde dopyt je 3,2 mil. eur	RO: MIRRI SR	EFRR	64 360 938	65 676 613	102,04%		-1 315 675		50 015 168	77,71%	14 345 770
	3. Rozvoj miestnych iniciatív		zazmluvňovanie projektov aj v roku 2023, krátky čas na dokončenie projektov/opatrením je realokácia a využitie 15 % flexibility medzi PO	RO: MIRRI SR	EFRR	7 528 029	7 477 883	99,33%		50 146		5 775 546	76,72%	1 752 483
	4. Technická pomoc		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	5 369 715	99,29%		38 652		4 831 637	89,34%	576 730
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:					90 139 463	91 171 040	101,14%		-1 031 577	0	71 302 184	79,10%	18 837 279
Program	Prioritná os	Miera rizika nedočerpania alokácie prioritnej osi	Riziká/piliere čerpania	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Zostáva nakontrahovať	Čerpanie EŠIF		MATEMATICKÝ Zostáva vyčerpať (podľa novej leg.)
						EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)				EÚ zdroj	EÚ zdroj	
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu		najrizikovejšia je PO 2 - v danej osi sa nachádza podstatný počet projektov, ktoré nie sú finančne ukončené alebo sú v implementácii a ešte budú v roku 2023 generovať výdavky/opatreniami sú nadkontrahovanie, využitie 15 % flexibility čerpania v rámci OP, možnosť navýšenia intenzity EFRR na 85%	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	19 583 359	99,49%		99 783		17 333 925	88,06%	2 349 217
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity			RO: MIRRI SR	EFRR	29 376 079	30 237 383	102,93%		-861 304		17 514 681	59,62%	11 861 398
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení			RO: MIRRI SR	EFRR	8 098 921	8 070 050	99,64%		28 871		5 703 219	70,42%	2 395 702
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce			RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	13 786 718	97,22%		394 261		10 097 023	71,20%	4 083 956
	5. Technická pomoc		mzdy, nákupy a soft aktivity	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	4 473 529	98,24%		80 031		4 174 830	91,68%	378 730
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:					75 892 681	76 151 039	100,34%		-258 358	0	54 823 678	72,24%	21 069 003

Príloha č. 2: Predbežná sumarizácia fázovaných projektov z PO 2014 – 2020 do PO 2021 – 2027 – stav k 19.07.2023

Operačný program	Rezort	Počet projektov	Zazmluvnený objem (EÚ zdroj)	Čerpanie k 30.06.2023 (EÚ zdroj)	Zostáva vyčerpať do konca PO 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Plánované čerpanie do konca PO 2014 - 2020, t.j. 1. fáza projektu (EÚ zdroj)	Objem, ktorý sa bude fázovať, t.j. 2. fáza projektu (EÚ zdroj)	Plánované čerpanie 1. + 2. fáza (EÚ zdroj)
OP Integrovaná infraštruktúra	MD SR	10	597 540 898	126 679 127	470 861 771	217 530 881	341 489 294	559 020 175
	MIRRI SR	1	31 036 978	6 572 523	24 464 455	22 434 655	8 602 323	31 036 978
	MH SR	4	57 833 786	1 089 017	56 744 769	33 000 000	51 100 000	84 100 000
	MŠVVŠ SR	2	26 294 411	4 788 084	21 506 328	16 515 611	9 727 920	26 243 531
	Spolu OP II	17	712 706 073	139 128 750	573 577 323	289 481 147	410 919 537	700 400 684
OP Kvalita životného prostredia	MŽP SR	10	140 283 625	11 914 008	128 369 617	56 851 483	83 432 142	140 283 625
	MV SR	0	0	0	0	0	0	0
	SIEA	0	0	0	0	0	0	0
	Spolu OP KŽP	10	140 283 625	11 914 008	128 369 617	56 851 483	83 432 142	140 283 625
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	12	58 446 471	246 670	58 199 801	40 794 021	17 652 449	58 446 471
	MK SR	0	0	0	0	0	0	0
	MZ SR	0	0	0	0	0	0	0
	Spolu IROP	12	58 446 471	246 670	58 199 801	40 794 021	17 652 449	58 446 471
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	0	0	0	0	0	0	0
	MŠVVŠ SR	0	0	0	0	0	0	0
	MV SR	0	0	0	0	0	0	0
	Spolu OP ĽZ	0	0	0	0	0	0	0
OP Efektívna verejná správa	MV SR	0	0	0	0	0	0	0
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	0	0	0	0	0	0	0
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	0	0	0	0	0	0	0
OP Technická pomoc	MIRRI SR	0	0	0	0	0	0	0
OP Rybné hospodárstvo	MPRV SR	0	0	0	0	0	0	0
Spolu:		39	911 436 170	151 289 428	760 146 741	387 126 652	512 004 128	899 130 780

Pozn.:

OP ĽZ - MV SR - aktuálne nevedia určiť projekty na fázovanie, nakoľko tie, ktoré by pripadali do úvahy, nemajú schválené VO. Zároveň, rizikové projekty MŠ nebudú podporované v programovom období 2021 -2027. Presnejšie informácie ohľadom reálnej potreby fázovania budú mať uprostred stavebnej sezóny počas letných mesiacov.

Príloha č. 3: "Spiace projekty" v delení na OP a rezorty - stav k 30.06.2023 a zmena od 31.05.2023

(spiacie projekty = projekty s čerpaním 0 % a dátumom účinnosti zmluvy do 31.12.2020;
zoznam neobsahuje projekty plánované na fázovanie)

OP/rezort/zameranie projektu	Stav k 31.05.2023		Stav k 30.06.2023		Rozdiel	
	Počet projektov	Zazmluvnená suma = ostáva vyčerpať (EÚ zdroj)	Počet projektov	Zazmluvnená suma = ostáva vyčerpať - EÚ zdroj	Počet projektov	Zazmluvnená suma = ostáva vyčerpať - EÚ zdroj
Integrovaný regionálny OP	171	98 584 189,51	143	91 222 771,07	-28	-7 361 418,44
MIRRI SR	139	94 245 740,36	116	87 501 621,99	-23	-6 744 118,37
DOP	139	94 245 740,36	116	87 501 621,99	-23	-6 744 118,37
MK SR	32	4 338 449,15	27	3 721 149,08	-5	-617 300,07
DOP	32	4 338 449,15	27	3 721 149,08	-5	-617 300,07
OP Kvalita životného prostredia	23	16 527 054,76	20	14 860 966,53	-3	-1 666 088,23
MV SR	5	1 294 678,08	4	1 058 079,52	-1	-236 598,55
DOP	5	1 294 678,08	4	1 058 079,52	-1	-236 598,55
MŽP SR	5	11 367 636,65	5	11 367 636,65	0	0,00
DOP	5	11 367 636,65	5	11 367 636,65	0	0,00
SIEA	13	3 864 740,03	11	2 435 250,35	-2	-1 429 489,68
DOP	13	3 864 740,03	11	2 435 250,35	-2	-1 429 489,68
OP Ľudské zdroje	97	28 312 932,57	86	24 315 408,73	-11	-3 997 523,84
MPSVR	31	4 533 047,58	29	4 229 964,00	-2	-303 083,57
DOP	31	4 533 047,58	29	4 229 964,00	-2	-303 083,57
MŠVVŠ SR	5	554 380,16	4	551 200,36	-1	-3 179,80
DOP	5	554 380,16	4	551 200,36	-1	-3 179,80
MV SR	61	23 225 504,83	53	19 534 244,37	-8	-3 691 260,46
DOP	61	23 225 504,83	53	19 534 244,37	-8	-3 691 260,46
OP Integrovaná infraštruktúra	234	120 798 969,89	207	109 630 613,47	-27	-11 168 356,42
MD SR	1	78 370,00	2	884 167,96	1	805 797,96
NP	1	78 370,00	2	884 167,96	1	805 797,96
MH SR	67	31 228 865,64	59	28 393 495,29	-8	-2 835 370,34
DOP	67	31 228 865,64	59	28 393 495,29	-8	-2 835 370,34
MIRRI SR	166	89 491 734,25	146	80 352 950,22	-20	-9 138 784,03
DOP	159	29 093 959,42	139	22 564 774,77	-20	-6 529 184,65
NP	7	60 397 774,83	7	57 788 175,45	0	-2 609 599,38
SPOLU	525	264 223 146,72	456	240 029 759,80	-69	-24 193 386,92

Spiace projekty s účinnosťou zmluvy **do 31.12.2021** a s nulovým čerpaním

Stav k 30.06.2023		
OP/rezort/zameranie projektu	Počet projektov	Zazmluvnená suma = ostáva vyčerpať - EÚ zdroj
OP IROP	207	225 215 707
MIRRI SR	173	200 519 803
DOP	173	200 519 803
MK SR	29	21 033 842
DOP	29	21 033 842
MZ SR	5	3 662 063
DOP	5	3 662 063
OP KZP	96	60 608 719
MV SR	5	6 768 755
DOP	5	6 768 755
MŽP SR	29	35 940 536
DOP	29	35 940 536
SIEA	62	17 899 429
DOP	62	17 899 429
OP LZ	190	46 886 141
MPSVR	33	5 107 815
DOP	33	5 107 815
MŠVVŠ SR	4	551 200
DOP	4	551 200
MV SR	153	41 227 126
DOP	153	41 227 126
OPII	363	181 263 308
MD SR	3	6 720 309
NP	3	6 720 309
MH SR	184	70 462 803
DOP	184	70 462 803
MIRRI SR	176	104 080 196
DOP	169	46 292 020
NP	7	57 788 175
Celkový súčet	856	513 973 876

Príloha č. 4: Stanovenie rizík na úrovni RO a SO

vysoké riziko (platí kritérium a) a zároveň kritérium b) alebo c))

- a) **nemožnosť presunúť alokáciu v rámci OP** (týka sa PO6 OP LZ; OP RH; PO1 a PO2 OP KŽP – možnosť presunúť len do SAFE)
- b) **vysoký objem, ktorý je ešte potrebné vyčerpať** v porovnaní s celkovou vyčerpanou sumou (viac ako 30 % doteraz vyčerpanej sumy)
- c) **nízka alebo žiadna rezerva na čerpanie v zazmluvnených projektoch (tzv. buffer)** so zohľadnením plánovanej výšky 2. fáz projektov, oproti sume, ktorá zostáva vyčerpať

riziko (platí minimálne jedno kritérium alebo kombinácia)

- a) **auditné zistenia** (potvrdené) ktoré znížia úroveň čerpania, bez možnosti nahradenia výdavkov
- b) **vysoký objem, ktorý je ešte potrebné vyčerpať** v porovnaní s celkovou vyčerpanou sumou (minimálne na úrovni doterajšieho čerpania a vyšší)
- c) **nízka alebo žiadna rezerva na čerpanie v zazmluvnených projektoch (tzv. buffer)** so zohľadnením plánovanej výšky 2. fáz projektov, oproti sume, ktorá zostáva vyčerpať

mierne riziko (platí minimálne jedno kritérium)

- a) **vysoký objem, ktorý je ešte potrebné vyčerpať v absolútnom vyjadrení, avšak je vytvorená dostatočná rezerva na čerpanie** v zazmluvnených projektoch (tzv. buffer) so zohľadnením plánovanej výšky 2. fáz projektov, oproti sume, ktorá zostáva vyčerpať **a prijímajú sa ďalšie opatrenia na zvýšenie tejto rezervy** (napr. využitie SIH: MD SR - nákup repasovaných vozňov a MIRRI SR - úvery pre mestá a VÚC)
- b) **rizikové projekty, avšak prijímajú sa opatrenia na vytvorenie rezervy** (nadkontrahovanie)

bez rizika

- **predpoklad vyčerpania celej alokácie** - v prípade samostatných SO a ich PO v rámci OP môžu tieto PO potiahnuť čerpanie aj ostatných v rámci OP.
