

Informácia o stave implementácie európskych
štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020
a Programu Slovensko 2021 – 2027
k 30.06.2024

Obsah

1.	Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 30.06.2024	3
1.1	Stav implementácie podľa operačných programov	5
1.1.1.	Doplňujúca informácia k Programu rozvoja vidieka - riziko dekomitmentu 2024	6
1.2	Implementácia FAST-CARE (migračná kríza)	8
1.3	Implementácia SAFE (energokríza).....	9
2.	Implementácia Programu Slovensko 2021 – 2027 k 30.06.2024	10
2.1	Základná informácia	10
2.2	Aktuálny stav implementácie	12
2.2.1	Kľúčové kroky vykonané od 01.11.2023 do súčasnosti	12
2.2.2	Stav implementácie v rozdelení na rezorty	15
2.2.3	Priebežné vyhodnotenie plánov kontrahovania a čerpania rezortov (investičný plán) ...	16
2.3	Vybrané implementačné problémy/otázky.....	20
2.3.1	Preukazovanie podmienky DNSH v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie	20
2.3.2	Identifikácia disponibilných zdrojov na financovanie výdavkov spojených s odídencami z Ukrajiny.....	20
2.3.3	Presuny alokácií v rámci územia	21
2.3.4	Zreálnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov.....	22
2.4	Vyhodnotenie plnenia harmonogramu plánovaných výziev P SK za 2. kvartál 2024.....	23

1. Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 30.06.2024

V programovom období 2014 – 2020 sa implementujú fondy EÚ prostredníctvom 11 operačných programov, pričom za implementáciu a administratívne ukončenie každého operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán.

Informácia je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka 2014-2020 (PRV), ktorý je možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31.12.2025. Vzhľadom na aktuálny stav implementácie tohto programu uvádzame v časti 1.1.1 stručnú informáciu o PRV, aj o možnom riziku prepadnutia prostriedkov k 31.12.2024.

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR na realizáciu operačného programu. RO je podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 plne zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu vrátane administratívneho ukončenia, v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.

Rok 2024 je pre RO kľúčový na zabezpečenie riadneho ukončovania programov. RO v tejto fáze implementácie zabezpečili a zabezpečujú zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu na certifikačný orgán, výkon finančných kontrol na mieste, ukončovanie projektov, fázovanie niektorých projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí a všetky potrebné postupy pre úspešné ukončovanie programov. **Všetky úhrady výdavkov v rámci projektov v súlade s európskou legislatívou boli prijímatelia povinní zrealizovať dodávateľom do 31. decembra 2023.**

Uhrádzanie žiadostí o platbu prijímateľom na národnej úrovni, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov formou administratívneho ukončenia, bude reálne prebiehať aj v priebehu roka 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z RO na certifikačný orgán MF SR (posun termínu z marca 2024 nastal z dôvodu prijatia novej európskej legislatívy STEP – podrobnejšie v bode 9 kľúčových opatrení).

Z celkovej alokácie 14,50 mld. EUR je k 30.06.2024 vyčerpaných 15,35 mld. EUR (105,84 %) avšak po zohľadnení fondov a kategórií regiónov je potrebné pre 100 % využitie alokácie administratívne ukončiť ešte 37,25 mil. EUR (EÚ zdroj).

POKROK V IMPLEMENTÁCII OD 01.11.2023 DO 30.06.2024:

- ✓ bolo vyčerpaných spolu 3,08 mld. EUR, čo predstavuje nárast čerpania o 21,22 p. b., t. j. nárast z 84,62 % na 105,84 %.

Kľúčové opatrenia na dočerpanie celej alokácie sú:

1. skončiť administratívnu finančnú kontrolu predložených žiadostí o platby prijímateľmi projektov a zaradiť ich do posledných súhrnných žiadostí o platbu na MF SR a žiadostí o platbu na EK;
2. **SAFE** (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) - **RO vyčlenili 937 mil. EUR** na pomoc zraniteľným domácnostiam prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP. **V rámci tejto iniciatívy EK už bolo vyplatených celých 937 mil. EUR;**
3. **FAST CARE** (pomoc UA utečencom) – **339,56 mil. EUR** je presmerovaných na výdavky súvisiace s prvotným prijatím **UA utečencov** a ich integráciou do spoločnosti v rámci 3 OP, a to: IROP, OP LZ a OP II. **K 30.06.2024 bolo zazmluvnených 346,50 mil. EUR (102,04 %) a vyplatených 306,68 mil. EUR (90,32 %);**
4. **využívanie 15 % flexibility** čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci operačného programu/fondu/kategórie regiónu bez potreby realokácie;

5. **analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní** vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre uzavretie konaní do 30.06.2024 a následné deklarovanie oprávnených výdavkov na EK najneskôr v rámci záverečných žiadostí o platbu;
6. **využívanie fázovania** – možné rozdelenie projektov na 2 fázy, z ktorých druhá bude ukončená v programovom období 2021 – 2027 z Programu Slovensko 2021 – 2027. Jednotlivé RO a SO predložili k 27.05.2024 aktualizáciu zoznamu projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia alokácií na 1. a 2. fázu. Možnosť fázovania sa plánuje využiť v rámci 41 projektov, v zazmluvnenej výške 1,03 mld. EUR (EÚ zdroj), pričom **do 2. fázy sa plánuje presunúť 566 mil. EUR, ktoré nebudú čerpané z alokácie 2014 – 2020;**
7. **sfunkčnenie projektov, ktoré neboli do 31.12.2023 finančne ukončené, najneskôr do 15. februára 2027** (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa). Jednotlivé RO a SO predložili k 27.05.2024 aktualizovaný indikatívny zoznam tzv. nefunkčných projektov. Spolu je indikovaných 389 projektov, v zazmluvnenej výške 1,025 mld. EUR (EÚ zdroje), s odhadovaným nedočerpaním 224 mil. EUR. Pre ich sfunkčnenie bude potrebných 232 mil. EUR z vlastných zdrojov prijímateľov;
8. **využitie flexibilit v nariadení STEP** (schválené 29.02.2024), najmä:
 - a) **posun predloženia záverečnej dokumentácie na EK**, a teda vytvorenie dodatočného časového priestoru na spracovanie platieb prijímateľov a **súhrnných žiadostí o platbu**, ktoré môžu byť predložené na MF SR **aj v priebehu roka 2024, a to v závislosti od administrácie žiadostí o platbu na národnej úrovni v zmysle platných harmonogramov ukončovania.**

MF SR informovalo EK o predložení záverečných žiadostí o platbu na EK v druhom polroku 2024 a následnom spracovaní a predložení Účtov za 10. účtovný rok na EK v roku 2025.
 - b) **možnosť 100 % financovania zo zdrojov EÚ pre posledný 10. účtovný rok**, po posúdení stavu celkového čerpania, rizikových výdavkov a finančných opráv na úrovni operačných programov/prioritných osí a regiónov aktuálne prebieha v relevantných prípadoch schvaľovanie v rámci monitorovacích výborov.

1.1 Stav implementácie podľa operačných programov

Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 14,50 mld. EUR (oproti pôvodnej alokácii vo výške 13,78 mld. EUR došlo v rokoch 2021 – 2022 k navýšeniu o zdroje REACT-EU vo výške 722,25 mil. EUR).

➤ Výzvy/vyzvania

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 sprístupnili RO v **846 výzvach a vyzvaniach** pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 30.06.2024 finančné prostriedky vo výške **23,12 mld. EUR**, čo predstavuje **159,83 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

➤ Kontrahovanie

Úroveň **kontrahovania** všetkých fondov alokovaných pre SR (okrem Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ďalej len ako „EPFRV“) v rámci programového obdobia 2014 – 2020 dosiahla k 30.06.2024 hodnotu **15,35 mld. EUR**, čo predstavuje **105,88 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

➤ Čerpanie

K 30.06.2024 dosiahla SR za všetky fondy (okrem EPFRV) alokované pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni **15,35 mld. EUR**, čo predstavuje **105,84 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).


V rámci procesov ukončovania je ešte potrebné po zohľadnení fondov a kategórie regiónov administratívne ukončiť projekty v objeme 37,25 mil. EUR. Takéto administratívne ukončovanie je možné v priebehu roka 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z RO na MF SR.

Tabuľka č. 1: Stav implementácie jednotlivých OP k 30.06.2024

Operačný program	Zodpovedný rezort/orgán	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (EÚ zdroj)	% kontrahovania	% čerpania	Ostáva vyčerpať do konca PO z alokácie jednotlivých OP po zohľadnení fondov a kategórie regiónov
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	2 996 457 169	3 103 133 042	3 139 525 193	103,56%	104,77%	33 394 268
OP Integrovaná infraštruktúra	MD SR	6 009 937 611	6 481 893 335	6 309 735 207	107,85%	104,99%	-
OP Kvalita životného prostredia	MŽP SR	2 832 531 290	2 881 378 962	2 909 503 629	101,72%	102,72%	-
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	1 935 724 762	2 172 386 935	2 253 633 794	112,23%	116,42%	-
OP Efektívna verejná správa	MV SR	354 655 437	351 602 496	360 812 248	99,14%	101,74%	4 570
OP Technická pomoc	MIRRI SR	159 071 912	159 127 921	159 606 419	100,04%	100,34%	-
OP Rybné hospodárstvo	MPRV SR	7 736 596	4 603 507	4 164 715	59,50%	53,83%	3 571 881
PS Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	87 976 458	94 844 154	97,60%	105,22%	-
PS Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	73 007 017	77 107 116	96,20%	101,60%	-
Program spolupráce INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	39 115 381	100,00%	99,30%	277 213
EŠIF bez PRV		14 501 539 515	15 354 502 268	15 348 047 856	105,88%	105,84%	37 247 932

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Graf č. 1: Zostáva administratívne ukončiť do konca programového obdobia podľa OP k 30.06.2024

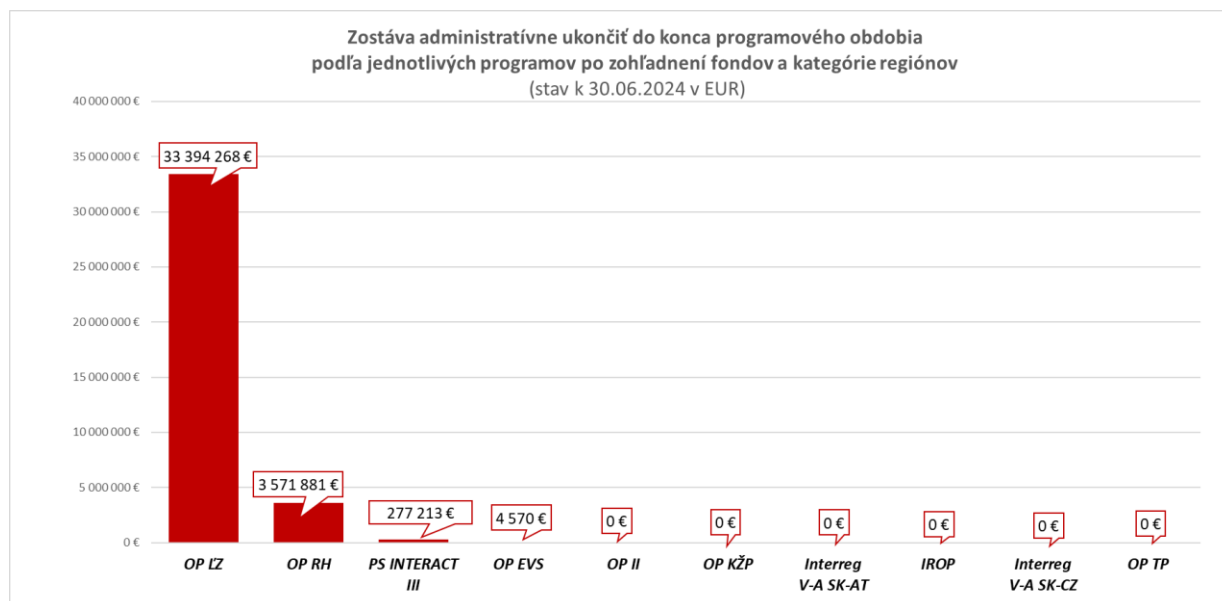

Zdroj údajov: MIRRI SR

Na národnej úrovni zostáva z celkovej alokácie po zohľadnení fondov a kategórie regiónov administratívne ukončiť ešte **37,25 mil. EUR**, z toho za OP LZ 33,39 mil. EUR.

1.1.1. Doplnujúca informácia k Programu rozvoja vidieka - riziko dekomitmentu 2024

PRV má vlastný Systém riadenia, vlastný orgán finančného riadenia, vlastný IS PPA a pre neprojektové opatrenia využíva Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS). **Systém riadenia EŠIF sa aplikuje na PRV len v oblasti spoločného monitorovania a hodnotenia EŠIF¹. Dohľad MIRRI SR nad PRV v období 2014-2020 je vykonávaný len čiastočne².**

Od 31.07.2021 sa v súlade s nariadením EÚ č. 2020/2220 predĺžilo programové obdobie PRV s možnosťou čerpania časti prostriedkov do 31.12.2025 a v tejto súvislosti bola **navýšená alokácia EPFRV** a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z **Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19** spolu vo výške 740,48 mil. EUR. Od 03.02.2022 sa v súlade s nariadením EÚ 2021/1017 znížila alokácia EPFRV na rok 2022 (presun 10 % z alokácie EPFRV na r. 2022 v prospech I. piliera SPP) vo výške 24,102 mil. EUR, to znamená, že **kumulatívne navýšenie predstavuje 716,38 mil. EUR**. Celková alokácia PRV predstavuje objem 2,28 mld. EUR.

Aktuálne je však potrebné upozorniť, že pre splnenie pravidla N+3 v roku 2024 ostáva v tomto programe od 01.06.2024 do 31.12.2024 vyčerpať ešte 298,48 mil. EUR, čo vzhľadom na stav

¹) Kapitola 1.2, ods. 1, písm. d) Systému riadenia EŠIF - **na poskytovanie príspevkov z EPFRV sa nevzťahujú ustanovenia Systému riadenia EŠIF s výnimkou tých častí, ktoré sledujú spoločné monitorovanie a hodnotenie na úrovni partnerskej dohody**, ustanovení o kompetenciách subjektov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy, a povinností vo vzťahu k **Pracovnej komisii pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory Únie a SR** a ustanovení súvisiacich s **posudzovaním výzvy**.

²) Nariadenie vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v znení nariadenia vlády č. 71/2018 Z. z.

implementácie v predchádzajúcich mesiacoch a rokoch možno považovať za veľmi vysoký objem (čerpanie v roku 2023 bolo 152 mil. EUR).

Tabuľka č. 2: Stav implementácie PRV k 31.05.2024 a potrebné vyčerpať do konca 2024

Operačný program	Zodpovedný rezort/orgán	Alokácia 2014 - 2022 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (EÚ zdroj)	% kontrahovania	% čerpania	Ostáva vyčerpať do konca 2024
Program rozvoja vidieka	MPRV SR	2 276 074 822	1 886 549 945	1 441 666 691	82,89%	63,34%	298 483 058

Zdroj údajov: MPRV SR

1.2 Implementácia FAST-CARE (migračná kríza)

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. SR vyčlenila disponibilné zdroje EŠIF v celkovom objeme **339,56 mil. EUR** v rámci **3 operačných programov, tak ako je uvedené v tab. č. 3.**

Integrovaný regionálny operačný program (alokácia 244,01 mil. EUR)

- ✓ financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov
- ✓ refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s pomocou utečencom
- ✓ **revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou**

OP Ľudské zdroje (alokácia 65,55 mil. EUR)

- ✓ podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce a poskytovanie sociálnych služieb
- ✓ **revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou (29.09.2023 bola Európskej komisii predložená revízia s navýšenou alokáciou o 24,3 mil. EUR)**

OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR)

- ✓ podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pomoci pri zmierňovaní dopadov migračnej krízy
- ✓ poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok na nákup IT techniky
- ✓ **revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou**

Tabuľka č. 3: Prehľad implementácie FAST-CARE k 30.06.2024

Operačný program	Rezort	Fond	Alokácia FAST-CARE	Kontrahovanie			Čerpanie	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
OP Ľudské zdroje	MPSVR SR	ESF	35 545 000	5	40 492 176	113,92%	35 415 634	99,64%
		EFRR	30 000 000	4	34 107 189	113,69%	7 480 961	24,94%
			65 545 000	9	74 599 366	113,81%	42 896 596	65,45%
OP Integrovaná infraštruktúra	MIRRI SR	EFRR	30 000 000	2	29 610 000	98,70%	21 490 324	71,63%
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	EFRR	244 014 456	1 448	242 288 393	99,29%	242 288 393	99,29%
Celkom			339 559 456	1 459	346 497 758	102,04%	306 675 312	90,32%
z toho EFRR			304 014 456	1 454	306 005 582	100,65%	271 259 678	89,23%
z toho ESF			35 545 000	5	40 492 176	113,92%	35 415 634	99,64%

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR); alokácia za OP ĽZ aj celkom bola k 30.09.2023 navýšená o 24,3 mil. EUR. Pozn.: Podľa informácií z RO OP II voľné zdroje boli presunuté v zmysle flexibility z PO14 v prospech PO7.

Z dostupnej alokácie 339,56 mil. EUR bolo k 30.06.2024 vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 353,72 mil. EUR (104,17 %), zazmluvnených 346,50 mil. EUR (102,04 %) a vyplatených 306,68 mil. EUR (90,32 %).

1.3 Implementácia SAFE (energokríza)

Na riešenie problémov spojených s extrémnym nárastom cien energií prijala EK **iniciatívu SAFE** (schválená Nariadením EP a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023). EK umožnila poskytnúť **pomoc pri úhrade nákladov na spotrebu energie v prípade zraniteľných domácností** a využiť tak zostávajúce zdroje EŠIF, ktoré neboli zazmluvnené.

Na základe analýzy bola ako najvhodnejšie opatrenie pre podporu v rámci iniciatívy SAFE identifikovaná kompenzácia zvýšených nákladov na dodávky plynu, prípadne elektriny pre zraniteľné domácnosti. Opatrenia SAFE sú realizované prostredníctvom **národných projektov (NP)** troch operačných programov - OP KŽP, IROP a OP II, kde jediným prijímateľom je MH SR.

RO na podporu SAFE avizovali vyčleniť 1,03 mld. EUR, **v súčasnosti, v nadväznosti na stav implementácie, RO využili celkom 936,7 mil. EUR**. Revízie týchto OP sa uskutočnili pod koordináciou MIRRI SR. Aktuálny stav implementácie iniciatívy SAFE je uvedený v tabuľke č. 4.

Z plánovanej alokácie 1,03 mld. EUR bolo vo vyzvaniach SAFE sprístupnených 1,01 mld. EUR (97,99 %), zazmluvnených 1,00 mld. EUR (97,70 %) a vyčerpaných 936,74 mil. EUR (90,62 %).

Tabuľka č. 4: Prehľad implementácie SAFE k 30.06.2024

Operačný program	Rezort	Fond	Kontrahovanie			Čerpanie	
			počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
OP Integrovaná infraštruktúra	MD SR	EFRR	1	574 818 539	100,00%	501 617 801	87,27%
Integrovaný regionálny OP	MIRRI SR	EFRR REACT EU	1	8 519 135	85,19%	8 519 135	85,19%
OP Kvalita životného prostredia	MŽP SR	KF	1	426 598 576	95,03%	426 598 576	95,03%
Celkom			3	1 009 936 249	97,70%	936 735 511	90,62%

Zdroj: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO

Poznámka: Zostatok pôvodne alokovaných prostriedkov na SAFE bol využitý na realizáciu zazmluvnených projektov v rámci iných prioritných osí OP II.

2. Implementácia Programu Slovensko 2021 – 2027 k 30.06.2024

2.1 Základná informácia

Program Slovensko 2021 – 2027 (ďalej len „P SK 2021 – 2027“) je investičným nástrojom pre rast životnej úrovne obyvateľov a zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Program stanovuje podmienky pre využitie finančných prostriedkov politiky súdržnosti Európskej únie v Slovenskej republike na programové obdobie 2021 – 2027. Prostredníctvom programu sa realizujú investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu a Fondu na spravodlivú transformáciu. Program tak nahrádza doterajších 6 operačných programov Slovenskej republiky pre fondy EÚ na obdobie 2014 – 2020 pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

V rámci P SK 2021 – 2027 sa podarilo presadiť, že 2,41 mld. EUR z celkovej obálky 12,59 mld. EUR (t. j. 19,15 %) je realizovaných cez **mechanizmus integrovaných územných investícií (IÚI)**. Ide o pilotný prístup viacúrovňového strategického plánovania a prioritizácie investičnej podpory v území podľa príkladov dobrej praxe v ostatných členských štátoch EÚ. Dopytovú súťaž samospráv po prvýkrát na Slovensku nahrádza motivácia územných partnerov spoločne identifikovať kľúčové strategické rozvojové investície, pri ktorých sú územná dohoda o potrebe investície a pripravenosť projektov dôležité princípy. Cieľom IÚI je umožniť riešiť výzvy rôznorodých území komplexne. Je na každej Rade partnerstva a Koooperačnej rade pre udržateľný mestský rozvoj, aby vybrala a zrealizovala projektové zámery s najväčším príspevkom k riešeniu hlavných územných výziev a špecifických potrieb identifikovaných v ich schválených integrovaných územných stratégiách.

Riadiacim orgánom P SK 2021 – 2027 je **MIRRI SR**. Funkciu platobného orgánu a orgánu auditu pre P SK 2021 – 2027 plní MF SR.

Časťou výkonu úloh, ktorými sú najmä vyhlasovanie výziev a výber projektov, poveril riadiaci orgán **10 sprostredkovateľských orgánov**: MD SR, MPSVR SR, MŽP SR, MŠVVM SR, MH SR, SIEA, ÚV SR (za oblasť podpory pre marginalizované rómske komunity), MZ SR, MV SR a ÚVO (výkon kontroly verejného obstarávania).

Tabuľka č. 5: Rozdelenie alokácie P SK 2021 – 2027 podľa rezortov (v EUR)

Rezort	Alokácia
MD SR	3 000 281 170
MIRRI SR	2 608 994 293
MPSVR SR	1 762 219 681
MŽP SR	1 723 914 863
MŠVVM SR	1 074 625 240
SIEA	902 229 091
MH SR	626 929 974
MZ SR	387 640 621
ÚV SR	399 500 000
MV SR	107 400 000
Spolu Program Slovensko	12 593 734 933

Zdroj: RO P SK2021-2027

Investície z P SK 2021 – 2027 sú smerované do oblastí podpory/priorít **v 5 cieľoch politiky (CP) súdržnosti EÚ** a jedného samostatného špecifického cieľa:

CP1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa:

- Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií
- Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy

- Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi investíciami
- Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie
- Zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti

CP2 – Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa:

- Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov
- Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené
- Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete (TEN-E)
- Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy
- Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva
- Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje
- Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
- Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka

CP3 – Prepojenejšia Európa:

- Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T odolnej proti zmene klímy
- Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility

CP4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa:

- Adaptabilný a prístupný trh práce
- Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
- Zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu
- Záruky pre mladých
- Aktívne začlenenie a podpora dostupných služieb
- Aktívne začlenenie rómskych komunít
- Sociálne inovácie a experimenty
- Potravinová a materiálna deprivácia

CP5 – Európa bližšie k občanom :

- Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
- Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach

Fond na spravodlivú transformáciu (FST – samostatný špecifický cieľ):

- Nástroj na zmiernenie dôsledkov transformácie a podpora oblastí najviac postihnutých prechodom na klimatickú neutralitu
- Na Slovensku ho využívajú tri regióny: Trenčiansky kraj, Košický kraj a Banskobystrický kraj.

2.2 Aktuálny stav implementácie

Alokácia P SK 2021 – 2027 je vo výške **12,59 mld. EUR**.

Z celkovej alokácie boli k 30.6.2024 v **152 výzvach** pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 30.06.2024 sprístupnené finančné prostriedky vo výške **5,67 mld. EUR**, čo predstavuje **45,01 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Žiadatelia predložili k 30.06.2024 na posúdenie **2 217 žiadostí o nenávratný finančný príspevok**, z ktorých bolo zatiaľ **schválených 755 žiadostí**.

K 30.06.2024 bolo **zazmluvnených 504 projektov** v hodnote **2,59 mld. EUR**, čo predstavuje **20,60 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

K 30.06.2024 boli **prijímateľom vyplatené prostriedky** vo výške **284,46 mil. EUR**, čo predstavuje **2,26 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Podrobnejšie informácie sú uvedené v tabuľkách č. 10 a 11.

POKROK V IMPLEMENTÁCII OD 01.11.2023 do 30.06.2024:

- ✓ **bolo vyhlásených 125 výziev v sume 4,37 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 34,68 p. b.;**
 - **4,4 krát viac ako do 31.10.2023;**
- ✓ **nárast kontrahovania o 2,09 mld. EUR, t. j. nárast o 16,58 p. b.;**
 - **5 krát viac ako do 31.10.2023;**
- ✓ **vyplatené prostriedky prijímateľom vo výške 260,56 mil. EUR, t. j. nárast o 2,07 p. b.;**
 - **11,9 krát viac ako do 31.10.2023.**

2.2.1 Kľúčové kroky vykonané od 01.11.2023 do súčasnosti

1. Novelizácia legislatívy pre zefektívnenie implementácie:

Bola schválená novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o VO“), ktorého súčasťou bola aj novela zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 311/2023 Z. z. (ďalej len „novela zákona o fondoch EÚ“). Cieľom novely zákona je zjednodušenie a hlavne zrýchlenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky trvá neprimerane dlho. Z toho dôvodu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pristúpilo k úprave zákona v niektorých jeho častiach. Vo vzťahu k tzv. „európskym“ financiám sa jedná najmä o:

- **Navýšenie finančného limitu zákaziek malého rozsahu z doterajších 10 000 EUR bez DPH na 50 000 EUR bez DPH.**
- **Zrušenie zákaziek s nízkou hodnotou a ich zlúčenie s podlimitnými zákazkami**

Osobitný prístup pre európske zdroje v prípade podlimitných zákaziek:

- a) k stanoveniu finančných limitov, kedy výška finančných limitov na zverejnenie výzvy pre vopred neurčený okruh hospodárskych subjektov pri zákazkách financovaných zo štátneho rozpočtu bude odlišná od výšky finančných limitov pre zákazky, ktoré budú spolufinancované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ,

- b) zvýšenie finančných limitov vo vzťahu k zverejneniu výzvy pre vopred neurčený okruh hospodárskych subjektov v prípade zákaziek financovaných z prostriedkov EÚ, kedy pre tovary a služby je navýšený finančný limit z pôvodnej úrovne do 69 999,99 EUR bez DPH na finančný limit do 142 999,99 EUR bez DPH a pre stavebné práce je navýšený finančný limit z pôvodnej úrovne 179 999,99 EUR bez DPH na finančný limit do 359 999,99 EUR bez DPH. V rámci uvedených limitov nie je potrebné zverejňovanie Výzvy na predkladanie ponúk, ale postačuje oslovenie min. 3 hospodárskych subjektov prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.

➤ **Ďalšie zmeny v novele zákona o VO týkajúce sa oblasti eurofondov:**

- a) Doplnenie podlimitnej výnimky na „vypracovanie odborného posudku na účely hodnotenia projektov v oblasti výskumu a vývoja“.
- b) Zrušenie žiadosti o nápravu.
- c) Zmena v možnosti podania námietok kedy námietky nemožno podať:
- pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, alebo postupe zadávania podlimitnej koncesie,
 - pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 1 500 000 eur.
- d) Zrušenie obligatórnej predbežnej kontroly v prípade nadlimitných zákaziek financovaných z P SK 2021 – 2027.
- e) Skrátenie lehôt na výkon predbežnej kontroly pre P SK 2021 – 2027 zo 40 dní na 30 dní a lehôt na výkon kontroly po uzavretí zmluvy z 55 dní na 45 dní.
- f) úprava kontroly zákaziek financovaných z P SK 2021 – 2027 pre fázované projekty, v rámci ktorých ide o zákazku, rámcovú dohodu, koncesiu, alebo inú zmluvu úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov EŠIF v programovom období 2014 – 2020, na ktorú sa poskytuje prijímateľovi poskytovateľom príspevok alebo príspevok na finančný nástroj podľa osobitného predpisu (programové obdobie 2021 - 2027), kde kontrolu po uzavretí zmluvy vykoná orgán kontroly na základe posúdenia rizík vyplývajúcich z rizikovej analýzy vykonanej poskytovateľom.

➤ **V časti novely, ktorá upravuje zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie boli upravené nasledovné oblasti, ktoré kriticky komplikovali implementáciu:**

- doplnenie pravidiel vyplývajúcich zo záväzkov z legislatívy EÚ týkajúcich sa tzv. flexibility a stanovenie podmienok vyhlasovania výziev a následného zazmluvňovania. To znamená, že SR nie je oprávnená nakladať so všetkými prostriedkami v rámci P SK 2021-2027 až do zrealizovania strednodobého preskúmania, ktoré sa uskutoční v marci 2025;
- legislatívne spriechodnenie implementáciu IUI, a to odstránenie nutnosti vyhlasovať výzvy až po schválení projektových zámerov IÚI, t. j. **výzvy môžu byť vyhlásené aj pred schválením projektových zámerov** v Rade partnerstva/Kooperačnej rade pre udržateľný mestský rozvoj. Toto bola zásadná požiadavka územia, ale legislatíva schválená predchádzajúcou vládou to de iure neumožňovala;
- určovanie poradia pri schvaľovaní ŽoNFP a tvorbe zásobníka metódou FIFO – first in first out (t. j. podľa poradia predloženia žiadostí);
- rozšírenie možností úprav výziev zameraných na IÚI.

- **V súčasnosti prebieha vyhodnotenie procesu MPK k ďalšej novele zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie, ktorou sa precizujú niektoré ustanovenia v nadväznosti na aplikačnú prax.**

2. Regióny SR - intenzívna komunikácia Riadiaceho orgánu P SK 2021-2027 a spolupráca s regionálnymi aktérmi:

- zástupcovia RO P SK 2021 - 2027 spolu s vedením MIRRI SR sa zúčastňujú tzv. rezortných dní v regiónoch (doteraz sa uskutočnilo 20 rezortných dní), ktorých cieľom je zapájať mestá, obce a kraje do diskusie o investíciách;
- veľmi intenzívna spolupráca so zástupcami samosprávnych krajov, miest a obcí a SO PSK, ktoré implementujú IÚI, na aktualizácii Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 8, verzii 2.0, za účelom zjednodušovania a participatívneho riadenia procesov prostredníctvom odstránenia prekážok, ktoré bránili schvaľovaniu projektových zámerov ešte pred vyhlásením výziev (napr. overenie súladu nastavenia merateľných ukazovateľov až v procese poskytovania súčinnosti prípravy Zmluvy o poskytnutí NFP, odstránenie podmienok poskytovania vo vzťahu k určeným % oprávnených výdavkov, hospodárnosti a pod.).

3. Vznik Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti – 1. zasadnutie 22.04.2024:

- poslaním je **zabezpečiť užšie prepojenie politiky regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti Európskej únie v SR;**
- využívaná ako platforma pre **permanentný dialóg vlády Slovenskej republiky so samosprávou** k aktuálnym otázkam regionálneho rozvoja.

Rade predsedá minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a tajomníkom je zástupca riadiaceho orgánu P SK 2021 – 2027.

4. Pravidelné stretnutia riadiaceho orgánu pre P SK 2021 – 2027 so sprostredkovateľskými orgánmi na úrovni generálnych riaditeľov sekcií, štátnych tajomníkov až na úroveň eurovlády:

- cieľom stretnutí je identifikovať a riešiť nadrezortné implementačné problémy.

5. Naštartovanie procesu strednodobého preskúmania P SK 2021 – 2027 a možnosti zaradenia STEP investícií do P SK 2021 – 2027

- MIRRI SR ako riadiaci orgán pre P SK 2021 – 2027 naštartovalo proces strednodobého preskúmania P SK 2021 – 2027 a iniciovalo zber podnetov k možným úpravám P SK 2021-2027. Zasláné podnety sú v súčasnosti predmetom internej analýzy, avšak je možné konštatovať, že požiadavky na navýšenie alokácie, ktoré z podnetov vzišli, sú v objeme takmer 3,8 mld. EUR, čo je vzhľadom k stavu implementácie P SK 2021-2027 ťažko realizovateľné. Na plánovaných bilaterálnych rokovaníach bude riadiaci orgán dôrazne žiadať zrealizovanie požiadaviek, sústrediť sa na nevyhnutné priority a identifikovať disponibilné zdroje v gescii daného rezortu. Osobitné diskusie prebiehajú s regionálnymi partnermi o presune alokácií v rámci mechanizmu integrovaných územných investícií. Strednodobé preskúmanie P SK 2021 – 2027 tvorí základ pre návrh SR na konečné pridelenie sumy flexibility (15,7 % celkovej alokácie P SK 2021 – 2027, tzn. 1 976 545 729 EUR). Posúdenie výsledkov strednodobého preskúmania P SK 2021 – 2027, vrátane návrhu a definitívne pridelenie sumy flexibility, je potrebné predložiť Európskej komisii do 31. marca 2025. Dovtedy, kým EK neprijme rozhodnutie potvrdzujúce definitívne pridelenie sumy flexibility, táto suma nie je dostupná na výber operácií.
- V súvislosti s identifikáciou možných investícií v P SK 2021-2027 v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2024/795 z 29.2.2024, ktorým sa zriaďuje Platforma strategických technológií pre Európu, bola uznesením vlády SR č. 105 z 21. 2. 2024 definovaná úloha B.1 analyzovať

možnosti zníženia alokácie v Programe Slovensko v prospech oprávnených oblastí návrhu nariadenia EP a Rady (EÚ) k STEP a zaslať informáciu riadiacemu orgánu MIRRI SR a MF SR v termíne do 2 mesiacov od vydania metodiky Európskou komisiou“. V nadväznosti na zverejnenie „metodiky EK pre STEP“ dňa 13. mája 2024, MIRRI SR požiadalo dňa 15.5.2024 sprostredkovateľské orgány P SK 2021-2027 o zaslanie vstupov v zmysle vyššie uvedenej úlohy v termíne do 13. júla 2024 na riadiaci orgán. Na úrovni EÚ bola zriadená EC STEP Task Force, ktorá iniciovala zriadenie siete národných kontaktných bodov pre STEP (EC-STEP-PARTNERS@ec.europa.eu), pričom národný kontaktný bod pre STEP bol zriadený na MIRRI SR (STEP-NCP-SK@mirri.gov.sk).

2.2.2 Stav implementácie v rozdelení na rezorty

Na základe Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) bola riadiacim orgánom pridelená jednotlivým rezortom zodpovednosť za implementáciu časti alokácie P SK 2021 – 2027. Na distribúcii investícií z EÚ fondov v P SK 2021 – 2027 sa preto podieľa spolu 10 rezortov.


Tabuľka č. 6: Prehľad stavu implementácie P SK 2021 – 2027 po rezortoch k 30.06.2024

Rezort	Alokácia	Vyhlásené výzvy		Kontrahovanie		Čerpanie (prostriedky vyplatené prijímateľom)	
		EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
MIRRI SR	2 608 994 293	965 960 220	37,02%	37 147 082	1,42%	3 123 396	0,12%
MD SR	3 000 281 170	1 365 338 565	45,51%	576 246 506	19,21%	0	0,00%
MŽP SR	1 723 914 863	710 713 121	41,23%	104 248 647	6,05%	0	0,00%
MH SR	626 929 974	318 152 000	50,75%	253 915 600	40,50%	0	0,00%
SIEA	902 229 091	304 356 048	33,73%	116 056 047	12,86%	14 750 000	1,63%
MZ SR	387 640 621	74 904 338	19,32%	48 588 583	12,53%	6 042 000	1,56%
MV SR	107 400 000	90 171 102	83,96%	0	0,00%	0	0,00%
ÚV SR	399 500 000	281 653 956	70,50%	160 584 609	40,20%	45 657 433	11,43%
MPSVR SR	1 762 219 681	1 219 453 602	69,20%	1 014 296 562	57,56%	121 387 236	6,89%
MŠVVM SR	1 074 625 240	337 828 712	31,44%	283 676 751	26,40%	93 500 000	8,70%
celkom PSK	12 593 734 933	5 668 531 664	45,01%	2 594 760 387	20,60%	284 460 065	2,26%

Zdroj: ITMS21+

Poznámka: Podľa informácie z MD SR, rezort dosiahol k 8.7.2024 čerpanie 87 432 263,25 (EÚ zdroj).

Graf č. 2: Porovnanie stavu implementácie jednotlivých rezortov

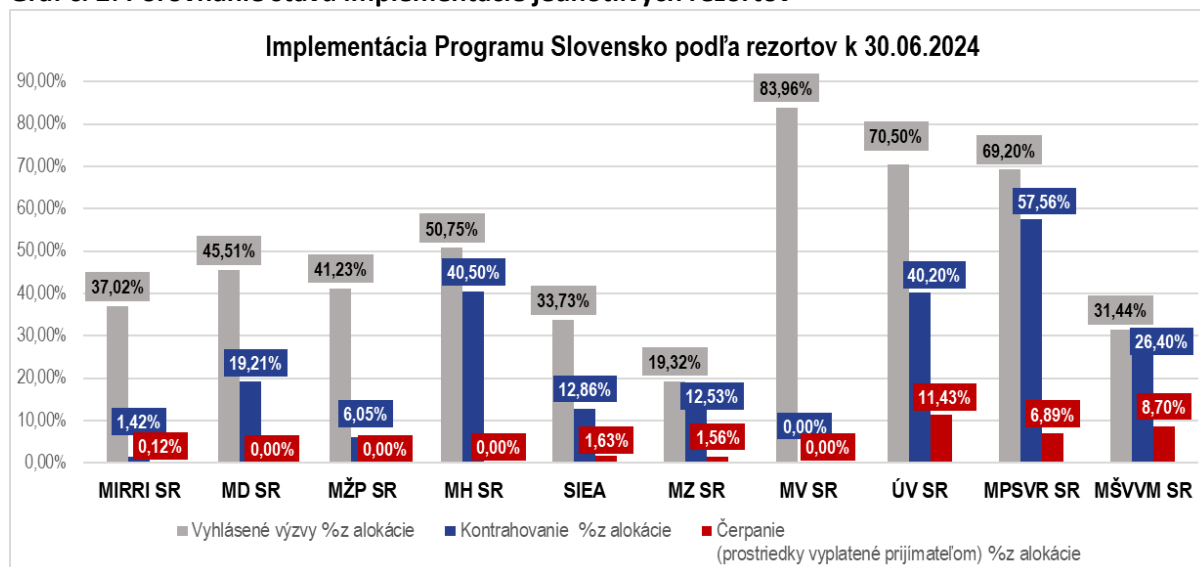

Zdroj: ITMS21+

2.2.3 Priebežné vyhodnotenie plánov kontrahovania a čerpania rezortov (investičný plán)

V zmysle zmluvy o poverení zodpovedajú jednotlivé rezorty okrem iného aj za plnenie plánu vybraných parametrov implementácie časti P SK 2021 – 2027, akými sú **limity kontrahovania (zazmluvnenia) alokácie programu a limity čerpania ročných záväzkov**, ktoré spolu tvoria tzv. **investičný plán (príloha č. 1 zmluvy o poverení)**. Najbližšími míľnikmi v rámci investičného plánu sú limity kontrahovania, ktoré je potrebné plniť k 31.12.2024, a limity čerpania, ktoré je v zmysle pravidla N+3 potrebné plniť každý rok počínajúc termínom 31.12.2025, t. j. 3 roky od schválenia programu Európskou komisiou. S cieľom zabezpečenia plynulej implementácie P SK 2021 – 2027 a prípadného včasného prijatia opatrení na elimináciu rizík implementácie vykonáva riadiaci orgán priebežné vyhodnocovania pokroku v napĺňaní investičných plánov. Pri kontrahovaní je potrebné brať do úvahy aj úroveň schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré sú predpokladom pre úspešné uzatvorenie zmluvy a jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, a teda aj následné započítanie do stavu kontrahovania.

Prvé plnenie N+3 za P SK 2021-2027 bude k 31.12.2025, kedy je potrebné za celý program vyčerpať minimálne 1,54 mld. EUR. Tento objem vrátane rezervy je rozpísaný medzi jednotlivé sprostredkovateľské orgány v investičných plánoch, ktoré sú prílohou Zmlúv o poverení. Ďalším míľnikom bude plnenie N+3 k 31.12.2026, kedy bude potrebné čerpať minimálne 2,12 mld. EUR (presne 2 115 999 874 EUR), **teda kumulatívny minimálny objem čerpania od začiatku implementácie až do 31.12.2026 pre zabránenie dekomitmentu je vo výške 3,65 mld. EUR** (presne 3 652 877 713 EUR).

Minimálna hranica čerpania pre splnenie N+3 k 31.12.2025 (t. j. neprepadnutie prostriedkov z rozpočtu EK) bola znížená z pôvodných 1,67 mld. EUR na 1,54 mld. EUR. Zníženie o 137,70 mil. EUR predstavuje zníženie o mimoriadnu zálohovú platbu pre FST v rámci nariadenia STEP. Rezerva pre splnenie N+3 v investičnom pláne čerpania je 504 mil. EUR (rezerva pre splnenie N+3 v investičnom pláne čerpania na rok 2026 je 692 mil. EUR).

Podrobnejší prehľad stavu plnenia investičných plánov jednotlivých rezortov je uvedený v tab. č. 7a.

Tabuľka č. 7a: Odpočet plnenia plánov kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých rezortov (v zmysle investičných plánov)

Rezort	Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania k 31.12.2024	Kontrahovanie k 30.06.2024	% plnenia plánu kontrah.	Plán čerpania k 31.12.2025	Čerpanie (prostriedky vyplatené prijímateľom) k 30.06.2024	% plnenia plánu čerpania
MIRRI SR	EFRR	VR	84 983 783	33 893 513	1 249 739	3,69%	11 234 060	63 648	0,57%
	EFRR	MR	1 887 083 591	752 887 936	21 560 318	2,86%	248 764 507	884 748	0,36%
	FST	MR	226 693 618	167 135 716	0	0,00%	78 222 250	0	0,00%
	TP EFRR	MR	255 696 315	89 493 710	980 158	1,10%	33 707 127	0	0,00%
	TP KF		51 632 244	18 071 285	0	0,00%	6 807 290	0	0,00%
	TP ESF+	MR	84 543 983	29 590 394	9 628 386	32,54%	11 145 950	0	0,00%
	TP FST	MR	18 360 759	13 134 959	3 728 481	28,39%	6 335 509	2 175 000	34,33%
	MIRRI SR Spolu		2 608 994 293	1 104 207 514	37 147 082	3,36%	396 216 693	3 123 396	0,79%
MD SR	EFRR	VR	20 000 000	5 800 000	0	0,00%	2 643 813	0	0,00%
	EFRR	MR	1 350 103 750	713 704 590	333 660 948	46,75%	329 356 402	0	0,00%
	KF		1 630 177 420	423 846 129	242 585 558	57,23%	287 078 165	0	0,00%
		MD SR Spolu	3 000 281 170	1 143 350 719	576 246 506	50,40%	619 078 379	0	0,00%
MŽP SR	EFRR	VR	55 997 638	19 599 173	0	0,00%	7 402 364	0	0,00%
	EFRR	MR	866 361 612	303 226 564	48 313 554	15,93%	114 207 987	0	0,00%
	KF		790 998 920	276 849 622	55 935 093	20,20%	104 286 748	0	0,00%
	FST	MR	10 556 693	0	0	0,00%	731 881	0	0,00%
	MŽP SR Spolu	1 723 914 863	599 675 360	104 248 647	17,38%	226 628 981	0	0,00%	
MH SR	EFRR	VR	52 146 799	26 073 400	10 500 000	40,27%	7 911 017	0	0,00%
	EFRR	MR	443 241 755	221 620 878	203 500 000	91,82%	67 082 595	0	0,00%
	FST	MR	131 541 420	94 102 377	39 915 600	42,42%	40 069 802	0	0,00%
	MH SR Spolu	626 929 974	341 796 654	253 915 600	74,29%	115 063 414	0	0,00%	
SIEA	EFRR	VR	182 094 825	91 047 413	26 264 054	28,85%	27 624 999	2 000 000	7,24%
	EFRR	MR	677 806 065	338 903 033	89 791 993	26,49%	102 582 821	12 750 000	12,43%
	FST	MR	42 328 201	33 060 999	0	0,00%	10 232 837	0	0,00%
		SIEA Spolu	902 229 091	463 011 444	116 056 047	25,07%	140 440 657	14 750 000	10,50%
MZ SR	EFRR	VR	4 000 000	1 400 000	0	0,00%	528 762	0	0,00%
	EFRR	MR	296 493 976	103 772 892	0	0,00%	39 085 273	0	0,00%
	ESF+	VR	2 191 690	767 092	749 961	97,77%	289 768	92 000	31,75%
	ESF+	MR	84 954 955	29 734 234	47 838 622	160,89%	11 200 131	5 950 000	53,12%
		MZ SR Spolu	387 640 621	135 674 217	48 588 583	35,81%	51 103 935	6 042 000	11,82%
MV SR	EFRR	MR	107 400 000	37 590 000	0	0,00%	14 157 989	0	0,00%
		MV SR Spolu	107 400 000	37 590 000	0	0,00%	14 157 989	0	0,00%
ÚV SR	EFRR	VR	5 000 000	1 750 000	0	0,00%	660 953	0	0,00%
	EFRR	MR	224 500 000	78 575 000	0	0,00%	29 594 678	0	0,00%
	ESF+	VR	3 000 000	1 050 000	346 674	33,02%	396 636	8 778	2,21%
	ESF+	MR	167 000 000	58 450 000	160 237 936	274,15%	22 016 631	45 648 655	207,34%
		ÚV SR Spolu	399 500 000	139 825 000	160 584 609	114,85%	52 668 899	45 657 433	86,69%
MPSVR SR	EFRR	VR	8 412 898	3 365 159	3 330 000	98,96%	1 112 107	999 000	89,83%
	EFRR	MR	165 468 552	66 187 421	39 795 000	60,12%	21 812 867	11 938 500	54,73%
	ESF+	VR	34 677 822	17 338 911	15 178 855	87,54%	5 235 606	2 893 900	55,27%
	ESF+	MR	1 524 122 099	762 061 050	938 743 878	123,18%	237 082 474	98 864 353	41,70%
	FST	MR	29 538 310	23 071 286	17 248 830	74,76%	10 122 023	6 691 483	66,11%
		MPSVR SR Spolu	1 762 219 681	872 023 827	1 014 296 562	116,32%	275 365 076	121 387 236	44,08%
MŠVM SR	EFRR	VR	80 840 573	46 312 000	1 463 444	3,16%	10 686 368	0	0,00%
	EFRR	MR	537 976 897	267 388 000	4 321 051	1,62%	70 918 723	0	0,00%
	ESF+	VR	10 130 488	3 039 146	0	0,00%	1 339 374	0	0,00%
	ESF+	MR	445 677 282	222 838 641	277 892 256	124,71%	67 456 137	93 500 000	138,61%
		MŠVM SR Spolu	1 074 625 240	539 577 787	283 676 751	52,57%	150 400 601	93 500 000	62,17%
Celkom PSK			12 593 734 933	5 376 732 521	2 594 760 387	48,26%	2 041 124 623	284 460 065	13,94%

Zdroj: ITMS21+ Poznámka: Podľa informácie z MD SR, rezort dosiahol k 8.7.2024 čerpanie 87 432 263,25 (EÚ zdroj).

Najbližšími míľníkmi v rámci investičného plánu sú **limity kontrahovania**, pre ktorých naplnenie je **potrebné, aby jednotlivé rezorty do 31.12.2024 ešte nakontrahovali (uzatvorili zmluvy) nasledovné objemy** (poradie rezortov je v zmysle zoradenia v tabuľke č. 7a)

- MIRRI SR 1,067 mld. EUR
- MD SR 567 mil. EUR
- MŽP SR 495 mil. EUR
- MH SR 88 mil. EUR
- SIEA 347 mil. EUR
- MZ SR 87 mil. EUR
- MV SR 38 mil. EUR
- MŠVVM SR 256 mil. EUR

Limity kontrahovania už naplnili sprostredkovateľské orgány **ÚV SR** a **MPSVR SR**.

Spolu je za P SK 2021-2027 ešte potrebné zazmluvniť projekty v objeme 2,78 mld. EUR.

- **Priebežné plnenie plánov kontrahovania k 31.12.2024 bude predmetom odpočtov plnenia na jednotlivých rokoch vlády SR k eurofondom.**
- **Prípadné nespĺnenie plánu kontrahovania jednotlivých SO k 31.12.2024 stanovené v Investičných plánoch SO bude zohľadnené v strednodobom preskúmaní P SK 2021 – 2027, ktorého výsledkom bude finálne pridelenie/nepridelenie časti alokácie, ktorá predstavuje sumu flexibility.**

Tabuľka č. 7b: Plány čerpania rezortov v zmysle investičných plánov (príloha Zmluvy o poverení) pre zabezpečenie N+3 v r. 2025 a r. 2026

Rezort	Alokácia	Plán čerpania do 31.12.2025	Plán čerpania do 31.12.2026	Skutočné čerpanie (prostriedky vyplatené prijímateľom)		
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z plánu čerpania do 31.12.2025	% z plánu čerpania do 31.12.2026
MIRRI SR	2 608 994 293	396 216 693	905 982 088	3 123 396	0,79%	0,34%
MD SR	3 000 281 170	619 078 379	1 150 421 145	0	0,00%	0,00%
MŽP SR	1 723 914 863	226 628 981	534 180 396	0	0,00%	0,00%
MH SR	626 929 974	115 063 414	242 927 590	0	0,00%	0,00%
SIEA	902 229 091	140 440 657	306 637 470	14 750 000	10,50%	4,81%
MZ SR	387 640 621	51 103 935	119 739 724	6 042 000	11,82%	5,05%
MVSR	107 400 000	14 157 989	33 173 597	0	0,00%	0,00%
ÚV SR	399 500 000	52 668 899	123 405 591	45 657 433	86,69%	37,00%
MPSVR SR	1 762 219 681	275 365 076	589 301 430	121 387 236	44,08%	20,60%
MŠWM SR	1 074 625 240	150 400 601	338 637 265	93 500 000	62,17%	27,61%
celkom PSK	12 593 734 933	2 041 124 623	4 344 406 296	284 460 065	13,94%	6,55%
N+3 v roku 2025 a 2026		1 536 877 839	3 652 877 713			
Rezerva 2025 a 2026		504 246 784	691 528 583			

Zdroj: RO P SK a ITMS21+

Poznámka: Podľa informácie z MD SR, rezort dosiahol k 8.7.2024 čerpanie 87 432 263,25 (EÚ zdroj).

Táto hodnota tvorí 14% plánu čerpania .

Z vyššie uvedeného porovnania plánov čerpania na roky 2025 a 2026 a ich skutočného stavu vyplýva **reálne ohrozenie nenaplnenia pravidla N+3 v rokoch 2025 a 2026**, a preto **dôrazne odporúčame jednotlivým sprostredkovateľským orgánom pripraviť si konceptuálne/náhradné riešenia**, napr. vo forme implementácie takých projektov, ktoré budú spĺňať podmienky P SK 2021 – 2027 a strategické ciele EÚ a ktoré výrazne urýchlia implementáciu a prejavia sa vo zvýšenom čerpaní do konca roka 2026.

2.3 Vybrané implementačné problémy/otázky

2.3.1 Preukazovanie podmienky DNSH v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

MIRRI SR ako riadiaci orgán P SK 2021 – 2027 zorganizovalo 30.4.2024 koordinačné stretnutie riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov a horizontálnych orgánov P SK 2021 – 2027 na úrovni štátnych tajomníkov, resp. generálnych tajomníkov služobných úradov, zodpovedných za „eurofondy“. Jedným z bodov tohto stretnutia bola aj téma „Podmienka súladu projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“, v súvislosti s ktorou bolo MV SR v spolupráci s MŽP SR ako gestorom zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyzvané na usmernenie okresných úradov / odborov starostlivosti o životné prostredie o nesprávnom postupe pri vydávaní stanovísk / vyjadrení žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci P SK 2021 – 2027 v lehote do 20.5.2024. Za daným účelom sa konalo aj pracovné stretnutie 6.5.2024 na úrovni generálnych riaditeľov MIRRI SR, MŽP SR, MD SR a MV SR, na ktorom sa dohodlo na ďalších postupoch:

- **MŽP SR vypracuje** písomné usmernenie okresných úradov / odborov starostlivosti o životné prostredie, ktoré zašle na MIRRI SR ako riadiaci orgán P SK 2021 – 2027 na vyjadrenie a následne potom bude **v termíne do 20.5.2024 MV SR distribuované**;

Odpoveď k úlohe:

- ✓ MV SR vydalo 21.5. 2024 – „*USMERNENIE MŽP SR k činnostiam, ktoré sú predmetom žiadostí o nenávratný finančný príspevok s cieľom dodržania ich jednotného postupu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s programovým obdobím 2021 – 2027*“
- ✓ Zároveň MV SR 21.05.2025 zaslalo usmernenie aj mailom odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov.
- **MŽP SR v termíne do 15.7.2024** vykoná školenie zamestnancov všetkých okresných úradov / odborov starostlivosti o životné prostredie ohľadne zmien v novele zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej prílohy č. 8, a to aj v kontexte na prílohu č. 3 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobať významnú škodu“ (Metodický dokument RO pre P SK 2021 – 2027 č. 7), ktorá presne špecifikuje prahové hodnoty pre jednotlivé typy oprávnených aktivít podporovaných v rámci P SK 2021 – 2027, pri dosiahnutí ktorých je potrebné vykonať posúdenie súladu projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

2.3.2 Identifikácia disponibilných zdrojov na financovanie výdavkov spojených s odídencami z Ukrajiny

Uznesenie vlády SR č. 166/2024 uložilo ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 4 úlohy v súvislosti s identifikáciou disponibilných zdrojov na financovanie výdavkov spojených s **odídencami z Ukrajiny**, a to konkrétne:

- **Úlohu B.1:** vypracovať a predložiť na rokovanie vlády **analýzu oprávnenosti výdavkov** P SK 2021 – 2027 v súvislosti s odídencami z Ukrajiny.

Predmetná úloha **bola splnená** – MIRRI SR vypracovalo informáciu, ktorá bola vzatá na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 3.4.2024.

- **Úlohu B.2: identifikovať disponibilné zdroje v P SK 2021 – 2027** na financovanie výdavkov spojených s odídcami z Ukrajiny, ktorá bola zadaná rezortom implementujúcim **ESF+** (MPSVR SR, MŠVVM SR, ÚV SR, MZ SR) v termíne do 15.4.2024.

Predmetnú úlohu splnili všetky rezorty implementujúce ESF+, pričom iba MPSVR SR identifikovalo disponibilné zdroje v objeme 20 500 000 EUR.

- **Úlohu B.3: identifikovať disponibilné zdroje v P SK 2021 – 2027** na financovanie výdavkov spojených s odídcami z Ukrajiny, ktorá bola zadaná rezortom implementujúcim **EFRR** (MPSVR SR, MŠVVM SR, MŽP SR, MD SR, ÚV SR, MIRRI SR, SIEA, MV SR, MZ SR) v termíne do 30.4.2024.

Predmetnú úlohu splnili všetky rezorty implementujúce EFRR, pričom však neidentifikovali žiadne disponibilné zdroje.

Aktuálna potreba súvisiaca s financovaním výdavkov spojených s odídcami z Ukrajiny predstavuje alokáciu (v zmysle uznesenia vlády SR č. 166/2024) vo výške 66 000 000 EUR pre rok 2024 (celkové oprávnené výdavky), pričom je potrebné prijať rozhodnutie, ktorým sa zabezpečí v rámci cieľa politiky 4 P SK 2021 – 2027 financovaného z ESF+ vyčlenenie požadovanej výšky zdrojov EÚ na pokrytie zostávajúcej sumy vo výške 26 000 000 EUR (celkové oprávnené výdavky).

Uznesením vlády SR č. 307/2024 úlohou B.4. z 23. mája 2024 boli zabezpečené alokácie zdroja ESF+ vo výške 34 000 000 EUR za zdroj EÚ do priority 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby, špecifického cieľa ESO4.9 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov, čím sa zabezpečilo pokrytie 40 000 000 EUR (celkové oprávnené výdavky) výdavkov spojených s odídcami z Ukrajiny.

V záujme rýchleho časového zabezpečenia potrebných zdrojov pre krytie existujúcich výdavkov, MIRRI SR ako riadiaci orgán navrhuje vyčlenenie požadovanej zostávajúcej výšky 26 000 000 EUR, a to zo zdroja ESF+ vo výške 22 100 000 EUR a národného spolufinancovania vo výške 3 900 000 EUR z alokácie sprostredkovateľského orgánu ESF+ v rámci priorit cieľa politiky 4 PSK 2021 – 2027, a to konkrétne MŠVVM SR tak, aby to nebolo dôvodom zásadnej zmeny programu.

Súčasne MIRRI SR ako riadiaci orgán v rámci strednodobého preskúmania P SK 2021 – 2027 predloží okrem iného návrh na realokáciu zdroja EFRR vo výške 63 809 000 EUR za zdroj EÚ do alokácie zdroja ESF+ vo výške 20 500 000 EUR pre MPSVR SR, do alokácie zdroja ESF+ vo výške 41 881 000 EUR pre MŠVVM SR a do alokácie zdroja ESF+ vo výške 1 428 000 EUR pre MZ SR.

2.3.3 Presuny alokácií v rámci územia

Na základe požiadaviek od územných partnerov začalo MIRRI SR diskutovať o otázke transferov medzi opatreniami IÚI v rámci územnej alokácie daného regiónu alebo územia udržateľného mestského rozvoja. MIRRI SR si uvedomuje, že priority a potreby území sú rôzne, čomu by mala zodpovedať aj koncentrácia alokácií v súlade so špecifickým územným prístupom zameraná na riešenia kľúčových problémov daného regiónu alebo územia udržateľného mestského rozvoja. Nakoľko cieľom MIRRI SR nie je blokovať alokáciu, ale naopak, prispievať k čo najefektívnejšej a bezproblémovej implementácii mechanizmu IÚI, pristúpilo k sériám diskusií s územnými partnermi s jediným cieľom: nasmerovať alokáciu územia do tých opatrení, ktoré sú kľúčové a nosné pre napĺňanie potrieb územia.

Územným partnerom boli predstavené základné pravidlá presunov, územní partneri boli vyzvaní na zaslanie finálnych návrhov a v súčasnosti prebieha evaluácia zaslaných podkladov. Presuny sa týkali viac ako 240 mil. EUR, čo je približne 10% alokácie vyčlenenej pre IÚI mechanizmus.

- Najväčší dopyt je v opatreniach zameraných na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie: viac ako 58 mil. EUR.

- Druhý najväčší dopyt je v opatrení zameranom na budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry: viac ako 47 mil. EUR.
- Tretí najväčší dopyt je v rámci podpory cyklo dopravy takmer 20 mil. EUR.

2.3.4 Zreálnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov

Na základe aktualizácie Metodického usmernenia k podpore integrovaného územného rozvoja, verzia 2.0 – Metodický dokument riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 8 a v súvislosti s požiadavkou územných partnerov o zreálnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov MIRRI SR pristúpilo k riešeniu vzniknutého problému tak, aby čo najviac uľahčilo implementáciu P SK v rámci mechanizmu IÚI.

Na základe žiadosti od SK8 o zreálnenie cieľových hodnôt ukazovateľov bolo zorganizované pracovné stretnutie k merateľným ukazovateľom P SK 2021 – 2027. Po zosumarizovaní a vyhodnotení všetkých podkladov zaslaných z územia budú tieto podklady vstupom do strednodobého preskúmania P SK 2021 – 2027 s cieľom zreálniť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov

2.4 Vyhodnotenie plnenia harmonogramu plánovaných výziev P SK za 2. kvartál 2024

V zmysle zmluvy o poverení zodpovedajú jednotlivé rezorty okrem iného aj za prípravu a zmenu podkladov do harmonogramu plánovaných výziev P SK. Riadiaci orgán s cieľom dostatočnej a včasnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP na financovanie projektov a dostatočnej a včasnej pripravenosti predkladaných projektov vypracúva harmonogram plánovaných výziev vrátane orientačných údajov, ktorý uverejňuje prostredníctvom ITMS a minimálne trikrát za rok ho aktualizuje.

Aktuálna verzia harmonogramu plánovaných výziev P SK bola prerokovaná na Monitorovacom výbore pre P SK 2021 – 2027 dňa 23. 04. 2024 a zverejnená 24. 04. 2024.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 307/2024 úloha B.1. sú jednotlivé rezorty implementujúce P SK povinné vyhodnocovať aktuálne platný harmonogram plánovaných výziev v rámci svojej pôsobnosti, vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka a vyhodnotenie predložiť ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie .

Na 2Q - 4Q 2024 je naplánované vyhlásiť **184 výziev** v celkovej alokácii **6,18 mld. EUR** (EÚ zdroj), z toho v rámci **2Q** bol plán vyhlásiť **69 výziev v celkovej sume 3,23 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Reálne bolo vyhlásených **36³ výziev v celkovej sume 1,67 mld. EUR** (EÚ zdroj), čo predstavuje plnenie plánu počtu vyhlásených výziev na úrovni **52,17 %**. Z hľadiska alokácie výziev je plnenie plánu na úrovni **51,77 %**.

Nevyhlásených tak ostáva **33 výziev** v celkovej hodnote **1,56 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Dôležité je upriamiť pozornosť na fakt, že 57% alokácie výziev, ktoré neboli vyhlásené v 2Q 2024, tvorí 9 výziev s alokáciou nad 50 mil. EUR, v celkovej hodnote 905 mil. EUR.

Tab. č. 8: Stav plnenia plánu vyhlasovania výziev za 2Q po rezortoch podľa počtu vyhlásených výziev

Poskytovateľ	Počet výziev		
	Skutočnosť	Plán	% plnenia
MZ SR	3	3	100,00%
MPSVR SR	1	3	33,33%
ÚV SR	3	4	75,00%
MIRRI SR	13	26	50,00%
MŽP SR	2	9	22,22%
MD SR	10	10	100,00%
MH SR	0	7	0,00%
MŠVVM SR	4	1	400,00%
SIEA	0	6	0,00%
SPOLU	36	69	52,17%

Z pohľadu počtu vyhlásených výziev za 2Q sa MŠVVM SR, MZ SR a MD SR podarilo naplniť plán na 100%, naopak najnižšie plnenie zaznamenalo MH SR a SIEA, ktoré svoje plány vôbec nenaplnili. Priemerné plnenie harmonogramu podľa počtu vyhlásených výziev je na úrovni 52,17 %.

³ v dvoch prípadoch boli v rámci harmonogramu výziev plánované 4 výzvy, ale v skutočnosti boli vyhlásené ako 2. Pre účely korektného vyhodnotenia plnenia harmonogramu sa preto započítava vyhlásenie 4 výziev.

Ak by sme pokračovali rovnakým tempom plnenia harmonogramu, tak na konci roka 2024 bude vyhlásených len 96 výziev oproti 184 plánovaným výzvam. Zostávajúcich 88 výziev by muselo byť presunutých do roku 2025.

Tab. č. 9: Stav plnenia plánu vyhlasovania výziev za 2Q po rezortoch podľa výšky alokácie vyhlásených výziev

Poskytovateľ	Alokácia (zdroj EÚ)		
	Skutočnosť	Plán	% plnenia
MZ SR	26 313 219	27 030 000	97,35%
MPSVR SR	4 250 000	16 535 986	25,70%
ÚV SR	119 887 955	138 987 955	86,26%
MIRRI SR	444 174 567	1 170 472 347	37,95%
MŽP SR	16 999 913	335 700 030	5,07%
MD SR	1 043 129 880	1 102 653 390	94,60%
MH SR	-	146 861 485	0,00%
MŠVVM SR	19 073 058	11 053 148	172,56%
SIEA	-	283 616 910	0,00%
SPOLU	1 673 828 592	3 232 911 251	51,77%

Z pohľadu alokácie vyhlásených výziev za 2Q sa MŠVVM SR, MZ SR, MD SR a ÚV SR podarilo naplniť plán nad 85 %. Nenaplnenie plánu na 100% pri rezortoch MZ, MD SR a ÚV SR, aj napriek tomu, že boli vyhlásené všetky výzvy, mohlo byť spôsobené uplatnením režimu tzv. flexibility v zmysle čl. 18(5) Nariadenia 2021/1060, ktoré neumožňovalo vyhlásiť výzvy v pôvodne predpokladanej výške. Ostatné rezorty naplnili plány na menej ako 50 %. Priemerné plnenie harmonogramu podľa výšky alokácie vyhlásených výziev je na úrovni 51,77 %.

Ak by sme pokračovali rovnakým tempom plnenia harmonogramu, tak na konci roka 2024 budú vyhlásené výzvy v celkovej hodnote 3,2 mld. EUR z plánovaných 6,18 mld. EUR. Zostávajúca alokácia v sume 2,98 mld. EUR by musela byť presunutá do roku 2025, čo môže spôsobiť enormné meškanie v implementácii.

➤ **Dôvody neplnenia harmonogramu výziev**

Medzi najčastejšie dôvody neplnenia harmonogramu výziev SO uvádzajú najmä náročnosť prípravy a schvaľovania výziev, potrebu zapojenia viacerých partnerov pri ich príprave, zdĺhavý proces prípravy a schvaľovania schémy štátnej pomoci. Medzi ďalšie dôvody, ktoré majú vplyv na plnenie harmonogramu výziev patria:

- ✓ Prehodnocovanie implementačnej stratégie PSK v gescii jednotlivých SO
- ✓ Synergické nastavenie podobne zameraných výziev
- ✓ Zmena zámeru národného projektu zo strany partnera SO
- ✓ Zložité diskusie s jednotlivými gestormi pri implementácii projektov.

Tabuľka č. 10: Stav implementácie P SK 2021 - 2027 k 30.06.2024

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Názov priority	Fond	2021 - 2027	Výzvy			Kontrahovanie			Čerpanie - prostriedky vyplatené prijímateľom	
				Alokácia EÚ zdroj	Počet výziev	Alokovaný EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	Počet projektov	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj
1	1P1	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 778 050 000	27	454 508 817	25,56%	8	235 348 174	13,24%	948 396	0,05%
	1P2	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	112 100 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 1	EFRR	1 890 150 000	27	454 508 817	24,05%	8	235 348 174	12,45%	948 396	0,05%
2	2P1	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 276 450 890	6	654 085 101	51,24%	3	465 785 100	36,49%	14 750 000	1,16%
	2P2	Životné prostredie	EFRR/KF	2 030 497 280	24	931 867 333	45,89%	13	104 248 647	5,13%	0	0,00%
	2P3	Udržateľná mestská mobilita	EFRR/KF	890 600 000	5	589 143 826	66,15%	1	10 144 733	1,14%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 2	EFRR/KF	4 197 548 170	35	2 175 096 261	51,82%	17	580 178 480	13,82%	14 750 000	0,35%
3	3P1	Doprava	EFRR/KF	2 003 127 273	9	613 020 221	30,60%	4	216 372 720	10,80%		0,00%
		CELKOM cieľ 3	EFRR/KF	2 003 127 273	9	613 020 221	30,60%	4	216 372 720	10,80%	0	0,00%
4	4P1	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	589 497 494	13	414 751 709	70,36%	12	406 416 436	68,94%	20 925 895	3,55%
	4P2	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	609 293 550	8	465 089 338	76,33%	6	264 644 454	43,43%	93 075 000	15,28%
	4P3	Zručnosť pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu	EFRR/ESF+	252 906 000	4	35 989 892	14,23%	3	34 196 355	13,52%	765 000	0,30%
	4P4	Záruka pre mladých	ESF+	283 969 292	7	227 022 538	79,95%	8	154 182 416	54,30%	3 159 788	1,11%
	4P5	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	1 110 632 000	19	563 735 178	50,76%	16	406 915 909	36,64%	95 952 070	8,64%
	4P6	Aktívne začlenenie rómskych komunit	EFRR/ESF+	269 000 000	7	201 853 956	75,04%	425	160 584 609	59,70%	45 657 433	16,97%
	4P7	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	68 153 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	4P8	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	68 153 000	1	57 173 000	83,89%	1	57 173 000	83,89%	360 000	0,53%
	CELKOM cieľ 4	EFRR/ESF+	3 251 604 336	52	1 965 615 611	60,45%	465	1 484 113 181	45,64%	259 895 186	7,99%	
5	5P1	Moderné regióny	EFRR	400 413 611	2	38 101 715	9,52%	1	7 246 378	1,81%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 5	EFRR	400 413 611	2	38 101 715	9,52%	1	7 246 378	1,81%	0	0,00%
FST	8P1	Fond spravodlivej transformácie	FST	440 658 242	8	263 280 167	59,75%	3	57 164 430	12,97%	6 691 483	1,52%
		CELKOM FST	FST	440 658 242	8	263 280 167	59,75%	3	57 164 430	12,97%	6 691 483	1,52%
TP	7P1	Technická pomoc EFRR	EFRR	255 696 315	17	82 605 156	32,31%	3	980 158	0,38%	0	0,00%
	7P2	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	2	28 272 130	54,76%	-	0	0,00%	0	0,00%
	7P3	Technická pomoc ESF+	ESF+	84 543 983	4	38 637 376	45,70%	2	9 628 386	11,39%	0	0,00%
	7P4	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	1	9 394 211	51,16%	1	3 728 481	20,31%	2 175 000	11,85%
		CELKOM TP		410 233 301	24	158 908 873	38,74%	6	14 337 025	3,49%	2 175 000	0,53%
	CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		12 593 734 933	152	5 668 531 664	45,01%	504	2 594 760 387	20,60%	284 460 065	2,26%	

Zdroj: ITMS21+, export dát 01.07.2024

V prípade, že výzva, žoNFP alebo projekt sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.

Tabuľka č. 11: Stav prijatých a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) k 30.06.2024

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Názov priority	Fond	2021 - 2027	Prijaté ŽoNFP			Schválené ŽoNFP		
				Alokácia EÚ zdroj	Počet ŽoNFP	COV	NFP	Počet ŽoNFP	COV	NFP
1	1P1	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 778 050 000	72	417 600 351	410 648 093	11	348 083 417	348 083 417
	1P2	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	112 100 000	-	0	0	-	0	0
		CELKOM cieľ 1	EFRR	1 890 150 000	72	417 600 351	410 648 093	11	348 083 417	348 083 417
2	2P1	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 276 450 890	595	1 196 677 069	1 193 443 230	184	744 072 268	744 072 268
	2P2	Životné prostredie	EFRR/KF	2 030 497 280	676	754 077 077	714 531 744	31	279 192 300	261 920 927
	2P3	Udržiateľná mestská mobilita	EFRR/KF	890 600 000	2	44 788 410	42 548 990	2	44 788 410	42 548 990
		CELKOM cieľ 2	EFRR/KF	4 197 548 170	1 273	1 995 542 556	1 950 523 963	217	1 068 052 979	1 048 542 185
3	3P1	Doprava	EFRR/KF	2 003 127 273	30	318 717 745	313 584 817	13	277 772 519	275 915 209
		CELKOM cieľ 3	EFRR/KF	2 003 127 273	30	318 717 745	313 584 817	13	277 772 519	275 915 209
4	4P1	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	589 497 494	225	545 805 382	545 193 068	12	485 351 212	484 738 897
	4P2	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	609 293 550	8	312 441 468	311 039 630	6	311 346 417	310 032 183
	4P3	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu	EFRR/ESF+	252 906 000	3	40 231 006	40 231 006	3	40 231 006	40 231 006
	4P4	Záruka pre mladých	ESF+	283 969 292	201	229 256 078	228 090 576	11	184 117 316	182 951 814
	4P5	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	1 110 632 000	56	652 148 658	651 976 222	16	634 968 967	634 796 531
	4P6	Aktívne začlenenie rómskych komúnit	EFRR/ESF+	269 000 000	470	196 098 717	196 098 717	427	190 117 712	190 117 712
	4P7	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	68 153 000	-	0	0	-	0	0
	4P8	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	68 153 000	1	63 525 556	63 525 556	1	63 525 556	63 525 556
	CELKOM cieľ 4	EFRR/ESF+	3 251 604 336	777	2 039 506 865	2 036 154 775	470	1 909 658 186	1 906 393 700	
5	5P1	Moderné regióny	EFRR	400 413 611	2	23 525 150	21 643 138	1	8 525 150	7 843 138
		CELKOM cieľ 5	EFRR	400 413 611	2	23 525 150	21 643 138	1	8 525 150	7 843 138
FST	8P1	Fond spravodlivej transformácie	FST	440 658 242	46	323 145 413	252 482 640	32	145 554 084	133 392 413
		CELKOM FST	FST	440 658 242	46	323 145 413	252 482 640	32	145 554 084	133 392 413
TP	7P1	Technická pomoc EFRR	EFRR	255 696 315	11	20 833 815	20 789 123	7	12 603 263	12 580 903
	7P2	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	1	6 090 900	6 090 900	1	6 090 900	6 090 900
	7P3	Technická pomoc ESF+	ESF+	84 543 983	4	24 899 703	24 899 703	2	13 117 691	13 117 691
	7P4	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	1	4 971 309	4 971 309	1	4 971 309	4 971 309
		CELKOM TP		410 233 301	17	56 795 726	56 751 034	11	36 783 163	36 760 803
		CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		12 593 734 933	2 217	5 174 833 806	5 041 788 461	755	3 794 429 497	3 756 930 866

Zdroj: ITMS21+, export dát 01.07.2024; COV= celkové oprávnené výdavky.

V prípade, že ŽoNFP sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.
