

INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE IMPLEMENTÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA V GESCIÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR S VÝHLADOM DO KONCA ROKU 2023

Stav implementácie k 31.12.2020

V programovom období 2014 – 2020 je výška alokácie pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), časť Výskum a inovácie v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) **686 874 051 EUR** z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“ alebo „zdroj EÚ“) (k 1.1.2020 bola alokácia 887 617 173 EUR).

Vyhlásené výzvy/vyzvania

K 31.12.2020 boli v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR vyhlásené výzvy a vyzvania v celkovej sume **774 874 296,27 EUR** zo zdrojov EÚ, čo predstavuje približne **112,81 %** z prislúchajúcej alokácie operačného programu v gescii MŠVVaŠ SR.


Tabuľka č.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31.12.2020

Prioritná os	Alokácia	Vyhlásené výzvy/vyzvania	
	EUR	EUR	% z alokácie
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	567 169 204	630 052 162,31	111,09%
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	84 704 847	98 050 000,00	115,75%
PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)	35 000 000	46 772 133,96	133,63%
SPOLU	686 874 051	774 874 296,27	112,81%

Kontrahovanie

Suma kontrahovaných prostriedkov za zdroj EÚ k 31.12.2020 dosiahla úroveň **481 440 086,61 EUR**, čo vo vzťahu k prislúchajúcej alokácii operačného programu v gescii MŠVVaŠ SR predstavuje **70,76 %** (k 1.1.2020 bola úroveň kontrahovania 329 549 327,99 EUR, t.j. 37,13%).

Graf č. 1: Prehľad alokovaných a voľných prostriedkov OPII v gescii MŠVVaŠ SR (v %) k 31.12.2020

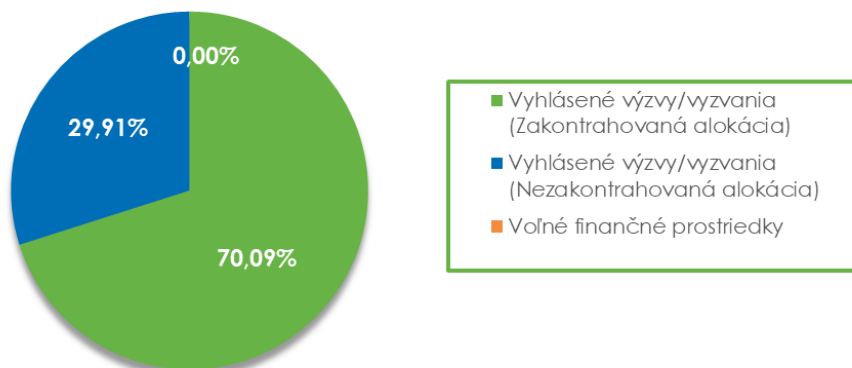

Čerpanie

Čerpanie finančných prostriedkov schválené Certifikačným orgánom pre štrukturálne fondy Európskej únie a Kohézny fond (Ministerstvo financií SR) po zohľadnení nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov predstavovalo k 31.12.2020 sumu **132 164 325,30 EUR** zo zdrojov EÚ, čo vo vzťahu k prislúchajúcej alokácii operačného programu v gescii MŠVVaŠ SR predstavuje približne **19,24 %** (k 1.1.2020 bola úroveň čerpania 64 029 134,95 EUR, t.j. 7,21%).

Tabuľka č. 2 Kontrahovanie a čerpanie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31.12.2020

Prioritná os	Alokácia	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)		Čerpanie na úrovni CO	
	EUR	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	567 169 204	364 246 089,87	64,22%	99 356 237,14	17,52%
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	84 704 847	80 722 559,33	95,30%	6 703 929,25	7,91%
PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)	35 000 000	36 471 437,41	104,20%	26 104 158,91	74,58%
SPOLU	686 874 051	481 440 086,61	70,09%	132 164 325,30	19,24%

Aktivity realizované v 2020

V roku 2020 MŠVVaŠ SR a Výskumná agentúra ukončili vyhodnotenie a kontrahovanie nasledujúcich výziev:

- *Dlhodobý strategický výskum – Dopravné prostriedky pre 21. storočie*
 Počet predložených ŽoNFP: 7
 Žiadaná suma: 73 989 913,22 EUR (zdroj EÚ)
 Počet zazmluvnených projektov: 2
 Kontrahovaná suma: 19 580 586,88 EUR (zdroj EÚ)

- *Dlhodobý strategický výskum – Zdravé potraviny a životné prostredie*
 Počet predložených ŽoNFP: 11
 Žiadaná suma: 81 581 752,03 EUR (zdroj EÚ)
 Počet zazmluvnených projektov: 4
 Kontrahovaná suma: 33 931 630,13 EUR (zdroj EÚ)
- *Dlhodobý strategický výskum – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie*
 Počet predložených ŽoNFP: 10
 Žiadaná suma: 68 539 561,31 EUR (zdroj EÚ)
 Počet zazmluvnených projektov: 5
 Kontrahovaná suma: 40 534 047,73 EUR (zdroj EÚ)
- *Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo BA*
 Počet predložených ŽoNFP: 7
 Žiadaná suma: 36 361 342,08 EUR (zdroj EÚ)
 Počet zazmluvnených projektov: 5
 Kontrahovaná suma: 26 029 117,49 EUR (zdroj EÚ)
- *Systémová verejná výskumná infraštruktúra v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie*
 Počet predložených ŽoNFP: 2
 Žiadaná suma: 30 643 593,12 EUR (zdroj EÚ)
 Počet zazmluvnených projektov: 2
 Kontrahovaná suma: 26 294 411,41 EUR (zdroj EÚ)
- *Centrá excelentnosti nadnárodného významu – II. Etapa*
 Počet predložených ŽoNFP: 4
 Žiadaná suma: 15 469 165,96 EUR (zdroj EÚ)
 Počet zazmluvnených projektov: 2
 Kontrahovaná suma: 7 871 438,57 EUR (zdroj EÚ)

Opatrenia realizované na podporu boja s dopadmi pandémie spôsobenej vírusom COVID-19

Uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 bol schválený materiál „*Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandemiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov*“, ktorý mal vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať. Súčasťou tohto dokumentu boli viaceré opatrenia, ktoré realizovalo aj MŠVVaŠ SR:

- Realokácia v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na podporu pre mikro, malé a stredné podniky (50 mil. EUR za zdroj EÚ);
- Realokácia do Operačného programu Ľudské zdroje na podporu udržania zamestnanosti (70 mil. EUR za zdroj EÚ);
- Vyhlásenie 2 výziev v oblasti výskumu a inovácií zameraných na podporu boja s pandemiou spôsobenou vírusom COVID-19 (termín vyhlásenia 5.8.2020, uzávierka 1. kola 31.8.2020, uzávierka 2. kola 30.9.2020):

- *Účasť slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 20 mil. EUR)*
- *Mobilizácia a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (alokácia 60 mil. EUR, s následným zvýšením alokácie o 20 mil. EUR)*

Aktuálna situácia COVID výziev:

- *Účasť slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 20 mil. EUR)*

Počet predložených ŽoNFP:	11
Žiadaná suma:	19,2 mil. EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov:	3
Kontrahovaná suma:	5,2 mil. EUR (zdroj EÚ)
Vydané rozhodnutia o schválení:	6 (zmluva o NFP v príprave)
Alokácia rozhodnutí o schválení:	10,4 mil. EUR (zdroj EÚ)

Celková predpokladaná suma kontrahovania do konca marca: 15,6 mil. EUR (zdroj EÚ).

- *Mobilizácia a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (alokácia 60 mil. EUR, s následným zvýšením alokácie o 20 mil. EUR)*

Počet predložených ŽoNFP:	46
Žiadaná suma:	138,8 mil. EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov:	1. kolo: 2
Kontrahovaná suma:	1. kolo: 8,1 mil. EUR (zdroj EÚ)
Vydané rozhodnutia o schválení:	1. kolo: 14 (zmluva o NFP v príprave)
Alokácia rozhodnutí o schválení:	1. kolo: 50,6 mil. EUR (zdroj EÚ)

ŽoNFP predložené v 2. kole tejto výzvy sú aktuálne v priebehu hodnotenia a ich zazmluvnenie musí byť ukončené do 30.6.2021, kedy končí platnosť Dočasnej schémy štátnej pomoci.

Analýza výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v doménach Priemysel pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel - Závěry

Predmetom analýzy sú dve DSV výzvy :

- *OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel*
- *OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie*

Okrem uvedených dvoch DSV výziev boli vyhlásené ďalšie 3 DSV výzvy :

- *OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie*
- *OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie*
- *OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie*

Všetky výzvy DSV boli vyhlásené súčasne dňa 14.08.2018 a zároveň uzatvorené 29.03.2019.

Riziko takto nastaveného termínu vyhlásenia a uzatvorenia výziev sa okamžite prejavilo v zahltení administratívnych kapacít Výskumnej agentúry. Celkovo prišlo 63 ŽoNFP v požadovanej výške NFP na úrovni 645,5 mil. EUR, pričom každá žiadosť mala minimálne jedného partnera. Počet partnerov v žiadostiach nebol limitovaný. Predložené žiadosti o NFP mali v priemere 6 – 7 partnerov (niektoré mali viac ako 10 partnerov). Keďže každý partner v rámci predložených ŽoNFP musí prejsť počas administratívneho overovania kontrolou splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku rovnako ako žiadateľ, jedná sa o značne časovo náročný proces.

V druhom štvrtroku 2020 sa proces konania o žiadostiach dostal do časového sklzu z dôvodu prvej vlny pandémie COVID-19 a následného „lockdownu“ a komunikácia so žiadateľmi / prijímateľmi sa zásadne skomplikovala a spomalila.

V danom období sa pristúpilo k procesu realokácie zdrojov z menej výkonných operačných programov do oblastí, kde Slovenská republika potrebuje zabezpečiť minimalizáciu negatívnych dopadov pandémie spôsobenej vírusom COVID-19 na sociálnu a ekonomickú oblasť.

Oblasť Výskumu a inovácií v gescii MŠVVaŠ SR po problémoch z minulosti vykazovala nízku mieru čerpania a kontrahovania a z dôvodu prevencie možného nevyčerpania finančných prostriedkov do konca roku 2023 sa preto rozhodnutím vlády SR UV č. 257/2020 schválil presun časti finančných prostriedkov mimo OPII do Operačného programu Ľudské zdroje a zároveň presun časti finančných prostriedkov pod gesciu MH SR na podporu krízou zasiahnutého súkromného sektoru. MŠVVaŠ SR presúvalo finančné prostriedky, ktoré reálne nevykazovalo ako disponibilné zdroje, ale malo ich viazané v neukončených výzvach. Neukončené výzvy sa z tohto dôvodu stali nekryté zdrojmi EÚ.

Súbežne v tom čase Európska komisia (ďalej aj „EK“) umožnila vytvorenie špecifických schém štátnej pomoci, na základe ktorých boli dňa 5.8.2020 vyhlásené dve „COVID-19“ výzvy v zmysle predmetného Uznesenia vlády SR č. 257/2020, pričom v tom čase mohli mať schémy obmedzenú platnosť do 31.12.2020. To znamená, že tento dátum bol aj posledným možným termínom na uzatvorenie zmluvy o NFP so žiadateľmi podliehajúcimi tejto schéme. Aby bolo možné zvládnuť nápor predložených ŽoNFP na podporu boja s pandemiou COVID-19 a jej

následkami včas, administratívny proces konania o žiadostiach bol prioritne zameraný len na ŽoNFP v rámci COVID-19 výziev.

V rámci zrušených výziev DSV boli z celkového počtu 35 ŽoNFP zamietnuté na začiatku procesu 3 ŽoNFP v procese administratívneho overovania. Celková alokácia predložených žiadostí za EÚ zdroj predstavuje 270,7 mil. EUR, pričom alokácia výziev predstavovala úroveň 155 mil. EUR (zdroj EÚ), čo znamená, že by neboli uspokojené všetky predložené žiadosti.

V čase podania ŽoNFP v termíne od 29.3.2019 bolo plánovaných 753 verejných obstarávaní (ďalej len „VO“), pričom k 31.12.2020 evidujeme 15 zrealizovaných (1,99% z celkového počtu). Zostávajúce VO sú v rámci ITMS2014+ evidované ako nezačaté (viď príloha č. 1).

Tabuľka č. 5 Stav VO v predložených ŽoNFP v rámci dvoch zrušených výziev DSV

Celková alokácia ŽoNFP	Objem VO*		Celkový počet VO	Počet VO - zrealizovaných**	
	EUR	% z celkovej alokácie		Počet	% z celkového počtu
346 328 701	105 968 255	30,60	753	15	1,99

* 3 z 32 ŽoNFP neuvádzajú údaje o VO, ale z opisu je zrejmé, že sa bude obstarávať výskumná infraštruktúra

** Ukončené Verejné obstarávanie po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom

Z dôvodu celonárodnej dôležitosti/potreby riešiť urgentne situáciu v súvislosti s podporou riešenia pandémie COVID-19 sa museli sústrediť dostupné ľudské zdroje na administrovanie ŽoNFP ako aj faktu, že dočasná schéma štátnej pomoci pre výzvy zamerané na problematiku COVID-19 je platná len do 30.06.2021. V procese administratívneho overovania ŽoNFP v rámci 2 nevyhodnotených DSV výziev by bolo možné pokračovať až po ukončení konaní o žiadostiach „COVID-19“ výziev, kde sa predpokladá, že k zazmluvneniu bude dochádzať v priebehu mesiacov jún-júl 2021. Vzhľadom na náročnosť konania o žiadostiach vo výzvach DSV je možné predpokladať, že k vyhodnoteniu žiadostí a následnému zazmluvňovaniu by došlo najskôr koncom roka 2021. Následne je nevyhnutné zohľadniť čas potrebný na úspešnú realizáciu procesu VO (za ideálnych podmienok minimálne 6 mesiacov), o ktorý sa skrátí disponibilný čas na reálnu realizáciu projektu. Za takýchto podmienok je možné predpokladať skutočný začiatok projektov najskôr začiatkom roku 2022.

Na základe uvedených údajov muselo MŠVVaŠ SR zodpovedať nasledujúce otázky:

1. Je možné zrealizovať projekt zameraný na „dlhodobý strategický výskum“ pôvodne plánovaný na obdobie 4-5 rokov za obdobie 1,5 roka?
2. Ako bude prebiehať proces výskumu, ak bude pandémia COVID-19 naďalej pretrvávajúť aj v nasledujúcich rokoch?
3. Ak projekty nenaplnia stanovené ciele a ukazovatele, budú prijímatelia (v prípade univerzít, Slovenskej akadémie vied a jej ústavov je to štát) ochotní znášať korekcie?
4. Ak v roku 2023 nebudú vyčerpané finančné prostriedky z týchto projektov a zároveň bude udelená korekcia na vyčerpanú časť z dôvodu nenaplnenia cieľov a ukazovateľov, bude verejnosť, odborná aj laická, ochotná akceptovať takto nevyužitú a prepadnutú zdroj?

Po posúdení takto položených otázok a na základe vyššie uvedených údajov MŠVVaŠ SR dospelo k záveru, že v prípade oboch DSV výziev ide o výzvy s vysokým rizikom nenaplnenia cieľov a ukazovateľov predmetných projektov a nevyčerpania finančných

prostriedkov určených na predmetné výzvy a projekty a tým aj trvalej straty finančných prostriedkov pre oblasť výskumu a inovácií v Slovenskej republike.

Na základe vyššie uvedeného MŠVVaŠ SR pristúpilo k rozhodnutiu zrušiť tieto vysoko rizikové výzvy a uvoľniť takto finančné prostriedky pre efektívnejší a hlavne bezpečnejší spôsob ich využitia a pristúpilo k zrušeniu výziev.

Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu v doménach Priemysel pre 21. storočie (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05) a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07) boli zrušené 14.01.2021.

Využitie uvoľnených prostriedkov

S cieľom zabezpečiť efektívne využitie uvoľnených prostriedkov OP II v gescii MŠVVaŠ SR a minimalizovať riziko ich straty, boli analyzované možnosti realokácie v rámci OP II.

MH SR ako spolugestor prioritných osí 9 a 10, zameraných na oblasť výskumu a vývoja, už v predchádzajúcom období identifikovalo dodatočnú absorpčnú kapacitu a potenciál pre realizáciu ďalšej podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Aj v nadväznosti na odporúčanie vyplývajúce z Uznesenia RV VTI z 12. decembra 2019 k návrhu na aktivizáciu kľúčových opatrení na podporu konkurencieschopnosti SR v rámci podpory výskumu a inovácií, MH SR navrhovalo financovanie projektov, ktoré sú súčasťou tzv. EuBatIn IPCEI (*European Battery Innovation - Important Project of Common European Interest*).

IPCEI projekty umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty v celej EÚ s cieľom prekonať významné zlyhania trhu alebo systémové zlyhania a spoločenské výzvy, ktoré by nebolo možné riešiť inak. Ich úlohou je spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom uskutočniť rozsiahle projekty, ktoré poskytujú významné prínosy pre EÚ. Projekty majú zásadný inovačný charakter alebo významnú pridanú hodnotu v príslušnom sektore a sú schvaľované zo strany EK.

Za SR sa v roku 2019 zapojilo päť spoločností. Všetky predložené projekty boli predmetom posudzovania EK v rámci niekoľkých kôl prednotifikačného procesu. Počas tohto procesu boli projekty dôkladne zhodnotené a zanalyzované po ekonomickej, technickej a finančnej stránke. Súčasťou bola notifikácia štátnej pomoci, ktorá, vzhľadom na strategicky významné projekty s dosahom na celú EÚ, výrazným spôsobom prekračuje bežné limity štátnej pomoci. Do procesu notifikácie sa dostali štyri projekty, ktoré boli schválené vydaním rozhodnutia o notifikácii zo strany EK v januári 2021. Všetky projekty zahŕňajú spoluprácu s významnými slovenskými univerzitami.

V rámci OP II bude financovaná prvá časť IPCEI projektov, zahŕňajúca podstatnú časť výskumno – vývojovo – inovačnej fázy. Realizácia projektu, t.j. vynakladanie oprávnených výdavkov môže z hľadiska časovej oprávnenosti prebiehať v termíne od 14. decembra 2020 (dátum notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou republikou) do 31. decembra 2023.

MH SR zároveň prijalo opatrenia pre výrazné skrátenie konania o žiadosti, čím bude zabezpečená skoršia implementácia projektov. CKO v tejto súvislosti schválil výnimku zo Systému riadenia EŠIF. Monitorovací výbor pre OP II dňa 18.3.2021 schválil upravené *Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP II pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR, verzia 6.0*. Na výzvu, ktorá bude vyhlásená v rámci PO9, bola indikatívne alokovaná suma 50 mil. EUR zo zdroja EÚ.

Zvyšnú časť uvoľnených zdrojov využije MH SR na synergickú podporu investícií prostredníctvom doplnkového grantového financovania projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc v zmysle zákona 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci. Podporené budú najmä investície do technologických inovácií s dôrazom na vysokú pridanú hodnotu z pohľadu inteligentných riešení, ako aj výskumno-vývojových činností v podnikoch. Aktivita reaguje, okrem iného, na aktuálny vývoj na trhu investícií, kde sa v dôsledku snáh o zásadnú konsolidáciu z dôvodu pandémie COVID-19 otvárajú významné príležitosti pre získanie nových rozvojových a greenfieldových investícií. Zámer výzvy bol schválený radou Technologickej agentúry a Stálou komisiou Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 bez výhrad a výzva s kompletnou dokumentáciou bola predložená na chválenie MIRRI SR dňa 29.3.2021.

Využitie uvoľnených zdrojov na podporu projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií považujeme za optimálne riešenie pre efektívne využitie zdrojov spoločného operačného programu, ktoré minimalizuje riziko nedočerpania a straty časti alokácie. Týmto spôsobom nedochádza k zmene využitia na tematicky inú oblasť podpory a zdroje zostávajú v prioritnej osi zameranej na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Predmetné vnútorné presuny nemajú vplyv na celkový finančný plán operačného programu a nepodliehajú schvaľovaniu na úrovni EK.

Zástupcovia EK boli o presunoch a ich dôvodoch informovaní na spoločnom rokovaní dňa 17.3.2021 (Close Monitoring Meeting), pričom EK vyjadrila tomuto riešeniu podporu, ocenila zodpovedný prístup MŠVVŠ SR a MH SR a potvrdila jeho optimálnosť vzhľadom na vzniknutú situáciu a riziko dekomitmentu na konci programového obdobia pri zdrojoch vyčlenených na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci OP II.

Stav implementácie k 15.02.2021 Vyhlásené výzvy/vyzvania

K 15.02.2021 boli v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR vyhlásené výzvy a vyzvania v celkovej sume **639 850 296,27 EUR** zo zdrojov EÚ, čo predstavuje približne **93,15 %** z prislúchajúcej alokácie operačného programu v gescii MŠVVaŠ SR.


Tabuľka č.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 15.02.2021

Prioritná os	Alokácia	Vyhlásené výzvy/vyzvania	
	EUR	EUR	% z alokácie
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	567 169 204	494 820 162,31	87,24%
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	84 704 847	98 050 000,00	115,75%
PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)	35 000 000	46 980 133,96	134,23%
SPOLU	686 874 051	639 850 296,27	93,15%

Kontrahovanie

Suma kontrahovaných prostriedkov za zdroj EÚ k 15.02.2021 dosiahla úroveň **486 065 681,5 EUR**, čo vo vzťahu k prislúchajúcej alokácii operačného programu v gescii MŠVVaŠ SR predstavuje **70,76 %**.

Graf č. 1: Prehľad alokovaných a voľných prostriedkov OPII v gescii MŠVVaŠ SR (v %) k 15.02.2021

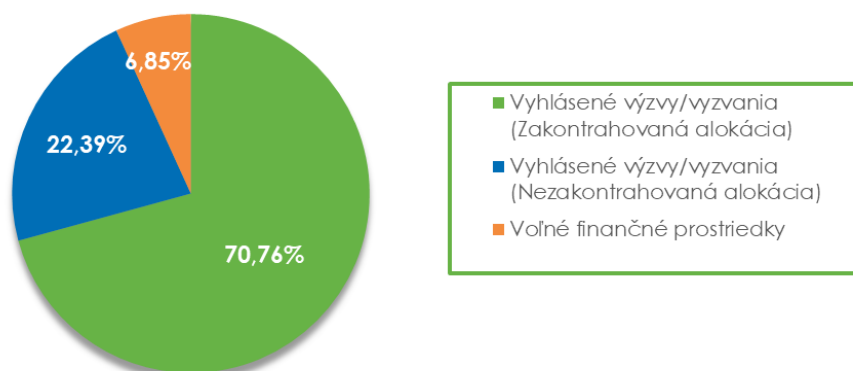

Čerpanie

Čerpanie finančných prostriedkov schválené Certifikačným orgánom pre štrukturálne fondy Európskej únie a Kohézny fond (Ministerstvo financií SR) po zohľadnení nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov predstavovalo k 15.02.2021 sumu **132 933 138,21 EUR** zo zdrojov EÚ, čo vo vzťahu k prislúchajúcej alokácii operačného programu v gescii MŠVVaŠ SR predstavuje približne **19,35 %**.

Tabuľka č. 2 Kontrahovanie a čerpanie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 15.02.2021

Prioritná os	Alokácia	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)		Čerpanie na úrovni CO	
	EUR	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	567 169 204	368 871 684,76	65,04%	100 024 391,19	17,64%
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	84 704 847	80 722 559,33	95,30%	6 709 645,78	7,92%
PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)	35 000 000	36 471 437,41	104,20%	26 199 101,24	74,85%
SPOLU	686 874 051	486 065 681,50	70,76%	132 933 138,21	19,35%

Plán vývoja implementácie do konca roku 2023

V rámci revízie OPII, verzie 10.0, je plánovaná vnútorná realokácia finančných prostriedkov v prioritných osiach 9 a 10 medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) za účelom maximálneho využitia finančných prostriedkov na podporu riešenia aktuálne situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a minimalizácie rizika nedočerpania disponibilnej alokácie operačného programu v časti Výskum a inovácie. V prioritnej osi 9 je plánovaná realokácia 100 mil. EUR zo zdrojov EÚ z časti v gescii MŠVVaŠ SR do časti v gescii MH SR a v prioritnej osi 10 realokácia 2,73 mil. EUR zo zdrojov EÚ z časti v gescii MH SR do časti v gescii MŠVVaŠ SR.

Tabuľka č. 3 Stav alokácie OPII v gescii MŠVVaŠ SR po revízii (verzia 10.0) k 15.02.2021

Prioritná os	Alokácia po revízii OPII v10.0	Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)	Vinkulovaná alokácia v neukončených výzvach	Vinkulovaná alokácia spolu	Disponibilná alokácia
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)	467 169 204	368 871 684,76	88 006 560,94	456 878 245,70	10 290 958,30
PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)	87 434 847	80 722 559,33	4 562 317,85	85 284 877,18	2 149 969,82
PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)	35 000 000	36 471 437,41	0,00	36 471 437,41	-1 471 437,41
SPOLU	589 604 051	486 065 681,50	92 568 878,79	578 634 560,29	10 969 490,71

Plánované výzvy

MŠVVaŠ SR plánuje v tomto roku vyhlásiť 2 dopytovo-orientované výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančných príspevkov (ďalej aj „ŽoNFP“) zamerané na podporu:

- výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji mimo Bratislavského kraja (prioritná os 9),
- výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a Výskumných centier v Bratislavskom kraji (prioritná os 10).

Indikatívne alokácie pre jednotlivé výzvy budú stanovené v závislosti od aktuálnej disponibilnej alokácie a plánovaných úspor v rámci realizovaných projektov.

Plán kontrahovania

MŠVVaŠ SR plánuje zakontrahovať do konca roku 2021 viac ako 95 % z celkovej alokácie OPII vo svojej gescii, pričom podstatná väčšina prostriedkov bude zazmluvnená do 30.6.2021 v rámci Covid výziev. Zvyšná disponibilná alokácia bude zazmluvnená v prvej polovici roku 2022, pričom sa bude jednať o projekty z vyššie uvedených plánovaných výziev.

Plán čerpania

Plán čerpania zohľadňuje charakter aktivít, alokáciu a predpokladanú dĺžku realizácie projektov. Vzhľadom na naviazanosť výraznej časti alokácie projektov na verejné obstarávania a koniec ich realizácie až v roku 2023 nebude možné zabrániť najvýraznejšiemu čerpaniu až v poslednom roku realizácie operačného programu.

Tabuľka č. 4 Plán čerpania OPII v gescii MŠVVaŠ SR

Príoritná os (MŠVVaŠ SR, VA)	Zameranie projektov	Čerpanie k 31.12.2020	Plán čerpania			Spolu
			v roku 2021	v roku 2022	v roku 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PO 9	DOP výzvy	67 973 738	98 445 297	72 057 446	100 516 616	338 993 097
	Národné projekty	31 382 499	11 961 108	22 437 519	24 677 441	90 458 567
	Nová/é výzva/y*	0	0	8 000 000	22 000 000	30 000 000
	SPOLU	99 356 237	110 406 405	102 494 965	147 194 057	459 451 664
PO 10	DOP výzvy	3 695 680	5 095 000	7 391 389	11 214 654	27 396 723
	Veľký projekt	3 008 249	22 908 875	13 024 317	16 291 437	55 232 878
	Nová/é výzva/y*	0	0	1 000 000	3 500 000	4 500 000
	SPOLU	6 703 929	28 003 875	21 415 706	31 006 091	87 129 601
PO 13	Technická pomoc	26 104 159	660 919	2 495 000	5 582 000	34 842 078
SPOLU		132 164 325	139 071 198	126 405 671	183 782 148	581 423 343

* plán čerpania na nové výzvy je len indikatívny a je závislý od disponibilnej alokácie.

Riziká a opatrenia implementácie operačného programu

Riziko: Nedočerpanie finančných prostriedkov na konci programového obdobia

Možné príčiny: nevyčerpanie celkovej zazmluvnenej alokácie na projekty; mimoriadne ukončenie projektov (vrátenie celej alokácie); nezrovnalosti.

Opatrenia: komunikácia s prijímateľmi a včasná identifikácia rizík implementácie projektov; vyhlásenie zásobníkovej výzvy na krátkodobé projekty s možnosťou spätnej refundácie už uhradených výdavkov na prebiehajúce aktivity, ktoré by po uvoľnení alokácie mohli ihneď vstúpiť do implementácie.

Riziko: Nenaplnenie záväzku N+3

Možné príčiny: problémy s kľúčovými verejnými obstarávaniami; mimoriadne ukončenie projektov; nezrovnalosti; nedostatočné administratívne kapacity.

Opatrenia: komunikácia s prijímateľmi a včasná identifikácia rizík implementácie projektov; posilnenie administratívnych kapacít na spracovanie predložených žiadostí o platbu.

Riziko: Predĺžený čas konania o žiadostiach

Možné príčiny: nedostatok (nezáujem, konflikt záujmov a pod.) odborných hodnotiteľov; nedostatočné administratívne kapacity.

Opatrenia: finančná/nefinančná motivácia odborných hodnotiteľov; dištančné hodnotenie bez nutnosti osobného kontaktu; posilnenie administratívnych kapacít na posudzovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; optimalizácia a zjednodušenie interných procesov.
