

Návrh procesu prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu

Príprava Národného a regionálneho partnerského plánu (ďalej len „NRPP“) začne prebiehať od januára 2026. Vypracovaný návrh NRPP má byť, podľa úlohy C.8 uznesenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) č. 546 z 5. novembra 2025, predložený na schválenie vláde SR do konca októbra 2027. S cieľom zabezpečiť plnú implementáciu operácií od 1. januára 2028 bude ambíciou predložiť návrh NRPP na schválenie vláde SR v skoršom termíne (august 2027).

Proces prípravy možno rozdeliť na dve základné etapy:

Prvá etapa v roku 2026 obsiahne proces prípravy zameraný najmä na identifikáciu investičných priorít a kľúčových reforiem, ktoré Slovensko (národná úroveň a územná samospráva) plánuje financovať zo zdrojov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) prostredníctvom NRPP.

Identifikácia priorít, ktoré budú financované zo zdrojov Európskeho fondu pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034, bude prepojená s návrhom Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 (ďalej len „VaS SK 2040“) a návrhom Investičného plánu Slovensko (ďalej len „IPS“).

Z uvedeného dôvodu bude nevyhnutné, aby gestor¹⁾ a spolugestori²⁾ koordinácie prípravy NRPP veľmi úzko spolupracovali s gestormi prípravy oboch vyššie uvedených strategických dokumentov.

V druhej etape od jesene 2026, najneskôr od začiatku roka 2027, sa predpokladá vypracúvanie návrhu NRPP v súlade so vzorom stanoveným v návrhu príslušnej legislatívy EÚ, tzn. vyplňanie všetkých povinných častí, ktoré dokument musí obsahovať v súlade so stanovenými požiadavkami a pri dodržaní všetkých stanovených pravidiel.

Jednotlivé ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“) aj zástupcovia územnej samosprávy³⁾ musia byť ale pripravení definovať konkrétne opatrenia a k nim prislúchajúce míľniky a ciele tak, ako to vyžaduje návrh nariadenia NRPP hneď od začiatku procesu prípravy NRPP.

Pri príprave NRPP bude, v zmysle požiadavky návrhu legislatívy EÚ⁴⁾, zabezpečené uplatňovanie princípu partnerstva počas celého procesu jeho vypracovania, a to od úvodnej fázy prípravných prác až po začatie formálneho schvaľovania vypracovaného návrhu NRPP. Zároveň bude v tomto procese zabezpečené dodržiavanie zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

¹⁾ Gestorom koordinácie prípravy NRPP je (podľa uznesenia vlády SR č. 546 z 5. 11. 2025) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

²⁾ Spolugestormi koordinácie prípravy NRPP sú (podľa uznesenia vlády SR č. 546 z 5. 11. 2025) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

³⁾ Pod pojmom „zástupcovia územnej samosprávy“ sa rozumejú na regionálnej úrovni zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov a zástupcovia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) a na miestnej úrovni zástupca Únie miest Slovenska a zástupca Združenia miest a obcí Slovenska

⁴⁾ Čl. 6 návrhu nariadenia EP a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/955 a nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509 a podľa prílohy V tohto nariadenia, kde sa stanovujú požiadavky na obsah a vzor NRPP.

Stručný popis jednotlivých krokov v procese prípravy NRPP

(Pozn. jednotlivé procesy neprebiehajú izolovane, naopak sú vzájomne previazané)

Identifikácia sektorových investícií ako súčasti NRPP

(a ich previazanie s prípravou Investičného plánu Slovensko)



V zmysle schváleného Návrhu na vytvorenie Investičného plánu Slovensko (podľa uznesenia vlády SR č. 613 z 10. decembra 2025) budú ÚOŠS so zapojením zástupcov územnej samosprávy identifikovať, bez ohľadu na zdroj financovania, prioritné investičné potreby jednotlivých sektorových politík (február 2026 – apríl 2026) a následne identifikovať prioritné investičné zámery s realizáciou do roku 2035 (apríl 2026 – jún 2026), ktoré budú napĺňať prioritné investičné potreby identifikované v prvom kroku.

Za vypracovanie NRPP obsahujúceho (okrem iného) aj návrh investícií a reforiem, ktoré budú podporované zo zdrojov EÚ, zodpovedá gestor a spolugestori koordinácie prípravy NRPP. V tejto súvislosti bude gestor a spolugestori spolu s Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“) komunikovať s ÚOŠS a zabezpečovať proces identifikácie sektorových investícií, ktoré budú súčasťou NRPP.

Vo vzťahu k príprave návrhu NRPP bude nevyhnutné, aby ÚOŠS pri tých investíciách (investičných zámeroch), pri ktorých predpokladajú financovanie zo zdrojov EÚ, konkrétne zo zdrojov Európskeho fondu pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034, boli pripravené poskytnúť relevantné informácie/údaje, ktoré je potrebné uvádzať v návrhu NRPP⁵⁾ (napr. príspevok navrhovanej investície k plneniu špecifických cieľov, ich zaradenie k stanoveným oblastiam intervencií, definovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov a vypracovanie indikatívneho harmonogramu realizácie).

Pri sektorových investíciách identifikovaných pre NRPP bez ohľadu na nositeľa investície bude, z hľadiska efektívneho využitia zdrojov EÚ, dôležité zohľadňovať aj ich územný rozmer.

Spolupráca pri nadrezortnej prioritizácii investičných zámerov pre účely Investičného plánu Slovensko



Súčasťou prípravy návrhu IPS bude aj nadrezortná prioritizácia identifikovaných investičných zámerov, ktorá vytvorí zásobník prioritných investičných zámerov s realizáciou do roku 2035 (ale aj indikatívny zásobník prioritných investičných zámerov s realizáciou po roku 2035). Zároveň bude zostavený finančný plán s vymedzením prepojenia na všetky zdroje financovania vrátane zdrojov EÚ, s dôrazom


⁵⁾ Podľa čl. 22 návrhu nariadenia EP a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/955 a nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509 a podľa prílohy V tohto nariadenia, kde sa stanovujú požiadavky na obsah a vzor NRPP.

na previazanosť na NRPP ako hlavný strategický dokument pre využívanie finančných zdrojov EÚ na roky 2028 – 2034, v súlade s príslušnou legislatívou EÚ.

V tejto súvislosti bude dôležité, aby už metodika⁶⁾ nadrezortnej prioritizácie, v rámci ktorej sa posudzujú návrhy prioritných investičných zámerov pre účely IPS, predovšetkým zohľadňovala, pri investíciách s predpokladaným financovaním prostredníctvom NRPP, relevantné požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ vzťahujúcej sa na obsah NRPP. Výsledky prioritizácie budú následne môcť byť využité pri príprave návrhu NRPP⁷⁾. Zostavenie zásobníka prioritných investícií bude zároveň úzko previazané s pripravovanou VaS SK 2040.

Identifikácia sektorových reforiem ako súčasti NRPP

(previazanie s Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2040)



Súčasťou NRPP má byť aj návrh kľúčových reforiem, ktorých realizácia prispeje nielen k rozvoju Slovenska, ale aj k plneniu špecifických cieľov stanovených v legislatíve EÚ⁸⁾. Návrh reforiem, ktoré majú byť v horizonte do roku 2040 na Slovensku realizované s cieľom dosiahnuť vytýčené priority strategického rozvoja SR, bude súčasťou pripravovanej VaS SK 2040. Je preto logické, že identifikácia a výber kľúčových reforiem pre NRPP bude previazaná s prípravou VaS SK 2040.

Proces identifikácie a prioritizácie kľúčových reforiem pre účely prípravy NRPP bude (podľa uznesenia vlády SR č. 546 z 5. novembra 2025) koordinovať Úrad vlády SR, pričom počas prioritizácie reforiem budú prebiehať konzultácie s gestormi a spolugestormi prípravy NRPP. Návrhy reforiem obsiahnutých v NRPP budú, rovnako ako návrhy investícií, musieť byť definované v súlade s legislatívne stanovenými požiadavkami.

Vízia Slovensko 2040 bude vypracovaná do 30. júna 2026 s predpokladaným termínom schválenia vládou SR najneskôr do 31. augusta 2026. Na schválený dokument nadviaže proces spracovania Stratégie Slovensko 2040 s termínom ukončenia do 31. januára 2027 a s predpokladaným termínom schválenia najneskôr do 31. marca 2027.

⁶⁾ Metodiku na posudzovanie návrhov prioritných investičných zámerov a návrh ich nadrezortnej prioritizácie vypracuje minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s ÚV SR, MF SR, a MPRV SR podľa úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 613 z 10. 12. 2025, pričom bude povinne konzultovaná a riadne pripomienkovaná aj s MV SR, ktoré je spolugestorom prípravy NRPP a gestormi pre politiky v oblasti vnútorných záležitostí.

⁷⁾ Gestor a spolugestori koordinácie prípravy NRPP zohľadnia zásobník prioritných investičných zámerov, pričom vzhľadom na svoje kompetencie nesú zodpovednosť za finálnu podobu a obsah návrhu NRPP. Napr. MV SR z pozície gestora politik v oblasti vnútorných záležitostí, pripravenosti na krízy a katastrofy a posilňovania bezpečnosti, ako aj spolugestora koordinácie prípravy NRPP zohľadní „zásobník prioritných investičných zámerov“ na národnej úrovni, avšak konečné rozhodnutie o prioritizácii investičných zámerov pre účely NRPP je v kompetencii MV SR.

⁸⁾ Čl. 3 návrhu nariadenia EP a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/955 a nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509.

Návrh územných prístupov (iniciatív) a využitia územných nástrojov



Podpora realizovaná prostredníctvom NRPP má, v zmysle návrhu legislatívy EÚ, okrem iného znížiť hospodárske, sociálne a územné rozdiely v menej rozvinutých, prechodných a rozvinutejších regiónoch, a to prostredníctvom rozdelenia zdrojov regiónom v súlade so špecifickými výzvami jednotlivých regiónov, zabezpečením koncentrácie zdrojov pre menej rozvinuté regióny v stanovenej minimálnej sume a zameraním sa na osobitné potreby rôznych typov území (napr. vidieckych a mestských oblastí, regiónov zasiahnutých zmenami v priemysle). Tieto legislatívne požiadavky smerujúce k podpore územného rozvoja bude potrebné adekvátne zohľadniť pri rozhodnutiach o štruktúre NRPP (o jeho rozdelení na kapitoly) aj pri navrhovaní prerozdelenia národnej alokácie.

NRPP má zároveň účinne prispievať k podpore územnej a miestnej spolupráce, ako aj využívaniu územných nástrojov.

V tejto súvislosti MIRRI SR začne a bude koordinovať spoluprácu so zástupcami územnej samosprávy (regionálnej i miestnej úrovne) s cieľom spoločne definovať využitie územných nástrojov a podporu územného rozvoja v rámci NRPP. Zástupcovia územnej samosprávy budú musieť zabezpečiť včasnú identifikáciu územných investícií založenú na strategickom prístupe na základe identifikovaných problémov a reálnych potrieb a v súvislosti s podporou územného rozvoja (integrovaného územného a mestského rozvoja) aj prípravu stratégií integrovaného územného rozvoja, na ktorých je takáto podpora v zmysle legislatívy založená.

Spolupráca MIRRI SR s územnou samosprávou pri definovaní a nastavovaní územného rozvoja bude konzistentne prepojená a koordinovaná s navrhovaním podpory vidieka a s využívaním iniciatívy LEADER v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pre zabezpečenie konzistentnosti NRPP ako celku bude nevyhnutné, aby procesy identifikácie a prioritizácie sektorových investičných a reformných zámerov a identifikácie a prioritizácie územných investičných zámerov a potrieb boli úzko prepojené. V tejto súvislosti bude prebiehať vzájomná komunikácia gestora, spolugestorov koordinácie prípravy NRPP, zástupcov sektorových politík na národnej úrovni a zástupcov územnej samosprávy.

Previazanie navrhovaných investícií a reforiem s referenčnými dokumentami a odporúčaniami



Okrem požiadavky, aby NRPP podporoval všeobecné ciele⁹⁾ a prispieval k plneniu špecifických cieľov¹⁰⁾, návrh legislatívy EÚ vyžaduje, aby NRPP účinne riešil výzvy v kontexte európskeho semestra, najmä

⁹⁾ Stanovené v čl. 2 návrhu nariadenia EP a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/955 a nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509.

¹⁰⁾ Stanovené v čl. 3 návrhu nariadenia EP a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/955 a nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509.

príslušných odporúčaní pre krajinu, odporúčaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a odporúčaní digitálneho desaťročia, ale tiež výziev v relevantných dokumentoch a stratégiách prijatých Radou EÚ alebo Európskou komisiou (ďalej len „EK“) v oblasti politík vnútorných záležitostí EÚ¹¹⁾). Rovnako je legislatívou EÚ požadované, aby bol NRPP konzistentný s viacerými strategickými dokumentami, najmä s národnými strednodobými fiškálno-štrukturálnymi plánmi, národnými plánmi obnovy prírody, národnými energetickými a klimatickými plánmi a národnými strategickými plánmi digitálneho desaťročia (referenčné dokumenty).¹²⁾

Popri povinnom zohľadnení referenčných dokumentov bude žiadúce brať do úvahy pri navrhovaných investíciách a reformách aj prípadné infringementy voči SR (vzťahujúce sa na plnenie záväzkov SR voči EÚ) a taktiež zohľadňovať platné strategické a koncepčné dokumenty na národnej úrovni (ktoré definujú zámery, rozvojové ciele v jednotlivých sektorových oblastiach). Pri definovaní územných investícií bude potrebné rešpektovať aj relevantné strategické a koncepčné dokumenty na regionálnej úrovni (prípadne miestnej úrovni). Z tohto dôvodu bude nevyhnutné, aby pri identifikovaných investíciách a reformách bol určený ich príspevok k riešeniu výziev uvedených v odporúčaní, resp. aby bol preukázaný ich súlad s relevantnými referenčnými dokumentami. Zároveň treba pamätať na zohľadnenie referenčného rámca aj pri prioritizácii investícií a výbere reforiem tak, aby bola zabezpečená adresná zodpovednosť za ich plnenie.

Keďže viaceré z uvedených referenčných dokumentov budú pripravované paralelne v rovnakom čase ako NRPP, bude nevyhnutné, aby gestori prípravy týchto dokumentov (napríklad Ministerstvo hospodárstva SR ako gestor prípravy Národného energetického a klimatického plánu) úzko spolupracovali s gestorom a spolugestormi koordinácie prípravy NRPP, ale aj zástupcami územnej samosprávy s cieľom zabezpečiť požadovaný súlad dokumentov.

V prípade, že by nebolo možné reagovať na výzvy jednotlivých odporúčaní identifikovanými investíciami a reformami, resp. nebolo by dostatočne preukázateľné prepojenie (súlad) identifikovaných investícií a reforiem s referenčnými dokumentami, bude potrebné ich doplnenie.

NRPP ako dokument pre využívanie zdrojov EÚ a zároveň dokument, ktorý má prostredníctvom naplánovania využívania európskych zdrojov prispieť k rozvoju Slovenska bude koncipovaný s dôrazom na posilnenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v súlade s legislatívnymi pravidlami a prioritami viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034. Príspevok k zvýšeniu konkurencieschopnosti bude aj dôležitým parametrom pri identifikácii investičných zámerov a navrhovaní reforiem.

Príprava návrhu štruktúry NRPP (kapitol) v súvislosti s identifikovanými prioritami podpory (investície, reformy) a určenie zodpovedných orgánov



Nadväzujúc na fázu identifikovania sektorových investičných zámerov, kľúčových reforiem a rozhodnutí o spôsobe územnej podpory (využití územných nástrojov) bude pripravený návrh štruktúry NRPP - návrh

¹¹⁾ V prípade politík v oblasti vnútorných záležitostí je nevyhnutné zohľadniť schengenskú IT architektúru, schengenský hodnotiaci mechanizmus v súlade s nariadením (EÚ) 2022/922, posúdenia zraniteľnosti v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1896 a monitorovací mechanizmus Agentúry Európskej únie pre azyl v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2303.

¹²⁾ Referenčné dokumenty a požiadavky, ktoré musí NRPP zohľadňovať stanovuje čl. 22 a príloha V návrhu nariadenia EP a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/955 a nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509.

kapitol, v rámci ktorých budú definované jednotlivé opatrenia (investície, reformy, iné intervencie) zoskupené do logického celku s jasnou intervenčnou stratégiou.

Na základe určenej štruktúry NRPP (kapitol) bude navrhnutá aj štruktúra orgánov zodpovedných za programovanie, vykonávanie, finančné riadenie, audit, monitorovanie, hodnotenie a zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ v SR vo vzťahu k NRPP.

Návrh štruktúry NRPP a nadväzujúci návrh štruktúry orgánov bude pripravovaný v spolupráci s kľúčovými aktérmi procesu prípravy NRPP, vrátane zástupcov územnej samosprávy.

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia usporiadania funkcií medzi jednotlivými orgánmi a zároveň spustenia kľúčových procesných a kompetenčných zodpovedností pre jednotlivé oblasti implementácie a auditu, vrátane napr. vývoja informačných systémov s cieľom plnej implementácie od 1. januára 2028, je žiadúce včasné rozhodnutie o štruktúre NRPP a určení zodpovednosti jednotlivých orgánov. Ambíciou bude predložiť návrh štruktúry NRPP, ako aj návrh štruktúry orgánov, na schválenie vláde SR na jeseň 2026. (ideálne v septembri 2026, najneskôr v decembri 2026).

Zásadným rozhodnutím (na úrovni vlády SR), ktoré bude potrebné zrealizovať pre včasné vypracovanie komplexného návrhu NRPP bude prerozdelenie národnej alokácie. Okrem nutnosti dodržať všetky pravidlá stanovené v návrhu legislatívy EÚ, bude mimoriadne dôležité zohľadniť prioritné sektorové aj územné potreby, investičné a reformné zámery tak, aby výsledný návrh prerozdelenia alokácie podporoval dosahovanie strategických rozvojových cieľov Slovenska (stanovených vo VaS SK 2040) a zároveň prispieval k napĺňaniu cieľov EÚ.

Participatívne zapojenie partnerov do prípravy NRPP (priebežne do všetkých procesov)



Proces prípravy NRPP bude od svojho začiatku prebiehať participatívnym spôsobom. V zmysle návrhu legislatívy EÚ má členský štát pri NRPP povinnosť organizovať a vykonávať komplexné partnerstvo v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom a so zreteľom na osobitosti príslušných kapitol. Príkladom efektívneho organizovania a vykonávania partnerstva je tzv. riadená participácia.¹³⁾

Na zabezpečenie adekvátneho zapojenia všetkých partnerov bola zriadená partnerská pracovná platforma pre prípravu NRPP, v ktorej majú okrem zástupcov štátnej správy svoje zastúpenie aj územná samospráva (regionálna aj miestna úroveň), zamestnávateľské zväzy a združenia, sociálni partneri, občianska spoločnosť, akademická obec.

Prostredníctvom tejto platformy bude príprava NRPP s partnermi parciálne konzultovaná vo všetkých etapách. Partneri budú mať príležitosť predkladať svoje návrhy k nastavovaniu strategického smerovania NRPP, k príprave a návrhom jednotlivých častí, ktoré bude NRPP obsahovať. Zabezpečená bude spätná väzba k všetkým predloženým návrhom, podnetom a pripomienkam. Odborné konzultácie s partnermi sa budú realizovať priebežne tak, aby bola zabezpečená včasná príprava komplexného návrhu NRPP a zároveň bol plne uplatňovaný participatívny proces v každej etape prípravy dokumentu. Všetci členovia partnerskej

¹³⁾ Riadená participácia je cieľový, zúčtovateľný a transparentne komunikovaný proces zapájania socio-ekonomických partnerov vrátane aktérov občianskej spoločnosti a verejnosti do procesov prípravy predkladaného materiálu, ktorého iniciátorom je orgán štátnej správy alebo samosprávy s cieľom umožniť im (socio-ekonomickým partnerom, aktérom občianskej spoločnosti vrátane verejnosti) ovplyvniť výslednú podobu predkladaného materiálu.

pracovnej platformy budú pravidelne (minimálne raz za dva mesiace) informovaní o postupe procesu prípravy NRPP.

Okrem tejto „strešnej“ partnerskej pracovnej platformy bude možné, v nadväznosti na rozhodnutie o štruktúre NRPP (určenie kapitol, ktoré bude NRPP obsahovať), zriadiť partnerské pracovné skupiny aj pre tvorbu konkrétnej kapitoly. Takéto partnerské pracovné skupiny budú svojim zložením viac prispôsobené obsahovému zameraniu jednotlivých kapitol, aby mohli byť cielenejšie využité skúsenosti relevantných partnerov¹⁴⁾.

Pri participatívnej tvorbe NRPP a jeho jednotlivých kapitol môžu byť využité skúsenosti a odborné poradenstvo Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako odborného garanta procesov riadenej participácie, so zameraním na nastavenie dizajnu a následnú realizáciu participatívneho procesu prípravy NRPP a jeho kapitol.

Neformálne konzultácie so zástupcami Európskej komisie (neformálne negociácie)



Neformálne konzultácie k parciálnym častiam návrhu NRPP budú dôležitou súčasťou prípravy tohto dokumentu. Podľa prerokovávaných oblastí (častí) budú na konzultácie prizývaní relevantní partneri. Pravidelné konzultácie poskytnú spätnú väzbu zo strany EK, umožnia včas reagovať na pripomienky EK a vytvoria priestor pre argumentačnú obhajobu (vysvetlenie) navrhovaného obsahu NRPP. Úspešne zvládnuté neformálne konzultácie so zástupcami EK pomôžu vopred eliminovať možné zásadné námietky/pripomienky EK v rámci formálneho schvaľovacieho procesu, a tým aj skrátiť čas formálneho schvaľovania NRPP zo strany EK. O priebehu konzultácií budú informovaní všetci partneri.

Vypracovanie návrhu NRPP podľa stanoveného vzoru¹⁵⁾



Následne, po schválení navrhutej štruktúry NRPP (kapitol) vládou SR, začne prebiehať vypracovanie dokumentu, t. j. napĺňanie jeho jednotlivých častí, v súlade so stanoveným vzorom. Za celkové vypracovanie dokumentu sú zodpovední gestor koordinácie prípravy NRPP (MIRRI SR) a určení spolugestori. Pri vypracovaní jednotlivých kapitol bude nevyhnutná úzka súčinnosť a spolupráca rezortov (resp. relevantných ÚOŠS) a zástupcov územnej samosprávy (regionálnej aj miestnej úrovne). Návrh dokumentu bude vypracovaný participatívnym spôsobom, pričom bude realizovaný proces priebežných konzultácií s partnermi.

¹⁴⁾ Čl. 6 ods. 5 návrhu nariadenia EP a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/955 a nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509.

¹⁵⁾ Príloha V návrhu nariadenia EP a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/955 a nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509.

Príprava (vypracovávanie) častí NRPP, ktoré majú horizontálny charakter (nie sú viazané na určenie kapitol), ako napr. časti týkajúcej sa horizontálnych podmienok a zásad bude prebiehať už od roku 2026.

Proces Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA)



Návrh NRPP, ako strategický dokument na národnej úrovni, musí prejsť procesom strategického environmentálneho hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Formálne pripomienkovanie návrhu NRPP na národnej úrovni a jeho predloženie na rokovanie vlády SR



Vypracovaný návrh NRPP bude predložený do štandardného pripomienkového procesu (MPK) a bude prerokovaný aj v poradných orgánoch vlády SR (v Hospodárskej a sociálnej rade SR a v Rade vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ).

V súlade s úlohou C.8. uznesenia vlády SR č. 546 z 5. novembra 2025 má byť návrh NRPP predložený na rokovanie vlády SR v termíne do 31. októbra 2027. S cieľom zabezpečiť plnú implementáciu operácií od 1. januára 2028 bude ambíciou predložiť návrh NRPP na schválenie vláde SR v skoršom termíne (august 2027).

Príprava NRPP – indikatívny harmonogram

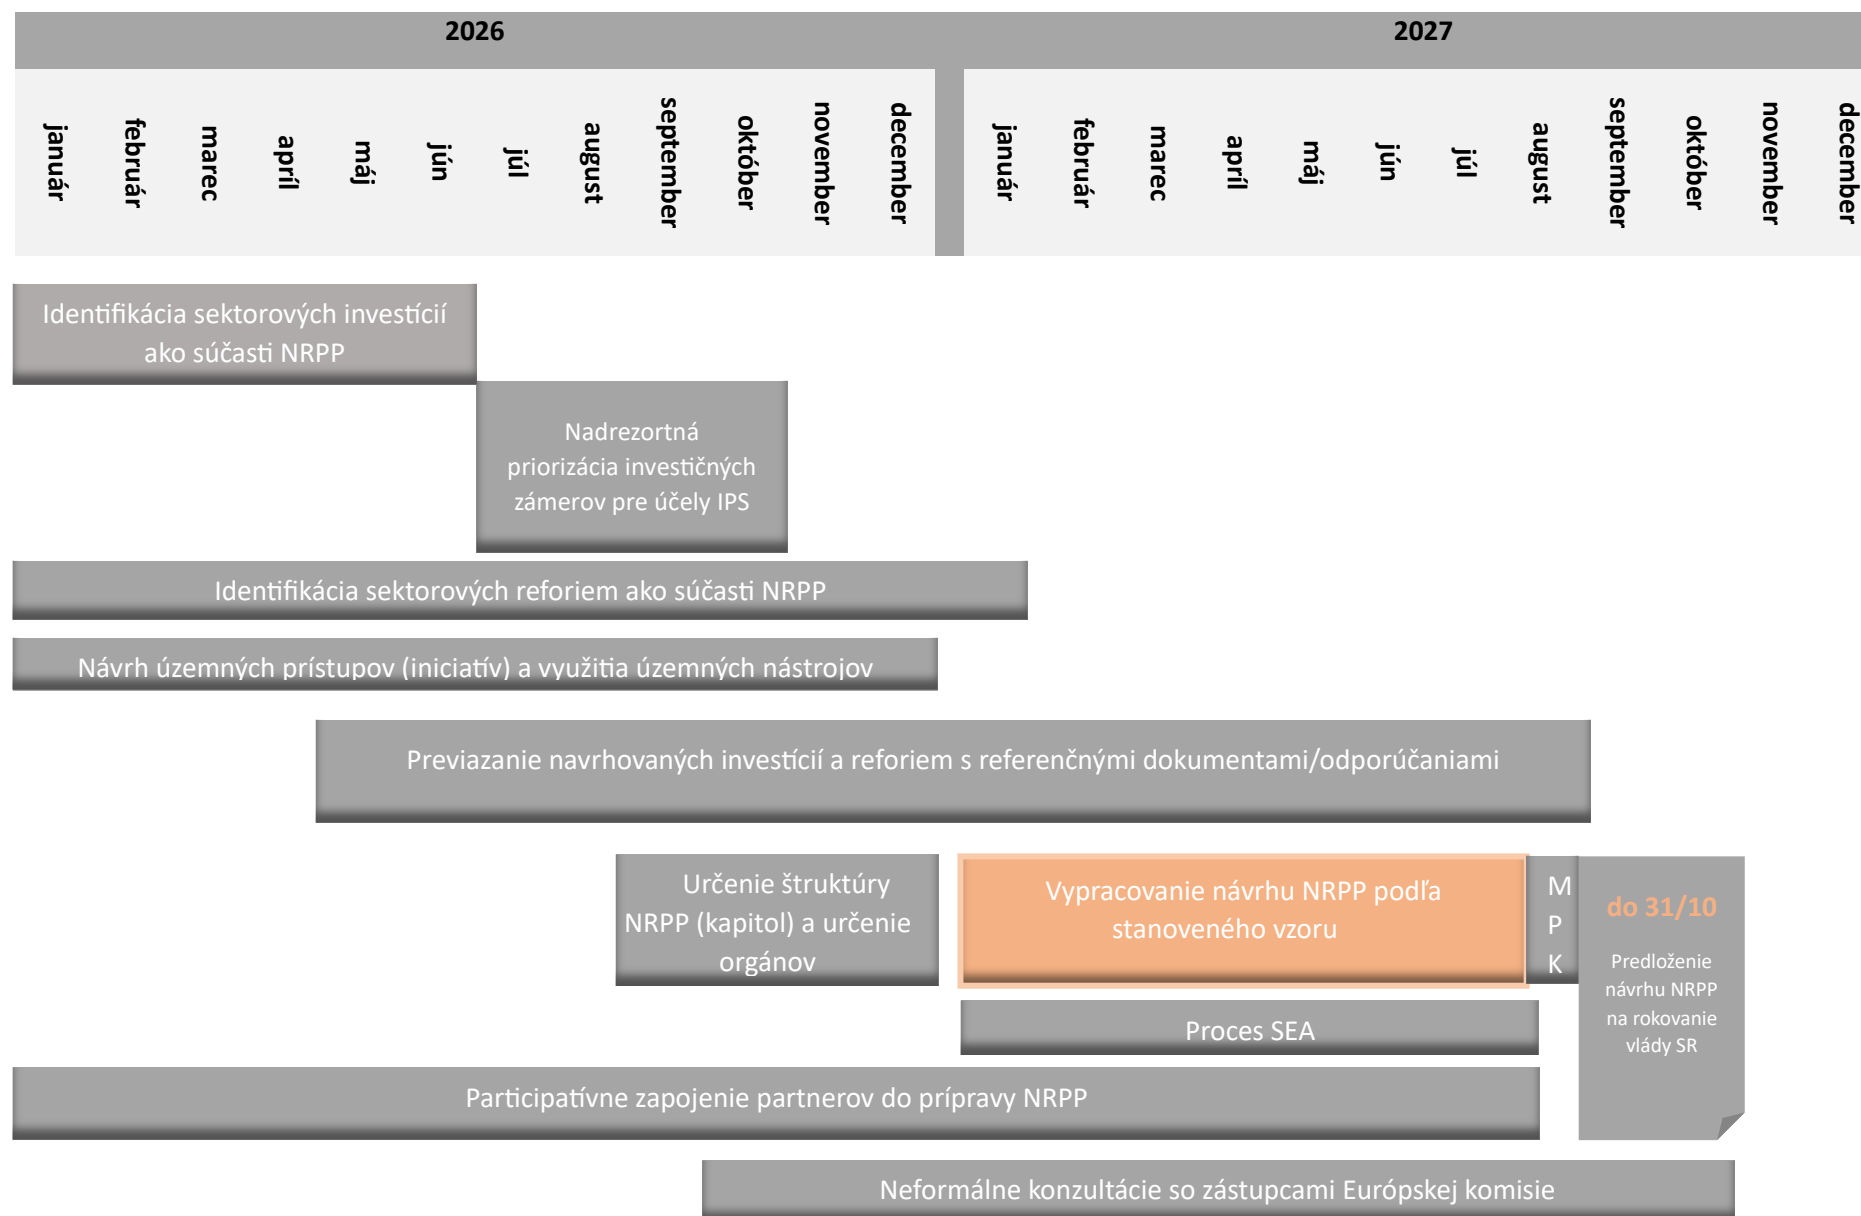

Úlohy a procesy subjektov zapojených do prípravy NRPP v zmysle navrhovaného harmonogramu

Subjekt	Úlohy
MIRRI SR	– zabezpečenie vypracovania uceleného návrhu NRPP – koordinácia a zabezpečovanie jednotnej vízie a strategickej konzistentnosti celého procesu prípravy NRPP (gestor koordinácie prípravy NRPP) – koordinácia spolupráce so zástupcami územnej samosprávy pri definovaní využitia územných nástrojov a podpory územného rozvoja v rámci NRPP – zabezpečenie uplatňovania princípu partnerstva na úrovni NRPP – komunikácia na úrovni medzirezortnej pracovnej skupiny k príprave NRPP a pracovnej platformy pre prípravu NRPP – zabezpečenie procesu SEA – komunikácia s EK v rámci formálneho schvaľovacieho procesu
MIRRI SR spolugestori MF SR	– konsolidácia vstupov od ÚOŠS a partnerov do uceleného návrhu NRPP vrátane zabezpečenia identifikovania návrhu investícií a reforiem – koordinácia prípravy častí NRPP vo svojej zodpovednosti podľa UV SR č. 546 z 5. 11. 2025 – spolupráca na vypracovaní metodiky nadrezortnej prioritizácie posudzujúcej návrhy prioritných investičných zámerov pre účely Investičného plánu Slovensko – vypracovanie v spolupráci a predloženie na rokovanie vlády SR návrhu štruktúry NRPP a implementačnej štruktúry (orgánov) NRPP – zabezpečenie úzkej vzájomnej spolupráce a potrebnej súčinnosti ostatných ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy pri vypracovaní relevantných častí NRPP podľa ich vecnej pôsobnosti a kompetencií – koordinácia ÚOŠS s cieľom zabezpečiť požadovaný súlad NRPP s referenčnými dokumentami a/alebo odporúčaniami na európskej a národnej úrovni – priebežná verifikácia parciálnych častí NRPP s EK

Subjekt	Úlohy
MIRRI SR spolugestori ÚV SR Splnomocnenec vlády SR pre sociálny dialóg Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	– zabezpečenie previazanosti prípravy NRPP s prípravou Investičného plánu Slovensko a s prípravou Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 – Slovensko 2040 a Koncepciou územného rozvoja Slovenska
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti	– poskytovanie odborného poradenstva a súčinnosti pri participatívnom procese tvorby NRPP a jeho kapitol
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu	– spolupráca a účasť na procese identifikácie a prioritizácie reforiem vzhľadom na kompetenciu koordinácie reformy a modernizácie územných samospráv, účasti na tvorbe legislatívy týkajúcej sa miestnej a regionálnej samosprávy
Ministerstvá Ostatné ústredné orgány štátnej správy¹⁶⁾	– identifikovanie sektorových investícií a relevantných reforiem vo vzťahu k NRPP – poskytovať MIRRI SR a spolugestorom súčinnosť a podklady pre vypracovanie všeobecných častí NRPP – poskytovať MIRRI SR a spolugestorom súčinnosť pri identifikovaní previazania navrhovaných investícií a reforiem s referenčnými dokumentami/odporúčaniami v rámci ich kompetencií – spolupráca s územnými partnermi na identifikácii prioritných investičných zámerov a reforiem

¹⁶⁾ Ide o tie ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré majú vo svojej kompetencii oblasti, ku ktorým sa vzťahujú špecifické ciele európskeho fondu pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek, rybárstvo a námorné záležitosti, prosperitu a bezpečnosť na roky 2028 – 2034 definované v čl. 3 návrhu nariadenia EÚ, ktorým sa tento fond zriaďuje (napr. Národný bezpečnostný úrad, ktorý má vo svojej kompetencii kybernetickú bezpečnosť), resp. ktoré majú kompetenciu v horizontálnych oblastiach (ako napr. verejné obstarávanie, štátna pomoc).

Subjekt	Úlohy
	– v zmysle schválenej štruktúry NRPP a implementačných orgánov podieľať sa na vypracovaní jednotlivých kapitol NRPP v predpísanej štruktúre (templatu) – zabezpečenie uplatňovania princípu partnerstva na úrovni jednotlivých kapitol NRPP – v spolupráci s MIRRI SR a spolugestormi neformálne komunikovať obsah jednotlivých kapitol NRPP s EK
Úrad vlády SR	– monitorovanie procesu prípravy NRPP a plnenie úloh vyplývajúcich z indikatívneho harmonogramu prípravy NRPP – koordinácia prípravy Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 – Slovensko 2040 – koordinácia procesu identifikácie a prioritizácie kľúčových reforiem pre účely prípravy NRPP – usmerňovanie tvorby návrhu NRPP za oblasť ochrany finančných záujmov EÚ v SR – spolupráca na vypracovaní metodiky nadrezortnej prioritizácie posudzujúcej návrhy prioritných investičných zámerov pre účely Investičného plánu Slovensko
MF SR	– vypracovanie stratégie financovania za jednotlivé zdroje v rámci NRPP – usmerňovanie tvorby návrhu NRPP za oblasť finančného riadenia – vypracovanie častí NRPP a procesov súvisiacich s výkonom auditu NRPP
Územní partneri (regionálna a miestna úroveň)	– identifikácia prioritných územných investícií v rámci stratégií integrovaného územného rozvoja – spolupráca s ÚOŠS na identifikácii prioritných investičných zámerov a reforiem aj formou účasti v pracovných skupinách – spolupráca pri vypracovaní návrhu štruktúry NRPP a implementačnej štruktúry (orgánov) NRPP

Subjekt	Úlohy
Partneri (Partnerská platforma)	– participatívne zapojenie a konzultácie priebežne do všetkých procesov prípravy NRPP
MIRRI SR ÚV SR spolugestori	– spoločné predloženie uceleného návrhu NRPP na schválenie vláde SR
