Vzorový harmonogram

Gantt Chart

Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
0		**Vzorový harmonogram**	**48.57 mes.**	**06 dec '23**	**01 dec '25**
1		**Príprava projektu**	**46.8 mes.?**	**06 dec '23**	**09 okt '25**
50		Druhé kolá MsZ	0 mes.	30 sep '23	30 sep '23
51		**Inžinierng**	**26.97 mes.**	**01 sep '23**	**17 nov '25**
52		**Stavebné a územné konanie**	**8 mes.**	**01 sep '23**	**27 apr '24**
53		Oslovovanie dotknutých orgánov - ÚK	30 d	01 sep '23	30 sep '23
54		Územné konanie - Právoplatné (30+18+14	90 d	01 okt '23	29 dec '23
55		Oslovovanie dotknutých orgánov - SK	30 d	30 dec '23	28 jan '24
56		Stavebné konanie	90 d	29 jan '24	27 apr '24
57		Stavebné konanie - Právoplatné	0 mes.	27 apr '24	27 apr '24
58		**Kolaudačné konanie**	**3 mes.**	**20 aug '25**	**17 nov '25**
59		**Verejné obstarávanie - Zhotoviteľ stanic, rámcová zmluva**	**5.43 mes.**	**28 jún '23**	**07 dec '23**
60		Zadefinovanie opisu predmetu zákazky a PHZ	0.5 mes.	28 jún '23	12 júl '23
61		Vypracovanie Štúdie na ÚHP	0.5 mes.	28 jún '23	12 júl '23
62		ÚHP - Posúdenie	30 d	13 júl '23	11 aug '23
63		Vyhlásenie VO - Zhotoviteľ stanic	0 d	11 aug '23	11 aug '23
64		Lehota na predkladanie ponúk	30 d	12 aug '23	10 sep '23
65		Oznámenie o otvorení ponúk	0 d	10 sep '23	10 sep '23
66		Vyhodnocovanie podmienok účasti a Vyhodnocovanie ponúk	1 mes.	11 sep '23	10 okt '23
67		II. EX ANTE KONTROLA (20 dní na SO RO dobrovoľná)	1 mes.	11 okt '23	09 nov '23
68		Uzavretie Zmluvy	14 d	10 nov '23	23 nov '23
69		EX POST KONTROLA	14 d	24 nov '23	07 dec '23
70		**Podpis zmluvy na zhotoviteľa , rámcová zmluva**	**0 d**	**07 dec '23**	**07 dec '23**
71		**Verejné obstarávanie - Zhotoviteľ stanic, opätovné otvorenie súťaže**	**2.67 mes.**	**30 dec '23**	**18 mar '24**
72		Zadefinovanie opisu predmetu zákazky a PHZ	0.5 mes.	30 dec '23	13 jan '24
73		Vyhlásenie VO - Zhotoviteľ stanic	0 d	13 jan '24	13 jan '24
74		Lehota na predkladanie ponúk	1 mes.	14 jan '24	12 feb '24
75		Oznámenie o otvorení ponúk	0 d	12 feb '24	12 feb '24
76		Vyhodnocovanie podmienok účasti a Vyhodnocovanie ponúk	14 d	13 feb '24	26 feb '24
77		Uzavretie Zmluvy	7 d	27 feb '24	04 mar '24
78		EX POST KONTROLA	14 d	05 mar '24	18 mar '24
79		**Podpis zmluvy na zhotoviteľa, opätovné otvorenie súťaže**	**0 d**	**18 mar '24**	**18 mar '24**
80		**Verejné obstarávanie - Interiér a vybavenie stanic**	**5.5 mes.**	**29 okt '24**	**11 apr '25**
81		Zadefinovanie opisu predmetu zákazky a PHZ	1 mes.	29 okt '24	27 nov '24
82		Lehota na predkladanie ponúk	1 mes.	28 nov '24	27 dec '24
83		Oznámenie o otvorení ponúk	1 mes.	28 dec '24	26 jan '25
84		Vyhodnocovanie ponúk	1 mes.	27 jan '25	25 feb '25
85		Uzavretie Zmluvy	1 mes.	26 feb '25	27 mar '25
86		Podpis zmluvy - Vybavenie stanic	0.5 mes.	28 mar '25	11 apr '25
87		**Realizácia**	**19.3 mes.**	**02 máj '24**	**01 dec '25**
88		**Realizácia stavby**	**15.83 mes.**	**02 máj '24**	**19 aug '25**
89		Prevzatie staveniska	5 d	02 máj '24	09 máj '24
90		Príprava územia	10 d	10 máj '24	23 máj '24
91		Prípojky IS	2 mes.	07 jún '24	02 sep '24
92		**HSV**	**6.67 mes.**	**24 máj '24**	**09 dec '24**
93		Zemné práce	10 d	24 máj '24	06 jún '24
94		Zakladanie - pásy a pätky	10 d	07 jún '24	20 jún '24
95		Štrkový podklad	7 d	21 jún '24	01 júl '24
96		Podkladný beton	2 d	02 júl '24	03 júl '24
97		Základová doska	10 d	04 júl '24	18 júl '24
98		**1. Míľnik**	0 mes.	18 júl '24	18 júl '24
99		Zvisle konstrukcie 1NP	10 d	19 júl '24	01 aug '24
100		Strop 1NP	20 d	02 aug '24	30 aug '24
101		**2. Míľnik**	0 mes.	30 aug '24	30 aug '24
102		Debnenie a podporná kon. 1NP	20 d	02 sep '24	27 sep '24
103		Technologicka prestavka	5 d	02 sep '24	06 sep '24
104		Zvisle konstrukcie 2NP	10 d	09 sep '24	20 sep '24
105		Strop 2NP	20 d	23 sep '24	18 okt '24
106		**3. Míľnik**	0 mes.	18 okt '24	18 okt '24
107		Debnenie a podporná kon. 2NP	20 d	21 okt '24	18 nov '24
108		Schodisko	10 d	19 nov '24	02 dec '24
109		Výplne otvorov	2 d	03 dec '24	04 dec '24
110		Strecha + terasy	15 d	19 nov '24	09 dec '24
111		**4. Míľnik**	0 mes.	09 dec '24	09 dec '24
112		**PSV**	**8.6 mes.**	**05 dec '24**	**19 aug '25**
113		Zdravotechnika - Rozvody	20 d	05 dec '24	08 jan '25
114		Ústredné kúrenie - Rozvody	20 d	05 dec '24	08 jan '25
115		Elektroinštalácia - Rozvody	20 d	05 dec '24	08 jan '25
116		Vzduchotechnika - Príprava	20 d	05 dec '24	08 jan '25
117		Poter+ izolácia	20 d	09 jan '25	05 feb '25
118		Vyzrenie poteru	20 d	06 feb '25	05 mar '25
119		Omietky	20 d	23 jan '25	19 feb '25
120		**5. Míľnik**	0 mes.	19 feb '25	19 feb '25
121		Zretie omietok	10 d	20 feb '25	05 mar '25
122		Obklady a dlažby	10 d	06 mar '25	19 mar '25
123		Sádrokartóny stropy a priečky	15 d	06 mar '25	26 mar '25
124		Podlahy	20 d	27 mar '25	25 apr '25
125		Garážová brána	2 d	06 feb '25	07 feb '25
126		Zámočnícke výrobky	5 d	06 máj '25	13 máj '25
127		Interierové dvere	5 d	28 apr '25	05 máj '25
128		Maľby	10 d	28 apr '25	13 máj '25
129		Vzduchotechnika	20 d	14 máj '25	10 jún '25
130		Dokončovacie práce	40 d	14 máj '25	08 júl '25
131		**6. Míľnik**	0 mes.	08 júl '25	08 júl '25
132		Fasáda	40 d	06 mar '25	05 máj '25
133		Spevnené plochy, zeleň	30 d	09 júl '25	19 aug '25
134		**7. Míľnik**	0 mes.	19 aug '25	19 aug '25
135		Skúšky technologických zariadení	30 d	09 júl '25	19 aug '25
136		**Odovzdanie a prevzatie záchranných stanic po dokončení zhotoviteľom/investorom (Cieľ)**	15 d	20 aug '25	11 sep '25
137		Realizácia interiéru a vybavenia	40 d	09 júl '25	04 sep '25
138		Odovzdanie užívateľovi	10 d	18 nov '25	01 dec '25

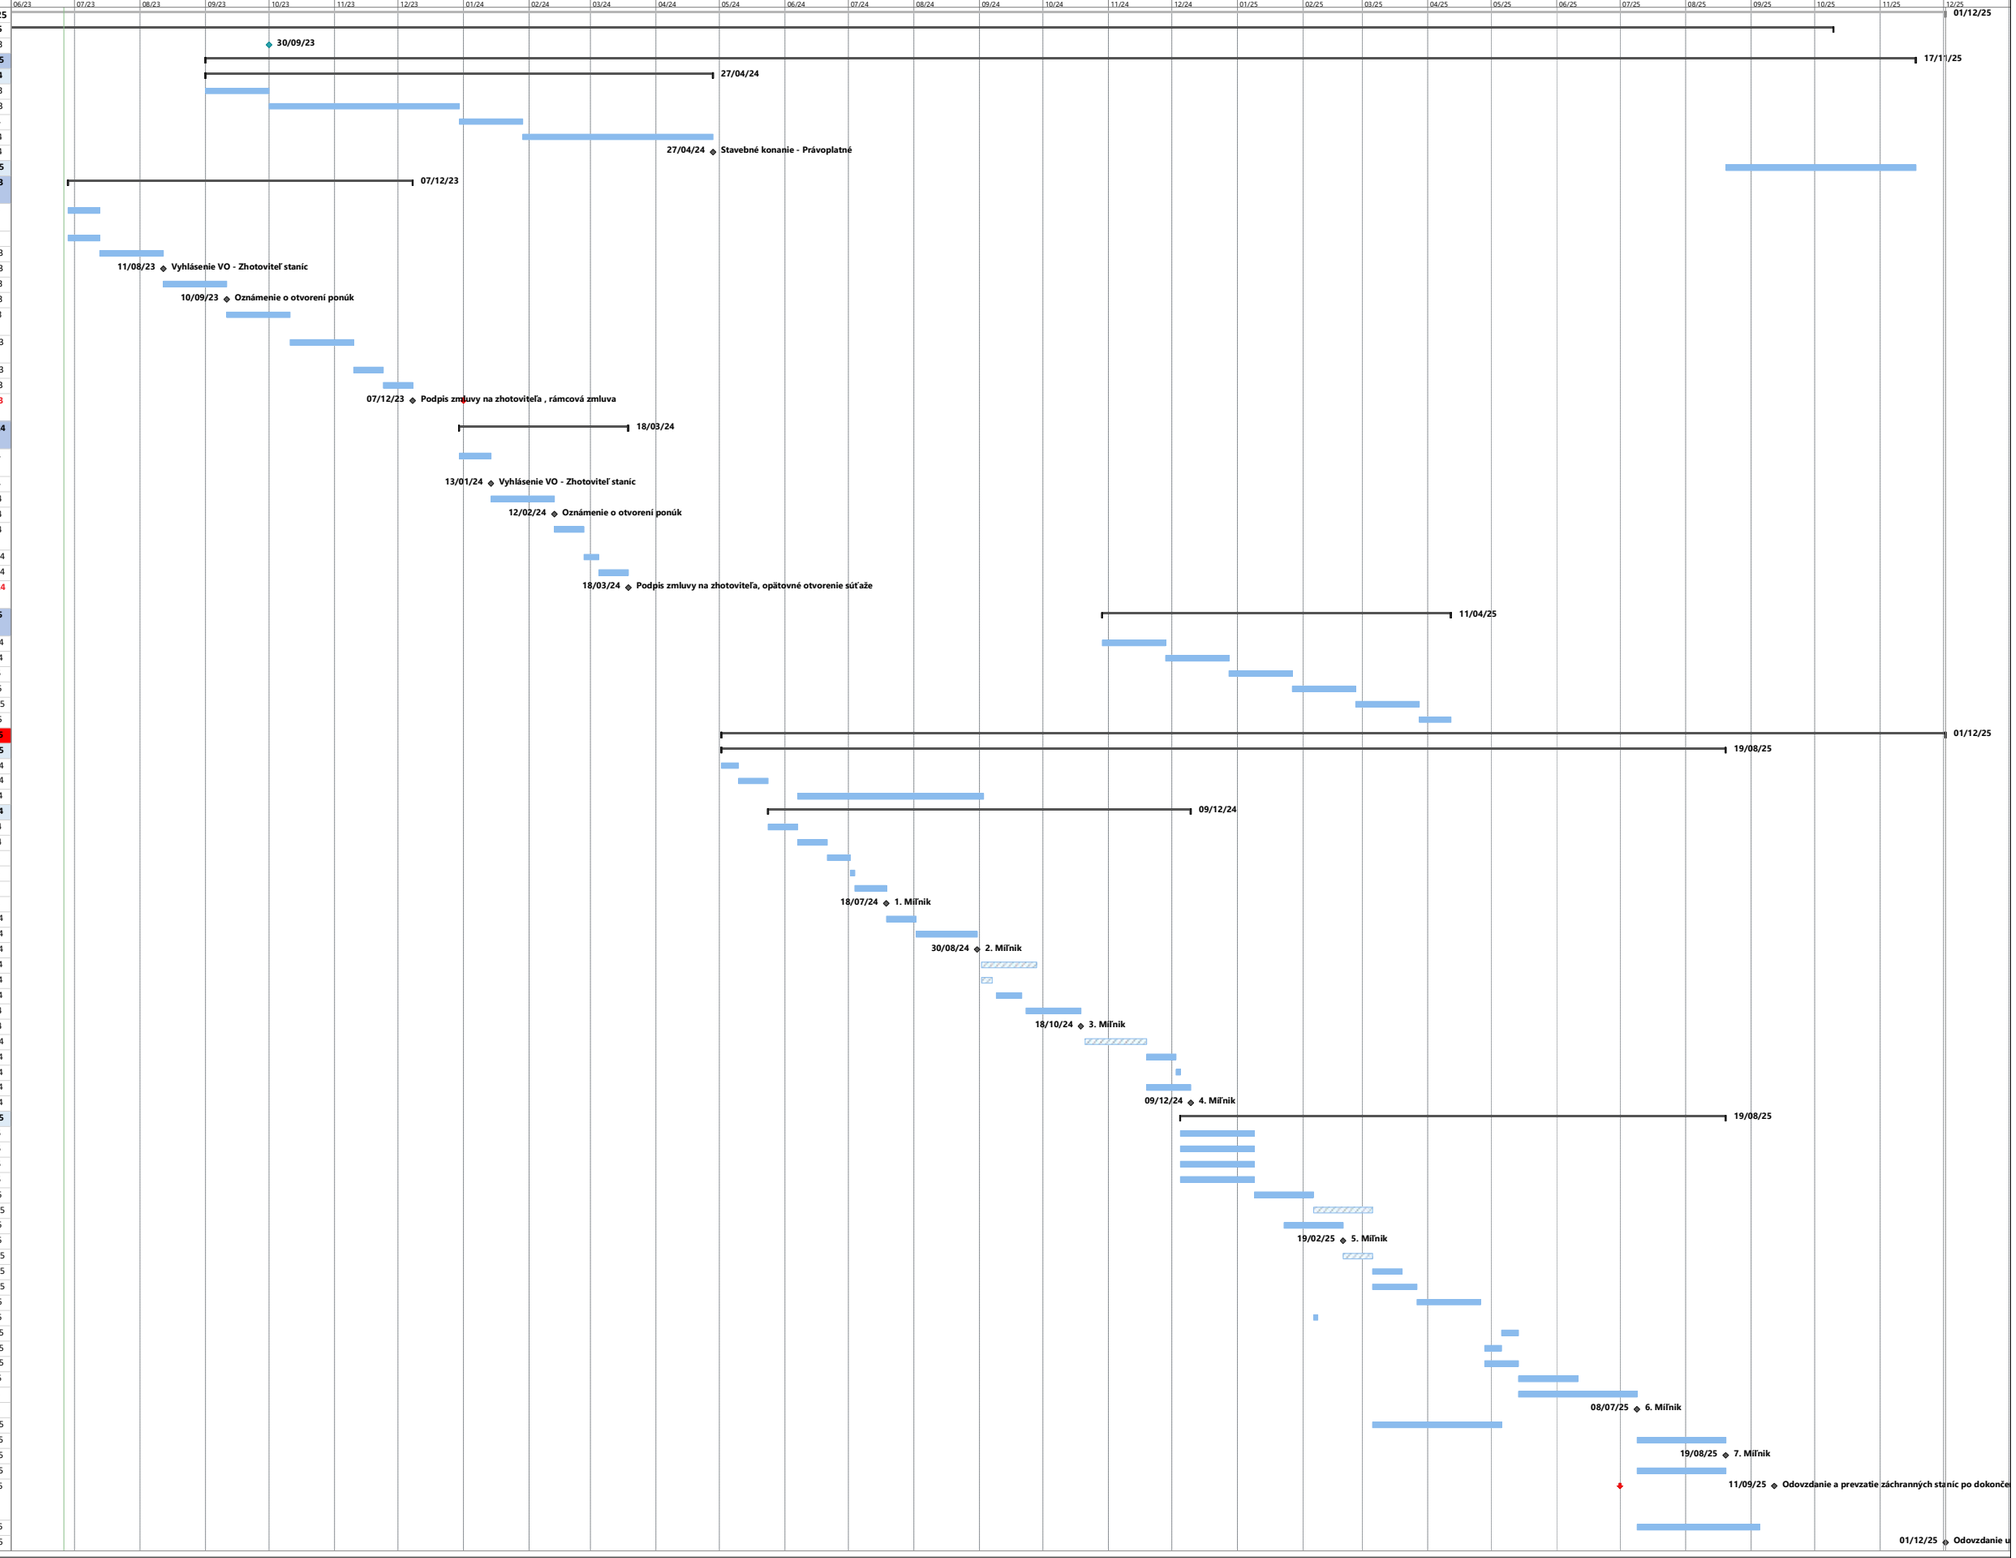

Projekt: 1
Dátum: 26 jún '23

Úloha | EU Míľnik | Monitorovacie kroky
