Príloha 4i

Variant 5 - Referenčný harmonogram Malej rekonštrukcie (do 5mil.)
Gantt Chart
(Pomôcka pre hodnotiteľa)

ID	Task Mode	Name	Duration	Notes
0		**Variant 5 - Referenčný harmonogram Malej rekonštrukcie (do 5mil.)**	**56,05 mo**	
1		**Milníky z HMG ciastkovych implementacnych krokov POO**	**56,05 mo**	
19		**Červený FIDIC**	**39,8 mo**	
20		~~Predprojektová príprava~~	~~20 mo~~	
26		~~Zmena územného plánu (ak nie je v súlade)~~	~~12 mo~~	
27		~~Vysporiadanie pozemkov~~	~~12 mo~~	
28		~~Prieskumy~~	~~2 mo~~	
34		VO na projektanta	4 mo	Zakázka s nízkou hodnoto
35		~~Architektonická štúdia~~	~~3 mo~~	
36		~~DUR~~	~~3 mo~~	
37		~~EIA~~	~~10 mo~~	
41		~~DSZ verejnej práce (nad 5mil.)~~	~~3 mo~~	
42		~~Územné konanie~~	~~4 mo~~	
43		~~Vydané Územné rozhodnutie~~	~~0 mo~~	
44		~~Štátna expertíza vrátane odborného posudku a vydaním protokolu (nad 20mil.)~~	~~2,5 mo~~	
45		Jednostupňový projekt	4 mo	
46		~~DRS a TD~~	~~6 mo~~	
47		~~Stavebné konanie~~	~~5 mo~~	
48		~~Vydané Stavebné povolenie~~	~~0 mo~~	
49		Oznámenie zámeru na stavebný úrad	1 mo	
50		**Verejne obstarávanie zhotoviteľa**	**11 mo**	
51		Príprava PHZ a VO	2 mo	
52		ÚHP - pred vyhlásením VO	1 mo	Nad 1 mil.
53		**VO - Červený FIDIC**	**9 mo**	**Nadlimitná zakázka**
54		Lehota na predkladanie ziadosti	3 mo	
55		vyhodnocovanie podmienok účasti	2 mo	
56		vyhodnocovanie ponúk	2 mo	
57		II Exante a ÚHP Pred podpisom (nad 40mil.)	1 mo	
58		Podpis zmluvy so Zhotoviteľom	1 mo	
59		~~Realizácia~~	~~436 d~~	
60		~~Kolaudačné konanie~~	~~6 mo~~	
61		~~Spustenie do prevádzky~~	~~0 mo~~	
62				
63		**Design & Build**	**35,8 mo**	
64		~~Predprojektová príprava~~	~~19 mo~~	
70		~~Zmena územného plánu (ak nie je v súlade)~~	~~12 mo~~	
71		~~Vysporiadanie pozemkov~~	~~12 mo~~	
72		~~Prieskumy~~	~~2 mo~~	
78		VO na projektanta	4 mo	Zakázka s nízkou hodnoto
79		Architektonická štúdia	1 mo	
80		~~DUR~~	~~3 mo~~	
81		~~EIA~~	~~10 mo~~	
82		~~VO realizátora EIA~~	~~3 mo~~	~~Zakázka s nízkou hodnoto~~
83		~~Spracovanie dokumentácie EIA~~	~~2 mo~~	
84		~~EIA Veľká~~	~~5 mo~~	
85		~~DSZ verejnej práce (nad 5mil.)~~	~~3 mo~~	
86		~~Územné konanie~~	~~4 mo~~	
87		~~Vydané Územné rozhodnutie~~	~~0 mo~~	
88		~~Štátna expertíza vrátane odborného posudku a vydaním protokolu (nad 20mil.)~~	~~2,5 mo~~	
89		**Verejne obstarávanie na projektanta a zhotoviteľa**	**12 mo**	
90		Príprava PHZ a VO	2 mo	
91		ÚHP - pred vyhlásením VO	1 mo	Nad 1 mil.
92		**VO - Design and Build**	**9 mo**	**Nadlimitná zakázka**
93		Vyhlásenie VO	0 mo	
94		Lehota na predkladanie ziadosti	3 mo	
95		vyhodnocovanie podmienok účasti	2 mo	
96		vyhodnocovanie ponúk	2 mo	
97		ÚHP Pred podpisom, II Exante	1 mo	
98		Podpis zmluvy so Zhotoviteľom	1 mo	
99		Jednostupňový projekt	4 mo	
100		~~Stavebné konanie~~	~~5 mo~~	
101		~~Vydané Stavebné povolenie~~	~~0 mo~~	
102		~~DRS~~	~~6 mo~~	
103		~~Realizácia~~	~~356 d~~	
104		~~Kolaudačné konanie~~	~~6 mo~~	
105		~~Spustenie do prevádzky~~	~~0 mo~~	

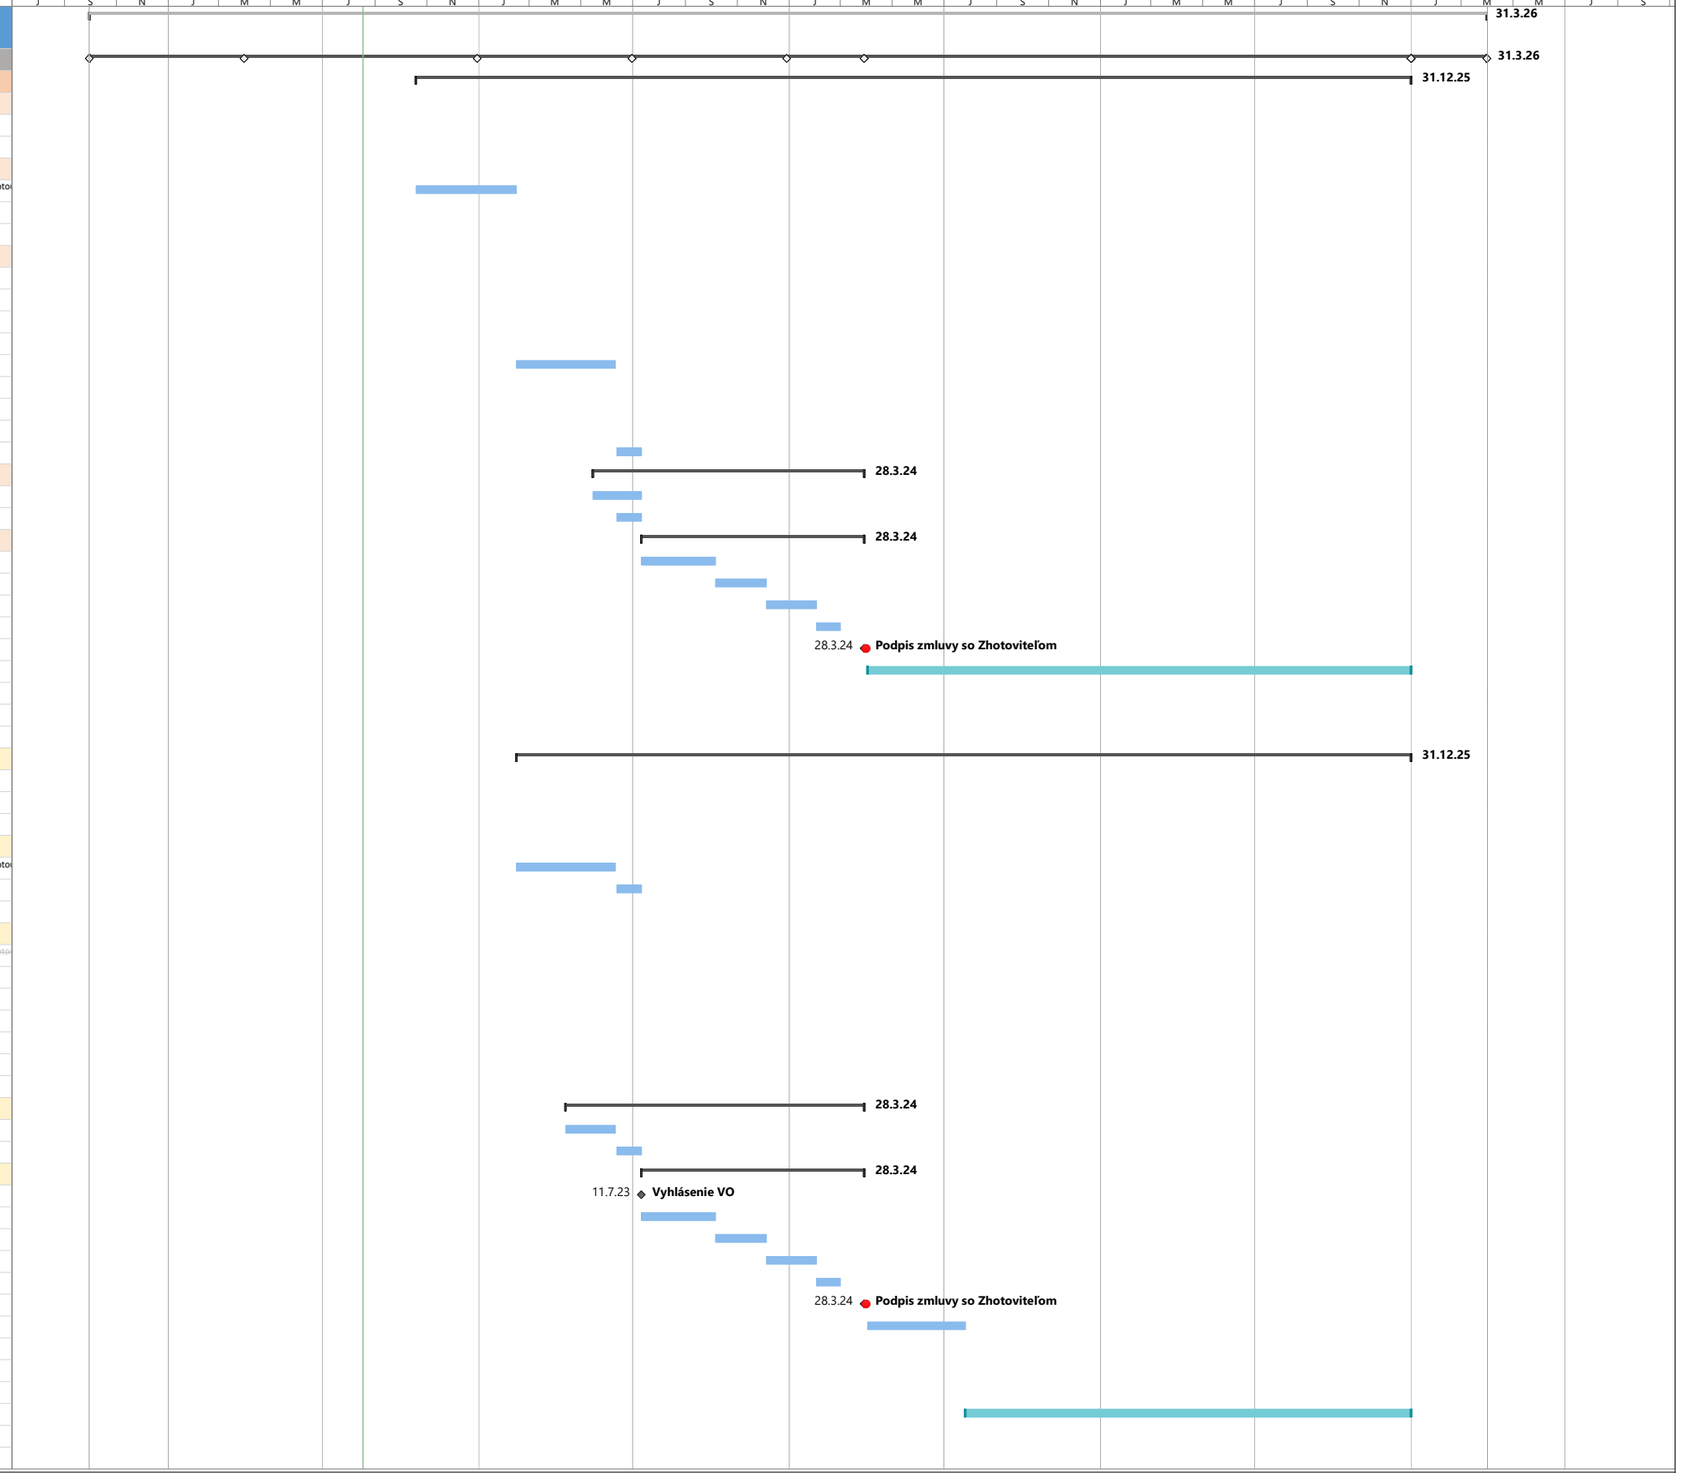

Legenda | Úloha | Medzník | Súhrn | RFF Milestones

Dátum 18.8.22
